



2018 YILI

YATIRIM PROGRAMI
İZLEME VE
DEĞERLENDİRME RAPORU

AKSARAY
2019



Evrensel Düşünen, Yereli Gazeten...

2018 YILI

**YATIRIM PROGRAMI
İZLEME VE
DEĞERLENDİRME RAPORU**

Adana Yolu Üzeri E-90 Karayolu 7. Km, 68100 Aksaray

İÇİNDEKİLER

I. GENEL DEĞERLENDİRME	1
1. Kuruluşun Yatırımlarının Finansman Kaynakları.....	1
2. Yasal Dayanaklar.....	3
3. Kuruluşun Mevcut Hizmet Kapasitesi:	4
a. Hizmet Kapasitesi.....	4
b. Personel Kapasitesi.....	5
c. Fiziki Alan Kapasitesi	5
4. 2018 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı / Kalite Artışı / İyileşme:	7
5. 2018 Yılı Yatırım Uygulamaları	15
II. 2018 YILI PROJE UYGULAMALARI.....	17
1. Devam Eden Projeler	17
a. Kamu Yatırım Projeleri	17
2. Tamamlanan Projeler	21
a. Proje Tamamlama Raporu.....	21
III. SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ.....	29
IV. 2018 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZET TABLOSU (*).....	30

TABLO DİZİNİ

Tablo 1. 2017-2018 Yılları Arası Karşılaştırmalı Bütçe Verileri.....	1
Tablo 2. 2017-2018 Bütçe Giderleri	2
Tablo 3. 2017-2018 Bütçe Gelirleri	2
Tablo 4. Sayılarla ASÜ	4
Tablo 5. 2017-2018 Yılları Personel Sayıları.....	5
Tablo 6. Fiziki Alanların Kampüslere Göre Dağılımı.....	6
Tablo 7. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Yatırımları Hedef ve Gerçekleşme Durumu	10
Tablo 8. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Yatırımları Hedef ve Gerçekleşme Durum	11
Tablo 9. Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Yatırımları Hedef ve Gerçekleşme Durumu.....	13
Tablo 10. Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Yatırımları Hedef ve Gerçekleşme Durumu	14
Tablo 11. Yatırım Projelerinin Ekonomik Koda Göre Gerçekleşme Durumu.....	15
Tablo 12. 2018 Yılı Yatırım Programında Yer Alan Projelerin Uygulama Sonuçları TL.....	16
Tablo 13. Derslik ve Merkezi Birimler Projesi	17
Tablo 14. Kampüs Altyapısı Projesi	19
Tablo 15. Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi	20
Tablo 16. Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	21
Tablo 17. Yayın Alımı Projesi	22
Tablo 18. Muhtelif İşler 1 (Bilgi İşlem Daire Başkanlığı).....	24
Tablo 19. Muhtelif İşler 2 (İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı).....	27
Tablo 20. Muhtelif İşler 3 (Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı).....	28



5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu yönetimine çağdaş yaklaşımlar getirilmiştir. Kamu kaynaklarının belirlenmiş amaçlar doğrultusunda verimli ve ekonomik şekilde kullanılması, değerlendirilmesi ve hesap verilebilirliğini sağlamak için çeşitli raporların hazırlanması, bu raporlarla idarelerin yaptıkları harcamaların verimliliğinin kontrol edilmesi, kamu yönetimindeki yeni yaklaşım örneklerinden birini oluşturmaktadır.

Üniversitemizi dünya üniversiteleri ile rekabet edebilir konuma getirerek, gelişen teknolojiye uygun donanımlı, bina, derslik ve laboratuvarlarla öğrencilerimize modern, kaliteli eğitim ve öğretim sunmak Üniversitemizin öncelikli hedefleri arasında yer almaktadır. Bu hedeflerimize ulaşabilmek için yatırım harcamalarımızı yerinde, zamanında ve gerektiği ölçüde yapma gayreti içerisindeyiz.

Yapılan yatırımların planlama, uygulama ve tamamlanma sürelerinin uzaması, kullanım ömürlerinin kısılmasına ve beklenen verimin alınamamasına neden olmaktadır. Yatırımların planlandığı şekilde gerçekleştirilebilmesi, kamu kaynaklarının belirlenmiş

amaçlar doğrultusunda verimli ve ekonomik bir şekilde yerinde ve zamanında kullanılarak değerlendirilmesi ile mümkün olmaktadır.

Üniversitemizin 2018 Yılı Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu, 5018 sayılı Kanun'un 25'inci ve 60'ıncı maddeleri ile 5436 sayılı Kanun'un 15'inci maddesine dayanılarak hazırlanan "Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğin" 24'üncü maddesi uyarınca hesap verilebilirliği sağlamak ve yatırım harcamalarımızın verimliliğinin kontrol edilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Raporun hazırlanmasında emeği geçen ilgili birimlerimiz ile personelimize teşekkür eder, çalışmalarında başarılar dilerim.

Prof. Dr. Yusuf ŞAHİN

Rektör


I. GENEL DEĞERLENDİRME

Üniversitemiz 5018 sayılı Kanuna istinaden merkezi yönetim kapsamında yer alan ve bu Kanuna bağlı II sayılı Cetvelde belirtilen Özel Bütçeli bir Yükseköğretim Kurumu'dur. Ayrıca Özel bütçeli kurumlar kendi özel kanunlarında sayılan gelirleri toplamaya ve bu gelirlerden harcamaya yapmaya yetkili kılınmışlardır. Üniversitemizin finansman kaynakları; Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler, Diğer Gelirler ve Sermaye Gelirlerinden meydana gelmektedir. Bu finansman kaynaklar içerisinde en büyük pay yaklaşık %90 oran ile Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlere aittir.

1. Kuruluşun Yatırımlarının Finansman Kaynakları

2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize tahsis edilen ödenek bir önceki yıla göre **%6,65** oranında artarak **129.477.000 TL** olmuştur. Üniversitemizin toplam bütçe ödeneği, yıl içerisinde yapılan eklemeler ile birlikte **162.225.760 TL** olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca 2018 yılında yapılan giderler bir önceki yıla göre **%24,27** artarak **158.397.715,41 TL**'ye ulaşmıştır. Buna göre, 2018 yılında başlangıç ödeneğine göre **%122,33**, toplam ödeneğe göre ise **%97,64** oranında bütçe gerçekleşmesi sağlanmıştır.

Tablo 1. 2017-2018 Yılları Arası Karşılaştırmalı Bütçe Verileri

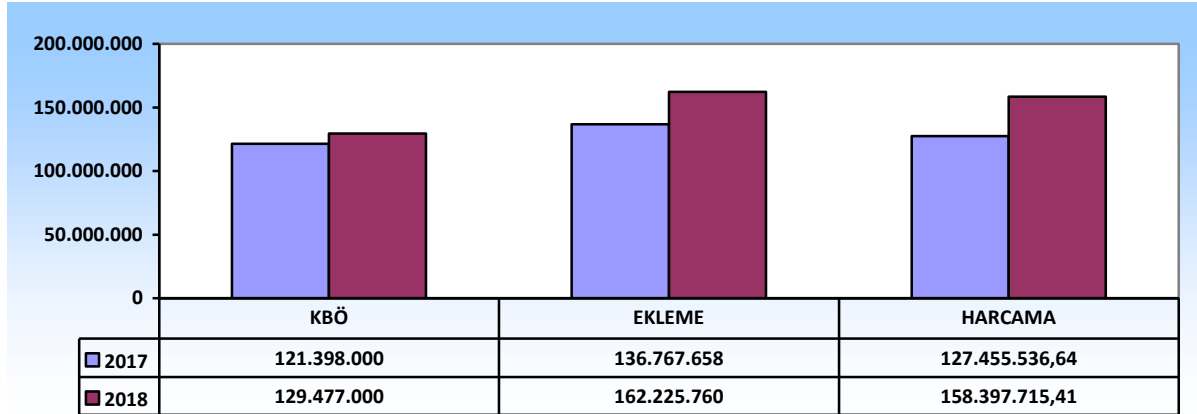

Üniversitemizde yapılan harcamaların dağılımı incelendiğinde en yüksek harcamanın personel ile ilgili giderlerde gerçekleştiği görülmektedir. Söz konusu gider gruplarında gerçekleşen harcamalar toplam harcamaların **%67**'sini oluşturmaktadır. Bununla birlikte toplam harcamaların **%9**'unu mal ve hizmet alımları ve **%23**'ünü ise sermaye giderleri oluşturmuştur. 2018 yılı bütçe giderlerinin gider türleri itibariyle dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 2. 2017-2018 Bütçe Giderleri

Gider Türü	2017 (TL)	2018 (TL)	2017-2018 Değişim Oranı (%)	2018 Yılı Yüzdesele Dağılımı (%)
01 Personel Giderleri	71.559.194,96	93.918.752,88	31,24	59
02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Prim Giderleri	9.452.969,24	12.864.132,52	36,08	8
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	18.909.228,70	13.758.609,11	-27,23	9
05 Cari Transferler	2.197.347,59	1.957.758,38	-10,90	1
06 Sermaye Giderleri	25.335.796,15	35.898.462,52	41,69	23
TOPLAM	127.455.536,64	158.397.715,41	24,27	100

Üniversitemizin 2018 yılı bütçe gelirleri bir önceki yıla göre yaklaşık olarak **%5,86** oranında artarak **154.081.302,55 TL**'ye ulaşmıştır. Bu tutar ile birlikte 2018 Yılı Bütçe Kanununda yer alan planlanan gelirin yaklaşık **%119**'u gerçekleşmiştir.

Tablo 3. 2017-2018 Bütçe Gelirleri

Gelir Türü	2017 (TL)	2018 (TL)	2017-2018 Değişim Oranı (%)	2018 Yılı Yüzdesele Dağılımı (%)
03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	10.047.210,26	10.229.605,01	1,81	7
04- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	125.610.510,00	139.608.039,23	11,14	91
05- Diğer Gelirler	9.255.079,14	4.264.102,92	-53,92	2
06- Sermaye Gelirleri	634.820,76	-	-	-
TOPLAM	145.547.620,16	154.081.302,55	5,86	100

2. Yasal Dayanaklar

2547 sayılı Kanunun;

- 46 ncı maddesine göre, cari hizmet maliyetine öğrenci katkısı ile sosyal tesis ve faaliyetlerden, yükseköğretim kurumlarınca önceki yıllarda bastırılan ders kitapları ve teksirlerin satışından elde edilen gelirleri,
- 58 inci maddesine göre, döner sermaye gelirlerinden tahsil edilen kısmın %5'inden az olmamak üzere elde edilen gelirleri,
- Ek 25 inci maddesi uyarınca, yükseköğretim kurumları adına tapuda kayıtlı taşınmazların kiralanması, satılması ve işletilmesi, hazine adına kayıtlı olup yükseköğretim kurumlarına tahsisli taşınmazların eğitim, sağlık ve sosyal amaçlı kiralanması ve işletilmesi sonucu elde edilen gelirleri,
- Ek 27 nci maddesi ile açılan tezsiz yüksek lisans programları öğretim ücreti gelirleri,
- 43 üncü maddesinin (d) bendi gereği Yükseköğretim kurumları, yurt dışındaki yükseköğretim kurumları ve diğer kuruluşlarla işbirliği tesis ederek ön lisans ve lisans programları da dâhil olmak üzere uluslararası ortak eğitim ve öğretim programları yürütülmesi için bu eğitim ve öğretim programlarına kayıtlı öğrencilerden alınacak öğrenim gelirleri,
- 3843 sayılı Yükseköğretim Kurumlarında İkili Öğretim Yapılmasına Dair Kanun,
- 5217 sayılı Özel Gelir ve Özel Ödeneklerin Düzenlenmesi İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnemelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun,
- 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun,
- 4734 Kamu İhale Kanunu,
- 6749 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararnemenin Değiştirilerek Kabul edilmesine Dair Kanun,
- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 40 ıncı maddesi kapsamında alınan bağış ve yardımlardan oluşmaktadır.

3. Kuruluşun Mevcut Hizmet Kapasitesi:

a. Hizmet Kapasitesi

Aksaray Üniversitesi'nin tarihi 1986 yılına dayanmaktadır. Bu günkü Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'nun 1986-1987 eğitim-öğretim yılında Teknik Programlar Bölümü adı altında Selçuk Üniversitesi'ne bağlı Meslek Yüksekokulu olarak eğitim öğretime başlamıştır. Niğde Üniversitesi'nin 1992 tarihinde kurulması ile 11 Temmuz 1992 tarih ve 21821 sayılı Resmi Gazete ilanı ile mevcut tüm birimler Niğde Üniversitesi'ne bağlanmıştır. 1993 yılında Maliye Bakanlığı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) tarafından Adana-Aksaray Karayolu'nun 7 nci kilometresinde 5.000.000 m²'lik bir alan Niğde Üniversitesi Aksaray Yerleşkesi olarak tahsis edilmiştir.

Bakanlar Kurulu tarafından, 2006 yılı içinde devlet üniversitesi olarak kurulması kabul edilen Aksaray Üniversitesi, 17 Mart 2006 tarihli 26111 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan 5467 sayılı Kanunla Niğde Üniversitesi'ne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek, fakülte ve yüksekokulları Aksaray Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlanmıştır.

5467 sayılı Kanun'un 1'inci maddesi ile 4 Fakülte, 2 Yüksekokul, 4 Meslek Yüksekokulu, 2 Enstitü, Genel Sekreterlik, Hukuk Müşavirliği ve 8 Daire Başkanlığı ile Aksaray Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde kurulmuştur. Kurulduğu günden beri gelişimini arttıran üniversitemiz, 2018 yılında 6 Yerleşke, 12 Fakülte, 1 Yüksekokul, 6 Meslek Yüksekokulu ve 3 Enstitü ile 18 Uygulama-Araştırma Merkezi ile eğitim-öğretime devam etmektedir.

Tablo 4. Sayılarla ASÜ

Sayılarla ASÜ	Kuruluş Yılı	2017	2018
Yerleşke	1	7	6
Fakülte	4	12	12
Yüksekokul	2	2	1
Meslek Yüksekokul	4	7	6
Enstitü	2	3	3
Uygulama ve Araştırma Merkezi	-	15	18

b. Personel Kapasitesi

Üniversitemizde 2018 yılı sonu itibariyle kadrolu olarak istihdam edilen akademik personel sayısı 797, idari personel sayısı ise 319 kişi olmak üzere toplamda 1.116 kişidir. 2018 yılında 4734 sayılı Kanun kapsamında çalıştırılan 185 taşeron personel, Nisan 2018 yılından itibaren 375 sayılı KHK kapsamında 180 personel sürekli işçi kadrolarına atanmıştır. Bu personellere ilaveten akademik birimlerimizde ihtiyaç duyulması halinde yabancı uyruklu sözleşmeli akademik personel de çalıştırılmaktadır. Sözleşmeli çalıştırılan bu personellerin sayısı 2018 yılı itibariyle 4'tir. Ayrıca Üniversitemizde okuyan öğrenciler arasından kısmi zamanlı personel istihdamı da yapılmaktadır.

Tablo 5. 2017-2018 Yılları Personel Sayıları

Personel Sayıları	2017	2018
Akademik	760	797
İdari	319	319
Sürekli İşçi	185	180
Yabancı Uyruklu	5	4
Kısmi Zamanlı Personel	70	70

c. Fiziki Alan Kapasitesi

Üniversitemizin 2018 yılı itibariyle mevcut toplam alanı **4.778.596 m²**'dir. Bu alanın yaklaşık **%5'i** kapalı alanları oluşturmaktadır. Kapalı alanların toplamı ise, **222.430 m²**'dir. Kapalı alanları merkez kampüs ve merkezdışı kampüslere göre dağılımı tabloda gösterilmektedir.

Tablo 6. Fiziki Alanların Kampüslere Göre Dağılımı

Yerleşke Adı	Hizmet Alanı (m ²)							Toplam Hizmet Alanı
	Eğitim	Sağlık	Sosyal alan (Kantin)	Kültür	Spor	Laboratuvar	Diğer (idari ve dolaşım)	
Merkez Kampüs	30.577	150	10.514	6.378	33.876	12.222	104.971	198.688
Kampüs Dışı (S.M.Y. O)	852	0	536	0	0	425	3.251	5.064
Ortaköy Kampüsü	1.300	0	151	0	0	600	3.349	5.400
Güzelyurt Kampüsü	487	0	125	0	0	50	820	1.482
Kampüs Dışı (T.M.Y. O)	1.217	0	477	0	0	4.971	3.329	9.994
Eskil Kampüsü	225	0	0	0	0	90	817	1.132
Sultanhanı Kampüsü	70	0	0	0	0	135	465	670
TOPLAM	34.728	150	11.803	6.378	33.876	18.493	117.002	222.430

4. 2018 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı / Kalite Artışı / İyileşme:

Üniversitemizin 2018 yılı yatırım programında, eğitim sektöründe altı (6) adet yatırım projesi yer almaktadır. Bu projelerin sektörel olarak dağılımı, 5 adedi yükseköğretim ve 1 adedi de beden eğitimi ve spor sektörlerinden oluşmaktadır.

Yatırım programı kapsamında yer alan yatırım projeleri; fiziki mekân inşaatı, altyapı çalışmaları, açık ve kapalı spor tesisleri, makine ve teçhizat alımı, bilgi teknolojileri, binaların bakım ve onarımı, basılı ve elektronik yayın alımı, büro mefruşat alımı gibi ihtiyaçların karşılanması ve çeşitli etüt projelerin ödeneklere ve planlamaya uygun şekilde bitirilmesini hedeflenmektedir. Yatırım programında yer alan Ortaköy MYO (atölye) projesi 2018 yılında Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile yapılan görüşmeler sonrasında revize edilmiş ve ödeneği kullanılmamıştır.

Bu kapsamda hazırlanan yatırım programının eğitim yükseköğretim sektöründeki projelerin gerçekleşmeleri şu şekilde olmuştur;

Yükseköğretim:

❖ Proje numarası 2008H030630 olan Derslik ve Merkezi Birimler Projesi'nin (KOP) karakteristik bilgileri; eğitim (5.100 m²), kütüphane (11.500 m²), sosyal donatı (10.000 m²)' lardan oluşmaktadır. Proje kapsamında 4 adet alt proje bulunmaktadır. Bu projeler;

- 2008H030630-0001 Kütüphane Binası **3.500.000 TL**,
- 2008H030630-0002 Yemekhane Binası **10.500.000 TL**,
- 2008H030630-0003 Fen Edebiyat Fakültesi Ek Bina **1.200.000 TL**,
- 2008H030630-0004 Ortaköy MYO **800.000 TL**' dir.

İlgili Projeye 2018 yılında, **16.000.000 TL** ödenek tahsis edilmiştir. Yılsonu itibariyle toplam ödeneğin **23.448.131 TL**' si harcanmıştır. İlgili proje 2019 yılında da devam edecektir.

❖ Proje numarası 1994H032360 olan Kampüs Altyapısı Projesi'nin (KOP) karakteristik bilgileri; doğalgaz dönüşümü, elektrik hattı, kampüs içi yol, kanalizasyon hattı, peyzaj, su

isale hattı ve telefon hattı gibi işlerden oluşmaktadır. Proje kapsamında 1 adet alt proje bulunmaktadır. Bu proje;

- 1994H032360-0001 Kampüs Altyapısı Projesi **2.000.000 TL**'dir.

İlgili Projeye 2018 yılında **2.000.000 TL** ödenek tahsis edilmiştir. Ayrıca yıl içerisinde yatırımları hızlandırma ödeneğinden **700.000 TL** ödenek eklenmiş ve ödenek **2.700.000 TL** olarak revize edilmiştir. Yılsonu itibariyle **5.265.399 TL**'si harcanmıştır. İlgili proje 2019 yılında da proje devam edecektir.

❖ Proje numarası 2017H032270 olan Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi'nin (KOP) karakteristik bilgisi; etüt-projedir. Proje kapsamında 1 adet alt proje bulunmaktadır. Bu proje;

- 2018H032270-0001 Etüt-Proje **150.000 TL**'dir.

İlgili projeye 2018 yılında **150.000 TL** ödenek tahsis edilmiştir. Yıl içerisinde Likit karşılığı olarak **3.400 TL** ödenek eklemesi yapılmıştır. Yılsonu itibariyle toplam ödeneğin **153.400 TL**'si harcanmıştır. İlgili proje 2018 yılı ile sınırlı olup ertesi yıl için yeni bir proje olarak teklifi yapılacaktır.

❖ Proje numarası 2017H032280 olan Muhtelif İşler Projesi'nin (KOP) karakteristik bilgileri; bilgi ve iletişim teknolojileri, bina tefrişatı, büyük onarım, kesin hesap, T-20 (1 adet) işlerden oluşmaktadır. Bu proje kapsamında 4 alt proje bulunmaktadır. Bu projeler;

- 2018H032280-0001 Bilgi Teknolojileri **350.000 TL**,
- 2018H032280-0002 Büyük Onarım **850.000 TL**,
- 2018H032280-0003 Makine Teçhizat Alımı **3.647.000 TL**,
- 2018H032280-0004 Taşıt alımı **3.000 TL**'dir.

İlgi projeye 2018 yılında **4.850.000 TL** ödenek tahsis edilmiştir. Yıl içerisinde likit karşılığı olarak **2.005.000 TL** ödenek ekleme işlemi yapılmış olup, toplam ödeneği **6.855.000 TL**'ye yükselmiştir. Yılsonu itibariyle toplam ödeneğin **6.411.117 TL**'si harcanmıştır. İlgili proje 2018 yılı ile sınırlı olup ertesi yıl için yeni bir proje olarak teklifi yapılacaktır.

❖ Proje numarası 2017H032290 olan Yayın Alımı Projesi'nin (KOP) karakteristik bilgileri; basılı yayın alımı ile elektronik yayın alımı'ndan oluşmaktadır. Bu proje kapsamında 2 alt proje bulunmaktadır. Bu projeler;

- 2018H032290-0001 Elektronik Yayın Alımı **600.000 TL**,
- 2018H032290-0002 Basılı Yayın Alımı **400.000 TL**'dir.

İlgi projeye 2018 yılında **1.000.000 TL** ödenek tahsis edilmiştir. Yıl içerisinde **150.000 TL** ekleme işlemi yapılarak, toplam ödeneği **1.150.000 TL** olarak olmuştur. Yılsonu itibariyle toplam ödeneğin **1.149.999 TL**'si harcanmıştır. İlgili proje 2018 yılı ile sınırlı olup ertesi yıl için yeni bir proje olarak teklifi yapılacaktır.

Gençlik ve Beden Eğitimi Spor;

- Proje numarası 2008H050070 olan Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi (KOP) için 2018 yılında **2.000 TL** iz bedel ödenek tahsis edilmiştir. Yılsonu itibariyle herhangi bir harcama yapılmamıştır. İlgili proje 2019 yılında da devam edecektir

Tablo 7. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Yatırımları Hedef ve Gerçekleşme Durumu

2018 Hedeflenen	2018 Gerçekleşme
<p>1. 2015-2019 yılları arası Planlanan Stratejik Planda sermaye giderlerinde (yatırım) ön görülen hedefimiz Üniversitemizi daha güvenilir hale getirmek,</p> <p>2. Bilişim alanında kullandığımız ekipmanları yazılımlarla desteklemek ve güncel hale getirmek, gelişen teknolojiye ayak uydurmak ve karşılaştığımız fiziki altyapı sorunlarını gidermek,</p>	<p>1. 7 adet yazılım alınmıştır.</p> <p>2. 5 adet kamera sistemi kurulmuştur.</p> <p>3. Web sayfası, merkezi kimlik sunucusu, akademik portal sistemi ve kalite yönetim sistemi alımı yapılmıştır.</p> <p>4. Microsoft lisans alınmıştır.</p> <p>5. İnternet ve kamera sistemlerinin kurulması amacıyla switch ve gbic modül alınmıştır.</p> <p>6. Web otomasyonunun güncellemesi yapılmıştır.</p> <p>7. Kamera sistemine entegre olarak bazı binalarda kamera izleme merkezleri kurulmuştur.</p>

Tablo 8. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Yatırımları Hedef ve Gerçekleşme Durum

2018 Hedeflenen	2018 Gerçekleşen
<p>1. Üniversitemizin devam eden ve yeni tamamlanacak yatırım projelerinin yıllar itibariyle gerçekleşme hedefleri göz önüne alınarak, birimlerin büro/okul mefruşatı, makine-teçhizat bilgisayar teknolojileri ve yazılım alımlarının faydayı sağlayacak şekilde gerçekleştirilerek, üniversitemizin gelişme sürecine paralel olarak doğacak ihtiyaçlarını 2018 yılı sonuna kadar tamamlamayı hedeflemek.</p> <p>2. 2018 yılında fiilen faaliyet gösteren birimler ile inşaatı tamamlanan kütüphane binasının büro/okul mefruşatı, makine-teçhizat, bilgisayar teknoloji ve yazılım sistemlerinin alınmasının %100'ünü bitirmeyi planlamak.</p> <p>3. Üniversitemizin devam eden ve yeni tamamlanacak yatırım projelerinin yıllar itibariyle gerçekleşme hedefleri göz önüne alınarak, Üniversitemiz mevcut ve yeni faaliyete geçecek</p>	<p>1. Üniversitemizin devam eden ve yeni tamamlanacak yatırım projelerinin yıllar itibariyle gerçekleşme hedefleri göz önüne alınarak, birimlerin büro/okul mefruşatı, makine-teçhizat, bilgisayar teknolojileri ve yazılım alımlarının faydayı sağlayacak şekilde gerçekleştirilerek, üniversitemizin gelişme sürecine paralel olarak doğacak ihtiyaçları büyük oranda tamamlanmıştır.</p> <p>2. 2018 yılında fiilen faaliyet gösteren birimler ile inşaatı tamamlanan Yeni Kütüphane binasının büro/okul mefruşatı, makine-teçhizat, bilgisayar teknoloji ve yazılım sistemlerinin % 100'ü tamamlanmış bulunmaktadır.</p> <p>3. Üniversitemizin devam eden ve yeni tamamlanacak yatırım projelerinin yıllar itibariyle gerçekleşme hedefleri göz önüne alınarak, Üniversitemiz mevcut ve yeni faaliyete geçecek birimlerinin demirbaş ile tüketimine yönelik mal ve malzeme alımlarının yapılarak kurumun işleyişinde devamlılığı sağlayarak kaynakların en yüksek faydayı sağlayacak şekilde kullanılması, verimliliği maksimize edilmiştir.</p>

<p>birimlerinin demirbaş ile tüketimine yönelik mal ve malzeme alımlarının yapılarak kurumun işleyişinde devamlılığı sağlayarak kaynakların en yüksek faydayı sağlayacak şekilde kullanılması, verimliliği maksimize etmek.</p> <p>4. 2018 yılında devam eden ve yeni tamamlanacak yatırım projelerinin yıllar itibari ile gerçekleşme hedefleri göz önüne alınacaktır. Güvenlik görevlisi, temizlik hizmeti, araç kiralama hizmeti, akaryakıt, elektrik, doğalgaz, su ve taşıt bakım onarım hizmetleri ile her türlü cari harcamaların (temizlik malzemeleri, her türlü kırtasiye, diğer tüketime yönelik mal ve malzemeler) gelişim hedefleri ile orantılı olarak göstereceği artış oranında alımların yapılması sağlamaktır.</p>	<p>4.2018 yılında devam eden ve yeni tamamlanacak yatırım projelerinin yıllar itibari ile gerçekleşme hedefleri göz önüne alınacaktır. Güvenlik görevlisi, temizlik hizmeti, araç kiralama hizmeti, akaryakıt, elektrik, doğalgaz, su ve taşıt bakım onarım hizmetleri ile her türlü cari harcamaların (temizlik malzemeleri, her türlü kırtasiye, diğer tüketime yönelik mal ve malzemeler) gelişim hedefleri ile orantılı olarak göstereceği artış oranında alımların yapılması büyük oranda tamamlanmıştır.</p>
---	--

Tablo 9. Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Yatırımları Hedef ve Gerçekleşme Durumu

2018 Hedeflenen	2018 Gerçekleşen
<p>1. Kullanıcıların bilgi ve belge hizmetlerinden daha hızlı ve etkin bir şekilde yararlanmasını sağlamak amacıyla en yeni bilgi teknolojilerini kütüphanelerimize uygulamak,</p> <p>2. Kullanıcıların gereksinim duyduğu basılı, elektronik ve görsel-işitsel bilgi kaynaklarını sağlamak,</p> <p>3. Üniversitemizin bilgi ürünlerinin akademik dünyaya sunumunu sağlamak,</p>	<p>1.Kullanıcılarımızın hizmetlerimizden daha hızlı ve etkin bir şekilde yararlanmasını sağlamak amacıyla en yeni teknolojiler takip edilmekte ve ihtiyaçlar doğrultusunda satın alınmaktadır.</p> <p>2.Kullanıcıların gereksinim duyduğu basılı, elektronik ve görsel-işitsel bilgi kaynakları sağlanmıştır.</p> <p>3. Bilgi İşlem Daire Başkanlığınca açık erişim alt yapısı için gerekli elektronik hizmet satın alınamamış bu nedenle ilgili hedef gerçekleştirilememiştir.</p>

Tablo 10. Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Yatırımları Hedef ve Gerçekleşme Durumu

2018 Hedeflenen	2018 Gerçekleşen
<ol style="list-style-type: none">1. 2018 yılında etüt projesinin tamamlanması,2. Kütüphane Binası Yapım İş'i'nin tamamlanması,3. Personel Yemekhanesi Yapım İş'i'ne devam edilmesi,4. Fen Edebiyat Fakültesi Ek Blok Yapım İş'i'ne devam edilmesi,5. Devam Eden Kampüs Altyapı 6. Etap yapım İş'i'ne devam edilmesi,6. Aksaray Üniversitesi Teknik Bilimler MYO Binası Güçlendirme ve Muhtelif Tadilat İşleri Yapım İş'i'nin yapılması.	<ol style="list-style-type: none">1. Tıp Fakültesi Morfoloji Binası Yapım İş'i'ne ait proje, yaklaşık maliyet ve teknik şartnamelerin hazırlanması işi tamamlanmıştır.2. 2015 yılında yapımına başlanan Kütüphane Binası Yapım İş'i'nin yapımına devam edilmiş, 2018 yılında bitirilmiştir.3. 2017 yılında yapımına başlanan Personel Yemekhanesi Yapım İş'i'nin yapımına başlanmış, 2019 yılında bitirilmesi planlanmaktadır. Fiziki olarak % 75 seviyesindedir.4. 2017 yılında ihalesi yapılmış olup, yapımına 2018 yılında başlanmış, 2019 yılında ise bitirilmesi planlanmaktadır.5. Kampüs Altyapı 6. Etap Yapım İş'i devam etmekte olup, nakdi ve fiziki olarak % 45,00 seviyesine ulaşılmıştır. 2019 yılında ise bitirilmesi planlanmaktadır.6. Büyük Onarım kapsamında Aksaray Üniversitesi Teknik Bilimler MYO Binası güçlendirme ve muhtelif tadilat işleri yapım işi kapsamında güçlendirme, kalorifer ve sıhhi tesisatının yapılması ve yangın merdivenlerinin tadilatı yapılmıştır.

5. 2018 Yılı Yatırım Uygulamaları

2018 yılı bütçesi ile yatırım programında yer alan projeler için tahsis edilen ödeneklerin toplam tutarı **24.002.000 TL** iken yıl içerisinde **700.000 TL** yedek ödenekten aktarılan yatırımları hızlandırma ödeneği ile likit karşılığı eklenen **12.437.660 TL** ödenekten **253.500 TL** ödenek düşüldükten sonra toplam ödenek **36.886.160 TL** olarak gerçekleşmiştir. Toplam ödeneğin (%98,75'i) **36.428.045 TL**'si harcanmış olup, **458.113 TL** ödenek yılsonu itibariyle iptal edilmiştir.

Yatırım programında yer alan projelerden içerisinde en yüksek nakdi gerçekleşme sırasıyla şöyledir;

%100 Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi,

% 99,99 Kampüs Altyapı Projesi,

% 99,99 Derslik ve Merkezi Birimler Projesi,

% 99,99 Yayın Alımı Projesi,

%93,00 Muhtelif İşler Projesi,

Yatırım projelerine ilişkin uygulama verileri aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

Tablo 11. Yatırım Projelerinin Ekonomik Koda Göre Gerçekleşme Durumu

Tertip	KBÖ (TL)	Eklenen (TL)	Düşülen (TL)	Toplam Ödenek (TL)	Harcama (TL)
06.1	4.650.000	1.870.000	253.500	6.266.500,00	5.885.022
06.3	350.000	367.660	0	717.660,00	713.775
06.5	18.152.000	10.715.000	0	28.867.000,00	28.866.929
06.7	850.000	185.000	0	1.035.000,00	962.318
TOPLAM	24.002.000	13.137.660	253.500	36.886.160	36.428.045

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 2018 KAMU YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

Tablo 12. 2018 Yılı Yatırım Programında Yer Alan Projelerin Uygulama Sonuçları

TL

Tertip	Proje Adı	KBÖ	Eklenen	Düşülen	Toplam Ödenek	Harcama
06.5	Derslik ve Merkezi Birimler (KOP)	16.000.000	-	-	-	23.448.131
	Kampüs Altyapısı (KOP)	2.000.000	-	-	-	5.265.398
	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi (KOP)	150.000	-	-	-	153.400
	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri (KOP)	2.000	-	-	-	0
	TOPLAM	18.152.000	10.715.000	0	28.867.000	28.866.929
06.1-06.3	Muhtelif İşler (KOP)	4.850.000	2.272.660	253.500	6.869.160	6.411.117
06.1	Yayın Alımı (KOP)	1.000.000	150.000	0	1.150.000	1.149.999
GENEL TOPLAM		24.002.000	13.137.660	253.500	36.886.160	36.428.045

II. 2018 YILI PROJE UYGULAMALARI

1. Devam Eden Projeler

a. Kamu Yatırım Projeleri

Tablo 13. Derslik ve Merkezi Birimler Projesi

Yatırım Programı Yılı 2018		
PROJE BİLGİLERİ	Dönemi	IV. Dönem
	Alt Eylem No	BS.1.7.1
	Sektörü	Eğitim
	Alt Sektörü	Yükseköğretim
	Proje Sahibi	Aksaray Üniversitesi
	Proje Adı	Derslik ve Merkezi Birimler (KOP)
	Proje No	2008H030630
	Alt Proje Adı	Kütüphane Binası (KOP), Yemekhane Binası (KOP), Fen Edebiyat Fakültesi Ek Bina (KOP), Ortaköy MYO (KOP)
	Yer	Aksaray
	Başlama Tarihi	2008
	Bitiş Tarihi	2019
ÖDENEK BİLGİLERİ	Proje Tutarı	50.913.000
	İlgili Yıl Ödeneği	16.000.000
	İlgili Yıl Revize Ödeneği	-
HARCAMA BİLGİLERİ	2018 Yılı Harcaması (Yıllık Kümülatif Harcama)	23.448.131
	Toplam Harcama Tutarı (Toplam Kümülatif Harcama)	59.092.641
GERÇEKLEŞME BİLGİLERİ	Toplam Fiziki Gerçekleşme	75%
	Nakdi Gerçekleşme	99,99 %
	Gerçekleştirilmiş Faaliyetler	Kütüphane binasının % 100, FEF Ek Binasının % 55, yemekhane binasının inşaatının % 75 fiziki olarak gerçekleşmiştir.
FAALİYET	Engeller - Sorunlar	Ortaköy MYO ile alakalı resmi yazışmalar yapılmaktadır.
	Çözüm Önerileri	Tahsis edilen ödeneklerin etkili ve verimli kullanılması için sürecin hızlandırılması gerekmektedir.
	Planlanan Faaliyetler	FEF Ek Bin. (6.000 m ²), Kütüphane (11.000), Yemekhane (10.000 m ²), Ortaköy MYO Atl. (600 m ²), Yemekhane Binası (10.000 m ²)



Resim - 1 Fen Edebiyat Fakültesi Ek Bina İnşaatı



Resim – 2 Yemekhane Binası İnşaatı

Tablo 14. Kampüs Altyapısı Projesi

		Yatırım Programı Yılı 2018	
PROJE BİLGİLERİ	Dönemi	IV. Dönem	
	Alt Eylem No	BS.1.7.1	
	Sektörü	Eğitim	
	Alt Sektörü	Yükseköğretim	
	Proje Sahibi	Aksaray Üniversitesi	
	Proje Adı	Kampüs Alt yapısı (KOP)	
	Proje No	1994H032360	
	Alt Proje Adı	Kampüs Altyapısı	
	Yer	Aksaray	
	Başlama Tarihi	1994	
	Bitiş Tarihi	2018	
	ÖDENEK BİLGİLERİ	Proje Tutarı	83.213.000
İlgili Yıl Ödeneği		2.000.000	
İlgili Yıl Revize Ödeneği		2.700.000	
HARCAMA	2018 Yılı Harcaması (Yıllık Kümülatif Harcama)	5.265.398	
	Toplam Harcama Tutarı (Toplam Kümülatif Harcama)	90.258.570	
GERÇEKLEŞME BİLGİLERİ	Toplam Fiziki Gerçekleşme	60%	
	Nakdi Gerçekleşme	99,99%	
	Gerçekleştirilmiş Faaliyetler	V. Etap 2018 yılı itibariyle iş nakdi ve fiziki olarak % 100 seviyesine ulaşılmıştır. Yeni VI. etap başlamıştır. %40 Fiziki Gerçekleşme Yapılmıştır.	
FAALİYET	Engeller - Sorunlar	-	
	Çözüm Önerileri	-	
	Planlanan Faaliyetler	Doğalgaz Dönüşümü, Elektrik hattı, Kampüs İçi Yol, Kanalizasyon hattı, Peyzaj, Su isale hattı, Telefon hattı	

Tablo 15. Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi

		Yatırım Programı Yılı 2018	
PROJE BİLGİLERİ	Dönemi	IV. Dönem	
	Alt Eylem No	BS.1.7.2	
	Sektörü	Eğitim	
	Alt Sektörü	Gençlik ve Beden Eğitimi Spor	
	Proje Sahibi	Aksaray Üniversitesi	
	Proje Adı	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri (KOP)	
	Proje No	2008H050070	
	Alt Proje Adı	-	
	Yer	Aksaray	
	Başlama Tarihi	2008	
	Bitiş Tarihi	2018	
	ÖDENEK BİLGİLERİ	Proje Tutarı	2.000
İlgili Yıl Ödeneği		2.000	
İlgili Yıl Revize Ödeneği		2.000	
HARCAMA	2018 Yılı Harcaması (Yıllık Kümülatif Harcama)	-	
	Toplam Harcama Tutarı (Toplam Kümülatif Harcama)	-	
GERÇEKLEŞME BİLGİLERİ	Toplam Fiziki Gerçekleşme	-	
	Nakdi Gerçekleşme	-	
	Gerçekleştirilmiş Faaliyetler	-	
FAALİYET	Engeller – Sorunlar	-	
	Çözüm Önerileri	-	
	Planlanan Faaliyetler	-	

2. Tamamlanan Projeler

a. Proje Tamamlama Raporu

Tablo 16. Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)						
Proje No	Yatırım Programına Alınış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler		
	2018H032270					
Proje Adı	Çeşitli Ünitelerin etüt Projesi (KOP)					
Sektör/Alt sektör	Eğitim/Yükseköğretim					
Proje Amacı	Etüt-Proje					
Proje Yeri	Aksaray					
Karakteristiği	Etüt-Proje-Müşavirlik					
Fiziki Hedefi	% 100					
Başlama-Bitiş Tarihi	2018-2018					
Proje Sözleşmesi Tarihi	31.05.2018	Sözleşme İhale Bedeli		153.400		
Proje Tutarı (Maliyeti)	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
		153.400				
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)						
	Cari Fiyatlarla			2018 Yılı Fiyatlarıyla		
	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
Programa Alındığı Yıl 2018		153.400			153.400	
Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Projenin Çıktısı/Sonucu (Ürünü)	Tıp Fakültesi Morfoloji Binası mimari, statik, mekanik ve elektrik projeleri, teknik şartnameler, mahal listeleri, metraj, keşif ve yaklaşık maliyet cetvelleri hazırlanmıştır.					
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı						
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü						
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler						

Tablo 17. Yayın Alımı Projesi

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)						
	Yatırım Programına Alınış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler		
Proje No	2018H032290					
Proje Adı	Yayın Alımı (KOP)					
Sektör/Alt sektör	Küt. Yayın Alımı					
Proje Amacı	Üniversite Kütüphanesinin basılı ve elektronik yayın sayısı açısından geliştirilmesi.					
Proje Yeri	Aksaray					
Karakteristiği						
Fiziki Hedefi	Kütüphane yayın sayısını arttırmak					
Başlama-Bitiş Tarihi	2018-2018					
Proje Sözleşmesi Tarihi			Sözleşme İhale Bedeli			
Proje Tutarı (Maliyeti)	Dış	Toplam (*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)						
			Cari Fiyatlarla		2018 Yılı Fiyatlarıyla	
	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
Programa Alındığı Yıl (2018)						
5.863 Adet Basılı Yayın Alımı					121.062,61	
1 Adet E-Dergi Aboneliği					360,00	
22.191 Adet E-Kitap Alımı					639.944,31	
11 Adet Veritabanı Alımı					388.632,27	
TOPLAM					1.149.999,19	
Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Projenin Çıktısı/Sonucu (Ürünü)	Proje Amacı dâhilinde bütçemize aktarılan 1.150.000 TL'lik ödeneğin tamamı basılı ve elektronik kaynak alımları için kullanılmış ve Kütüphanemizin koleksiyonu maddi imkânlar çerçevesinde geliştirilmiştir.					
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar	(Gelir artışı, katma değer, istihdam artışı, bölgesel kalkınma, zaman tasarrufu, yoksulluğun azaltılması vs.)					
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı						

Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü	<p>Yapılan İşler: Üniversitemiz Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından 2018 Aralık Ayı sonu itibariyle Doğrudan Temin Usulü ile 5.863 kalem basılı yayın alımı, 22.191 adet e-kitap alımı, 11 Adet Veri tabanı 1 Adet Elektronik Dergi Aboneliği gerçekleştirilmiştir</p> <p>Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü:</p> <p>Üniversitemiz Akademik Birimlerinden yıl içerisinde gelen yayın talepleri Doğrudan Temin sınırimızın büyükşehirlere oranla alt seviyede olması nedeniyle (özellikle yabancı kaynak alımlarında) sağlamada güçlüklerle karşılaşmamıza neden olmaktadır.</p> <p>Bütçe imkânlarımızın kısıtlı olması nedeniyle kullanıcılarımızın talep etmiş oldukları araştırma kaynakları (elektronik ya da basılı) tamamıyla karşılanamamakta, temin aşamasında en çok kullanılan/en acil ihtiyaç şeklinde sınırlandırmalara gidilmektedir.</p> <p>Doğrudan Temin sınırının büyükşehirler ile aynı seviyeye getirilmesinin Anadolu Üniversite Kütüphanelerine büyük kolaylık sağlayacağı düşünülmektedir.</p>
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler	Bütçe imkânlarının ve konusunda uzman personel sayısının artırılması halinde araştırmacı ve kullanıcılarımızın ihtiyaçlarına daha kaliteli hizmet verileceği düşünülmektedir.

Tablo 18. Muhtelif İşler 1 (Bilgi İşlem Daire Başkanlığı)

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)		
Proje No	2018H032280	-
Proje Adı	Muhtelif İşler (KOP)	
Sektör/Alt sektör		
Proje Amacı		
Proje Yeri	Aksaray Üniversitesi – Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	
Karakteristiği	-	
Fiziki Hedefi	Üniversitemizin bilişim ekipmanlarının ve Yazılımlarının daha güncel güvenilir hale getirmek,	
Başlama-Bitiş Tarihi	2018/2018	
Proje Sözleşmesi Tarihi	<p>1) Üniversitemiz tarafından uzaktan eğitim alan öğrenciler için (6ay+6ay) Uzaktan Eğitim Yazılımı alınmıştır. (01.01.2018-30.06.2018)</p> <p>2) Spor Bilimleri Fakültesi bünyesinde kullanılmak üzere Özel Yetenek Sınavı Web Otomasyon yazılımı alınmıştır. (16.07.2018 10 yıllık sözleşme yapılmıştır.)</p> <p>3) Mühendislik Fakültesi bünyesinde yürütülecek olan Ortak Eğitim Programı için Ortak Eğitim Yazılımı Lisansı alımı yapılmıştır. (16.07.2018, 10 yıllık sözleşme)</p> <p>4) Microsoft Lisans Yazılım Programı alımı yapılmıştır. (16.10.2018 tarihinde geçerli olmak üzere 1 yıllık sözleşme imzalanmıştır.)</p> <p>5) EBYS (Elektronik Belge Yönetim Sistemi) personelimizin ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde geliştirilmiş bakım onarımı ve genel güncelleme yapılmıştır. (11.09.2018 tarihinde 1 yıllık sözleşme imzalanmıştır.)</p> <p>6) Üniversitemiz Kalite Koordinatörlüğünün ISO 9001 Kalite Yönetim Sisteminin daha etkin işletilebilmesi amacıyla düzenli olarak yapılması planlanan anketlerin değerlendirilmesinde kullanılmak üzere Optik Okuma Yazılımı Satın alınmıştır. (01.11.2018 tarihinden geçerli 1 yıllık sözleşme imzalanmıştır.)</p> <p>7) Daire Başkanlığımız tarafından 2015/130023 ihale kayıt numarası ile alımı yapılan Güvenlik Duvarı, Sanallaştırma Yazılımlarının lisanslarının ve güvenlik duvarı sisteminin üzerinde çalıştığı 2 adet sunucunun supportunun kullanım süreleri dolmuştur.</p>	<p>1-38.000,00</p> <p>2-17.700,00</p> <p>3-18.585,00</p> <p>4-100.300,00</p> <p>5-16.744,20</p> <p>6-8.673,00</p> <p>7-319.954,64</p> <p>8-11.800,00</p>

	Yeniden satın alma yapılmıştır. (22.11.2018 tarihinden itibaren 3 yıllık sözleşme imzalanmıştır.)					9-23.600,00
	8) Üniversitemiz Kalite Koordinatörlüğü tarafından kullanılmakta olan Kalite yönetim sistemine ek olarak Kurumsal Kapasite Analiz Yazılımı satın alınmıştır. (21.11.2018 tarihinde 1 yıllık sözleşme imzalanmıştır.)					10-16.520,00
	9) Personel Daire Başkanlığımız tarafından kullanılmak üzere Personel Özlük İşleri Birim Yöneticileri Web Otomasyonu satın alınmıştır. (07.11.2018 tarihinde 1 yıllık sözleşme imzalanmıştır.)					11- 529.584,00
	10) Personel Daire Başkanlığının kullanımında olan web otomasyonunun güncellemesi yapılmıştır. (14.12.2018 tarihinde 1 yıllık sözleşme imzalanmıştır.)					12- 56.496,63
	11) Network sistem odası kurulması için Devlet Malzeme Ofisine kredi açılmıştır.					13- 29.141,80
	12) Kütüphane Binasına- switch ve gbic modül alımı yapılmıştır.					14- 233.767,79
	13) TUBİTAK E –İmza Ödemesi yapılmıştır.					15- 16.083,13
	14) Kütüphane Binası-kamera ve ekipmanları alımı yapılmıştır.					16- 96.648,00
	15) Sultanhanı Okul binası- kamera ve ekipmanları alımı yapılmıştır.					17- 26.373,00
	16) Web ve yönetim sistemi, merkezi kimlik sunucusu, akademik portal sistemi ve kalite yönetim sistemi alınmıştır.					18- 24.780,00
	17) Sosyal Bilimler MYO- kamera ve ekipmanları alımı yapılmıştır.					
	18) Kablosuz erişim cihazı (15 adet) alınmıştır.					
Proje Tutarı (Maliyeti)	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)						
	Cari Fiyatlarla			2018 Yılı Fiyatlarıyla		
	Dış	Toplam(*)		Dış	Toplam	
Programa Alındığı Yıl (2018) TOPLAM		1.586.751,00			1.586.751,00	
Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Projenin Çıktısı/Sonucu (Ürünü)						
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar						

Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı	<ol style="list-style-type: none">1. 7 adet yazılım alınmıştır.2. 5 adet kamera sistemi kurulmuştur.3. Web sayfası, merkezi kimlik sunucusu, akademik portal sistemi ve kalite yönetim sistemi alımı yapılmıştır.4. Microsoft lisans alınmıştır.5. İnternet ve kamera sistemlerinin kurulması amacıyla switch ve gbic modül alınmıştır.6. Web otomasyonunun güncelleme yapılmıştır.7. Kamera sistemine bazı binalarda kamera izleme merkezleri kurulmuştur.
--	---

Tablo 19. Muhtelif İşler 2 (İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı)

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)						
	Yatırım Programına Alınış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler		
Proje No	2018 H 032280					
Proje Adı	Muhtelif işler (Kop)					
Sektör/Alt sektör	B.on.Tad.Mak.Tec.Bil.Don.Alt. Bak.On.İd.Yen.					
Proje Amacı	Yeni açılan fakültelerin donanım, makine teçhizat alımı					
Proje Yeri	Aksaray Üniversitesi					
Karakteristiği						
Fiziki Hedefi	Okulların kullanılabilir hale getirilmek ve Laboratuvarların ihtiyaçlarını karşılamak.					
Başlama -Bitiş Tarihi	2018-2018					
Proje Sözleşmesi Tarihi	2018 yılı		Sözleşme İhale Bedeli	3.847.938 (DMO)		
Proje Tutarı (Maliyeti)	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
Makine Teçhizat alımı		1.789.000			1.789.000	
Büro Mefruşat alımı		2.058.938			2.058.938	
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)						
	Cari Fiyatlarla			2018 Yılı Fiyatlarıyla		
	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
Programa Alındığı Yıl (2018)		3.847.938			3.847.938	
Makine Teçhizat alımı		1.789.000			1.789.000	
Büro Mefruşat alımı		2.058.938			2.058.938	
Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Projenin Çıktısı/Sonucu	Okulların tefrişini sağlanmış ayrıca Laboratuvarların ihtiyaçları 2018 yılı için giderilmiştir.					
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar	Öğrenci sayısının artması, binaların büyümesi, öğrenci ve çalışan personele faydalı okuma ve çalışma imkânlarının sağlanması. Laboratuvarların daha modern hale getirilmesi.					

Tablo 20. Muhtelif İşler 3 (Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı)

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)						
	Yatırım Programına Alınış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler		
Proje No	2018H032280					
Proje Adı	Muhtelif İşler (KOP)					
Sektör/Alt sektör	Eğitim/Yükseköğretim					
Proje Amacı	Büyük Onarım					
Proje Yeri	Aksaray					
Karakteristiği	B. On. Ted. Mak. Tec. Bil. Don. Yaz. Alt. Bak. On. İd. Yen.					
Fiziki Hedefi						
Başlama-Bitiş Tarihi	2018-2018					
Proje Sözleşmesi Tarihi	29.06.2018		Sözleşme İhale Bedeli	962.318		
Proje Tutarı (Maliyeti)	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam (*)	Kamulaştırma
		962.318				
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)						
	Cari Fiyatlarla			2018 Yılı Fiyatlarıyla		
	Toplam(*)		Kamulaştırma	Toplam(*)		Kamulaştırma
Programa Alındığı Yıl 2018	962.318			962.318		
Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Projenin Çıktısı/Sonucu (Ürünü)	Aksaray Üniversitesi Teknik Bilimler MYO Binası Güçlendirme ve Muhtelif Tadilat İşleri Yapım İşleri kapsamında güçlendirme, kalorifer ve sıhhi tesisatının yapılması ve yangın merdivenlerinin tadilatı yapılmıştır.					
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı						
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü						

III. SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Yeni kurulan üniversitelerdeki gelişim ivmesi eski üniversitelere nazaran daha fazla olmasına rağmen, gelir kaynakları daha kısıtlıdır. Ayrıca, döner sermaye gelirlerinin de yeterli düzeyde olmaması yatırımların sadece bütçe imkânları ile gerçekleştirilmesine neden olmaktadır.

Başka bir durum ise, kamu yatırımlarının ihale sürecinde mevzuatta öngörülen sürenin uzunluğu, ihale sonrası ihalelere yapılan itirazların çözüme kavuşturulması, ihalelerin zamanında sonuçlanması ve yatırım projelerinin zamanında tamamlanması konularında sorunlar yaşanabilmektedir. Bu sebeple ihale süreçlerine yönelik olarak mevzuatta yapılabilecek düzenlemeler ihalenin daha kısa sürede sonuçlanmasına olanak verecek şekilde düzenlenmesiyle yatırımların planlanan sürede hayata geçirilmesine katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Yukarıda tespit edilen durumlar göz önünde bulundurulduğunda çözüm önerisi olarak;

- Elektronik ortamda sunulan ve büyük çoğunluğu yurtdışı kaynaklı olan veri tabanlarının TÜBİTAK/ULAKBİM tarafından satın alınarak tüm üniversitelerin hizmetine sunulması, hem yaşanan mevzuat sorunlarının çözümünde büyük katkı sağlayacağı,
- Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın verilen ödeneklerin her yıl sadece belli oranda değil, kurumların öğrenci sayıları, binalarının ve çevrenin fiziki koşulları gözetilerek ödenek dağıtımına gidilmesi düşünülmektedir.

IV. 2018 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZET TABLOSU (*)

Kurum Adı: AKSARAY ÜNİVERSİTESİ

Bütçe Türü: ÖZEL BÜTÇE

2018 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı		2017 Sonu Kümülatif Harcama			2018 Yılı Program Ödenek			2018 Yılı Revize Ödenek			2018 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme		
		Dış	Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam
				Kredi	Öz kaynak		Kredi	Öz kaynak		Kredi	Öz kaynak		Kredi	Öz kaynak	
Tarım															
Madencilik															
İmalat															
Enerji															
Ulaştırma.- Hab.															
Turizm															
Konut															
Eğitim	6		145.126			108.281			24.002			36.886			36.428
TOPLAM	6		145.126			108.281			24.002			36.886			36.428

(*) Genel Bütçe, Özel Bütçe, KİT, Özelleştirme Kaps. Kur. Döner Sermaye, Mahalli Katkı, Fon, Hibe vs. gibi birden fazla farklı kaynaktan finansman sağlayarak yatırım yürüten kuruluşlar, bu tabloyu toplam yatırımlar ve her bir bütçe türü itibarıyla ayrı ayrı hazırlayacaklardır.



AKSARAY
2019

 aksarayedutr |  Aksaray.edu.tr
www.aksaray.edu.tr

Adana Yolu Üzeri E-90 Karayolu 7. Km, 68100 Aksaray
