



2017 YILI

**YATIRIM PROGRAMI İZLEME
VE
DEĞERLENDİRME RAPORU**

AKSARAY
2018



Evrensel Düşünen, Yereli Gazeten...

2017 YILI

**YATIRIM PROGRAMI İZLEME
VE
DEĞERLENDİRME RAPORU**

Adana Yolu Üzeri E-90 Karayolu 7. Km, 68100 Aksaray

İÇİNDEKİLER

I. GENEL DEĞERLENDİRME	1
1. Kuruluşun Yatırımlarının Finansman Kaynakları.....	1
2. Yasal Dayanaklar.....	1
3. Kuruluşun Mevcut Hizmet Kapasitesi:	2
3.1 Hizmet Kapasitesi	2
3.2 Personel Kapasitesi	2
3.3 Fiziki Alan Kapasitesi	3
4. 2017 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı / Kalite Artışı / İyileşme: 4	
5. 2017 Yılı Yatırım Uygulamaları	10
II. 2017 YILI PROJE UYGULAMALARI	13
1. Devam Eden Projeler	13
1.1 Kamu Yatırım Projeleri.....	13
2. Tamamlanan Projeler.....	19
2.1 Proje Tamamlama Raporu.....	19
III. SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ	27
IV. 2017 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZET TABLOSU (*).....	28

TABLO DİZİNİ

Tablo 1. Fiziki Alanların Kampüslere Göre Dağılımı.....	3
Tablo 2. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Yatırımları Hedef ve Gerçekleşme Durumu	6
Tablo 3. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Yatırımları Hedef ve Gerçekleşme Durum	7
Tablo 4. Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Yatırımları Hedef ve Gerçekleşme Durumu.....	8
Tablo 5. Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Yatırımları Hedef ve Gerçekleşme Durumu .	9
Tablo 6. Yatırım Projelerinin Alt Sektörlere Göre Gerçekleşme Durumu	10
Tablo 7. 2017 Yılı Yatırım Programında Yer Alan Projelerin Uygulama Sonuçları.....	12
Tablo 8. Derslik ve Merkezi Birimler Projesi	13
Tablo 9. Kampüs Altyapısı Projesi	15
Tablo 10. Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi	17
Tablo 11. Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	19
Tablo 12. Yayın Alımı Projesi	20
Tablo 13. Muhtelif İşler 1 (Bilgi İşlem Daire Başkanlığı)	22
Tablo 14. Muhtelif İşler 2 (İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı).....	24
Tablo 15. Muhtelif İşler 3-1 (Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı)	25
Tablo 16. Muhtelif İşler 3-2 (Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı)	26



5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu yönetimine çağdaş yaklaşımlar getirilmiştir. Kamu kaynaklarının belirlenmiş amaçlar doğrultusunda verimli ve ekonomik şekilde kullanılması, değerlendirilmesi ve hesap verilebilirliğini sağlamak için çeşitli raporların hazırlanması, bu raporlarla idarelerin yaptıkları harcamaların verimliliğinin kontrol edilmesi, kamu yönetimindeki yeni yaklaşım örneklerinden birini oluşturmaktadır.

Üniversitemizi dünya üniversiteleri ile rekabet edebilir konuma getirerek, gelişen teknolojiye uygun donanımlı, bina, derslik ve laboratuvarlarla öğrencilerimize modern, kaliteli eğitim ve öğretim sunmak Üniversitemizin öncelikli hedefleri arasında yer almaktadır. Bu hedeflerimize ulaşabilmek için yatırım harcamalarımızı yerinde, zamanında ve gerektiği ölçüde yapma gayreti içerisindeyiz.

Yapılan yatırımların planlama, uygulama ve tamamlanma sürelerinin uzaması, kullanım ömürlerinin kısılmasına ve beklenen verimin alınamamasına neden olmaktadır. Yatırımların planlandığı şekilde gerçekleştirilebilmesi, kamu kaynaklarının belirlenmiş

amaçlar doğrultusunda verimli ve ekonomik bir şekilde yerinde ve zamanında kullanılarak değerlendirilmesi ile mümkün olmaktadır.

Üniversitemizin 2017 Yılı Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu, 5018 sayılı Kanun'un 25'inci ve 60'ıncı maddeleri ile 5436 sayılı Kanun'un 15'inci maddesine dayanılarak hazırlanan Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğin 24'üncü maddesi uyarınca hesap verilebilirliği sağlamak ve yatırım harcamalarımızın verimliliğinin kontrol edilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Söz konusu raporun hazırlanmasında emeği geçen ve yatırımlarla ilgili faaliyetleri yürüten bütün personelimize teşekkür eder, çalışmalarında başarılar dilerim.

Prof. Dr. Yusuf ŞAHİN

Rektör

I. GENEL DEĞERLENDİRME

1. Kuruluşun Yatırımlarının Finansman Kaynakları

Üniversitemiz 5018 sayılı Kanuna istinaden merkezi yönetim kapsamında yer alan ve bu Kanuna bağlı II sayılı Cetvelde belirtilen Özel Bütçeli bir Yükseköğretim Kurumu'dur.

Kurumumuzun gelirleri şunlardır;

- A. Bütçe
 - a. Hazine Yardımı
 - b. Öz Gelirler
 - i. Kira Gelirleri
 - ii. Cari Hizmet Maliyetine Öğrenci Katkısı
 - iii. Her Yıl Bütçeye Konulan Ödenekler
 - iv. SKS (Sosyal tesis, lojman, kantin vs.) Gelirleri
 - v. İkinci Öğretim Gelirleri
 - vi. Örgün Öğretim Gelirleri
- B. Döner Sermaye
- C. Bütçe Dışı Kaynak
 - a. TÜBİTAK
 - b. AB
 - c. Farabi ve Erasmus
 - d. Şartlı Bağış ve Yardımlardır.

2. Yasal Dayanaklar

2547 sayılı Kanunun 55 inci maddesi üniversitelerin gelir kaynaklarını “her yıl bütçeye konulacak ödenekleri”, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesine göre, cari hizmet maliyetine öğrenci katkısı ile sosyal tesis ve faaliyetlerden, yükseköğretim kurumlarınca önceki yıllarda bastırılan ders kitapları ve teksirlerin satışından elde edilen gelirleri, Yükseköğretim Kurumlarında İkili Öğretim Yapılması Hakkındaki 27.11.1992 tarih ve 3843 sayılı Kanunun 7 nci maddesinde belirtildiği üzere, yükseköğretim kurumlarında normal örgün öğretimin bitimini takiben yapılan ikinci öğretim katkı payı gelirleri, 2547 sayılı Kanunun 58 inci maddesine göre, döner sermaye gelirlerinden tahsil edilen kısmın %5’inden az olmamak üzere elde edilen gelirleri, 2547 sayılı Kanunun Ek 25 inci maddesi uyarınca, yükseköğretim kurumları adına tapuda kayıtlı taşınmazların kiralanması, satılması ve işletilmesi, hazine adına kayıtlı olup yükseköğretim kurumlarına tahsisli taşınmazların eğitim, sağlık ve sosyal amaçlı kiralanması ve işletilmesi sonucu elde edilen gelirleri, 2547 sayılı Kanunun Ek 27 nci maddesi ile açılan tezsiz yüksek lisans programları öğretim ücreti gelirleri, 2547 sayılı Kanunun 43 üncü maddesinin (d) bendi gereği Yükseköğretim

kurumları, yurt dışındaki yükseköğretim kurumları ve diğer kuruluşlarla işbirliği tesis ederek ön lisans ve lisans programları da dahil olmak üzere uluslararası ortak eğitim ve öğretim programları yürütülmesi için bu eğitim ve öğretim programlarına kayıtlı öğrencilerden alınacak öğrenim gelirleri, 5018 sayılı Kanununun 40 ıncı maddesi kapsamında alınan bağış ve yardımlardan oluşmaktadır.

3. Kuruluşun Mevcut Hizmet Kapasitesi:

3.1 Hizmet Kapasitesi

Aksaray Üniversitesi'nin tarihi 1986 yılına dayanmaktadır. Bu günkü Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'nun 1986-1987 eğitim-öğretim yılında Teknik Programlar Bölümü adı altında Selçuk Üniversitesi'ne bağlı Meslek Yüksekokulu olarak eğitim-öğretime başlamıştır. Niğde Üniversitesi'nin 1992 tarihinde kurulması ile 11 Temmuz 1992 tarih ve 21821 sayılı Resmi Gazete ilanı ile mevcut tüm birimler Niğde Üniversitesi'ne bağlanmıştır.

1993 yılında Maliye Bakanlığı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) tarafından Adana-Aksaray Karayolu'nun 7 nci kilometresinde 5.000.000 m²'lik bir alan Niğde Üniversitesi Aksaray Yerleşkesi olarak tahsis edilmiştir.

Üniversitemiz 17.03.2006 tarihli 26111 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan 5467 sayılı Kanun'un 1'inci maddesi ile 4 Fakülte, 2 Yüksekokul, 4 Meslek Yüksekokulu, 2 Enstitü, Genel Sekreterlik, Hukuk Müşavirliği ve 8 Daire Başkanlığı ile Aksaray Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde kurulmuştur. Kurulduğu günden beri gelişimini sürekli arttıran üniversitemiz, 2017 yılı itibariyle 12 Fakülte, 2 Yüksekokul, 7 Meslek Yüksekokulu ve 3 Enstitü ve 15 Uygulama-Araştırma Merkezi ile eğitim-öğretime devam etmektedir.

3.2 Personel Kapasitesi

Üniversitemizde 2017 yılı sonu itibariyle kadrolu olarak istihdam edilen akademik personel sayısı 760, idari personel sayısı ise 319 kişi olmak üzere toplamda 1.079 kişidir. Bu sayıya ek olarak, akademik birimlerimizde yabancı uyruklu olarak sözleşmeli akademik personel sayısı 6'dır.

Üniversitemizde kısmi zamanlı statüde öğrencilerimiz istihdam edilmektedir. 2017 yılı sonu itibariyle istihdam edilen kısmi zamanlı (part time) öğrenci sayısı 70 kişidir.

Ayrıca üniversitemizde 4734 sayılı Kanun kapsamında, 72 kişi güvenlik görevlisi, 113 kişide temizlik personeli olarak istihdam edilmektedir.

3.3 Fiziki Alan Kapasitesi

Üniversitemizde hizmet verilen kapalı alanların kampüslere göre dağılımı 2017 yılı sonu itibariyle aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

Tablo 1. Fiziki Alanların Kampüslere Göre Dağılımı

Yerleşke Adı	Hizmet Alanı (m ²)								
	Eğitim	Sağlık	Barınma	Beslenme	Kültür	Spor	Bil. Tek. Arş.	Diğer (İdari ve dolaşım)	Toplam Hizmet Alanı
Merkez Kampüs	30.577	150	0	10.264	6.378	26.660	12.222	97.106	183.357
Kampüs Dışı (S.M.Y. O)	852	0	0	536	0	0	425	3.251	5.064
Ortaköy Kampüsü	1.300	0	0	151	0	0	600	3.349	5.400
Şereflikoçhisar Kampüsü	2.423	0	0	1.934	0	54	150	6.639	11.200
Güzelyurt Kampüsü	355	0	0	125	0	0	50	700	1.230
Kampüs Dışı (T.M.Y. O)	1.217	0	0	477	0	0	4.971	3.329	9.994
Eskil Kampüsü	225	0	0	0	0	0	90	817	1.132
Sultan hamı Kampüsü	70	0	0	0	0	0	135	465	670
TOPLAM	37.019	150	0	13.487	6.378	26.714	18.643	115.656	218.047

4. 2017 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı / Kalite Artışı / İyileşme:

Üniversitemizin 2017 yılı yatırım programında, eğitim sektöründe altı (6) adet proje yer almaktadır. Bu projelerin alt sektör olarak dağılımı ise, 5 adedi yükseköğretim ve 1 adedi de beden eğitimi ve spor alt sektörüdür.

Üniversitemizin yatırım programı kapsamında; fiziki mekân inşaatı, açık ve kapalı spor tesisleri, taşıt alımı, makine ve teçhizat alımı, bilgi teknolojileri, binaların bakım ve onarımı, basılı ve elektronik yayın alımı, büro mefruşat alımı gibi ihtiyaçların karşılanması ve çeşitli ünitelerin etüt projesinin uygulamaya konulması hedeflenmiştir.

Yatırım programında yer alan eğitim sektöründeki iki alt sektörün proje gerçekleştirmeleri şu şekilde olmuştur;

Yükseköğretim:

- Proje numarası 2008H030630 olan Derslik ve Merkezi Birimler için **18.000.000 TL** ödenek tahsis edilmiştir. Yıl içerisinde likit karşılığı olarak **2.000.000 TL** ödenek ekleme işlemi yapılmış olup, toplam ödeneği **20.000.000 TL**'ye yükselmiştir. Yılsonu itibariyle toplam ödeneğin **14.470.703 TL**'si harcanmıştır. İlgili proje 2018 yılında da devam edecektir.
- Proje numarası 1994H032360 olan Kampüs Altyapısı için **1.900.000 TL** ödenek tahsis edilmiştir. Yıl içerisinde herhangi bir ekleme ve aktarma işlemi yapılmamış olup, toplam ödeneği **1.900.000 TL**'dir. Yılsonu itibariyle **1.593.899 TL**'si harcanmıştır. İlgili proje 2018 yılında da proje devam edecektir.
- Proje numarası 2017H032270 olan Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi için **100.000 TL** ödenek tahsis edilmiştir. Yıl içerisinde likit karşılığı olarak **18.000 TL** ödenek ekleme işlemi yapılmış olup, toplam ödeneği **118.000 TL**'ye yükselmiştir. Yılsonu itibariyle toplam ödeneğin **116.584 TL**'si harcanmıştır. İlgili proje 2017 yılı ile sınırlı olup ertesi yıl için yeni bir proje olarak teklifi yapılacaktır.
- Proje numarası 2017H032280 olan Muhtelif İşler için **5.000.000 TL** ödenek tahsis edilmiştir. Yıl içerisinde likit karşılığı olarak **2.001.700 TL** ödenek ekleme işlemi

yapılmış olup, toplam ödeneđi **7.001.700 TL**'ye yükselmiştir. Yılsonu itibariyle toplam ödeneđin **6.774.575 TL**'si harcanmıştır. İlgili proje 2017 yılı ile sınırlı olup ertesi yıl için yeni bir proje olarak teklifi yapılacaktır.

- Proje numarası 2017H032290 olan Yayın Alımı için **1.000.000 TL** ödenek tahsis edilmiştir. Yıl içerisinde herhangi bir ekleme ve aktarma işlemi yapılmamış olup, toplam ödeneđi **1.000.000 TL** olarak gerçekleşmiştir. Yılsonu itibariyle toplam ödeneđin **999.996 TL**'si harcanmıştır. İlgili proje 2017 yılı ile sınırlı olup ertesi yıl için yeni bir proje olarak teklifi yapılacaktır.

Gençlik ve Beden Eğitimi Spor;

- Proje numarası 2008H050070 olan Açık ve Kapalı Spor Tesisleri için **1.200.000 TL** ödenek tahsis edilmiştir. Yıl içerisinde likit karşılığı olarak **230.000 TL** ödenek ekleme işlemi yapılmış olup, toplam ödeneđi **1.430.000 TL**'ye yükselmiştir. Yılsonu itibariyle toplam ödeneđin **1.281.000 TL**'si harcanmıştır. İlgili proje 2018 yılında da devam edecektir.

Tablo 2. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Yatırımları Hedef ve Gerçekleşme Durumu

2017 Hedeflenen	2017 Gerçekleşen
<p>2015-2019 yılları arası Planlanan Stratejik Planda Sermaye giderlerinde (yatırım) ön görülen hedefimiz Üniversitemizi daha güvenilir hale getirmek.</p> <p>Bilişim alanında kullandığımız ekipmanları yazılımlarla desteklemek ve güncel hale getirmek, gelişen teknolojiye ayak uydurmak ve karşılaştığımız fiziki altyapı sorunlarını gidermek amacıyla Muhtelif işlerden ödenek aktarımı talep edilmiştir.</p> <p>06.3(GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI) ve 06.01 (MAMUL MAL ALIMLARI) tertiplerine toplam 1.983.268 TL ödenek aktarımı yapılmış olup yanda açıklamaları verilen projeler gerçekleştirilmiştir.</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Merkez kampüs içerisindeki eski ve yeni binaların güvenliklerinin sağlanması amacıyla kamera ve ekipmanları alınmış ve kurulumları yapılarak aktif hale getirilmiştir.2. Mail sistemine E-Posta yolu ile gelen giden zararlı İçerikler filtrelenmeye ve büyük ölçekte engellenmeye başlanmıştır.3. EBYS (Elektronik Belge Yönetim Sistemi) Personelimizin İhtiyaçlarını karşılayacak düzeyde geliştirilmiş bakım onarımı ve genel güncelleme yapılmıştır.4. Mevcut durumdaki Kartlı Geçiş Sistemimiz daha verimli olarak kullanılmaya başlanmış olup, merkez kampüsündeki bazı binalar kartlı geçiş sistemine dahil edilmiştir.5. Microsoft Lisansı alınmış ve personelimizin kullanımına sunulmuştur.6. Merkez Kampüsümüzde aktif hale gelen kamera sistemine entegre olarak bazı binalarda kamera izleme merkezleri kurulmuştur.7. C panel Yazılım Lisansı (Yazılım Programı) Web sitemizde kullanılmak üzere satın alınmıştır.

Tablo 3. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Yatırımları Hedef ve Gerçekleşme Durum

2017 Hedeflenen	2017 Gerçekleşen
<p>1. Üniversitemizin devam eden ve yeni tamamlanacak yatırım projelerinin yıllar itibariyle gerçekleşme hedefleri göz önüne alınarak, birimlerin büro-okul mefruşatı, makine-teçhizat bilgisayar teknolojileri ve yazılım alımlarının marjinal faydayı sağlayacak şekilde gerçekleştirilerek, üniversitemizin gelişme süreci doğrultusunda doğacak ihtiyaçlarını 2017 yılı sonuna kadar tamamlamayı hedeflemek.</p> <p>2. 2017 yılında fiilen faaliyet gösteren birimler ile inşaatı tamamlan Veteriner Fakültesi binasının büro/okul mefruşatı, makine/teçhizat, bilgisayar teknoloji ve yazılım sistemlerinin alınmasının %95'ini bitirmeyi planlamak.</p> <p>3. Üniversitemizin devam eden ve yeni tamamlanacak yatırım projelerinin yıllar itibariyle gerçekleşme hedefleri göz önüne alınarak, Üniversitemiz mevcut ve yeni faaliyete geçecek birimlerinin demirbaş ile tüketimine yönelik mal ve malzeme alımlarının yapılarak kurumun işleyişinde devamlılığı sağlayarak kaynakların en yüksek marjinal faydayı sağlayacak şekilde kullanılması, verimliliği maksimize etmektir.</p> <p>4. 2017 yılında devam eden ve yeni tamamlanacak yatırım projelerinin yıllar itibari ile gerçekleşme hedefleri göz önüne alınarak, güvenlik görevlisi, temizlik hizmeti, araç kiralama hizmeti, akaryakıt, elektrik, doğalgaz, su ve taşıt bakım onarım hizmetleri ile her türlü cari harcamaların (temizlik malzemeleri, her türlü kırtasiye, diğer tüketime yönelik mal ve malzemeler) Üniversitenin gelişim hedefleri ile orantılı olarak göstereceği artış oranında alımların tamamlanması,</p>	<p>Üniversitemizin devam eden ve yeni tamamlanacak yatırım projelerinin yıllar itibariyle gerçekleşme hedefleri göz önüne alınarak, birimlerin büro-okul mefruşatı, makine-teçhizat-bilgisayar teknolojileri ve yazılım alımlarının marjinal faydayı sağlayacak şekilde gerçekleştirilerek, üniversitemizin gelişme süreci doğrultusundaki ihtiyaçlar büyük oranda tamamlanmıştır.</p> <p>2017 yılında fiilen faaliyet gösteren birimler ile inşaatı tamamlanan Veteriner Fakültesi binasının büro/okul mefruşatı, makine/teçhizat, bilgisayar teknoloji ve yazılım sistemlerinin % 95'i tamamlanmış bulunmaktadır.</p> <p>Üniversitemizin devam eden ve yeni tamamlanacak yatırım projelerinin yıllar itibariyle gerçekleşme hedefleri göz önüne alınarak, Üniversitemiz mevcut ve yeni faaliyete geçecek birimlerinin demirbaş ile tüketimine yönelik mal ve malzeme alımlarının yapılarak kurumun işleyişinde devamlılığı sağlayarak kaynakların en yüksek marjinal faydayı sağlayacak şekilde kullanılması, verimliliği maksimize edilmiştir.</p> <p>2017 yılında devam eden ve yeni tamamlanacak yatırım projelerinin yıllar itibari ile gerçekleşme hedefleri göz önüne alınarak, güvenlik görevlisi, temizlik hizmeti, araç kiralama hizmeti, akaryakıt, elektrik, doğalgaz, su ve taşıt bakım onarım hizmetleri ile her türlü cari harcamaların (temizlik malzemeleri, her türlü kırtasiye, diğer tüketime yönelik mal ve malzemeler) Üniversitenin gelişim hedefleri ile orantılı olarak göstereceği artış oranında alımların yapılması büyük oranda tamamlanmıştır.</p>

Tablo 4. Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Yatırımları Hedef ve Gerçekleşme Durumu

2017 Hedeflenen	2017 Gerçekleşen
1.Kullanıcıların bilgi ve belge hizmetlerinden daha hızlı ve etkin bir şekilde yararlanmasını sağlamak amacıyla en yeni bilgi teknolojilerini kütüphanelerimize uygulamak.	1.Kullanıcılarımızın hizmetlerimizden daha hızlı ve etkin bir şekilde yararlanmasını sağlamak amacıyla en yeni teknolojiler takip edilmekte ve ihtiyaçlar doğrultusunda satın alınmaktadır.
2. Kullanıcıların gereksinim duyduğu basılı, elektronik ve görsel-ışitsel bilgi kaynaklarını sağlamak.	2.Kullanıcıların gereksinim duyduğu basılı, elektronik ve görsel-ışitsel bilgi kaynakları sağlanmıştır.
3.Üniversitemizin bilgi ürünlerinin akademik dünyaya sunumunu sağlamak.	3. Bilgi İşlem Daire Başkanlığınca Açık Erişim alt yapısı için gerekli elektronik hizmet satın alınamamış bu nedenle ilgili hedef gerçekleştirilememiştir.

Tablo 5. Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Yatırımları Hedef ve Gerçekleşme Durumu

2017 Hedeflenen	2017 Gerçekleşen
1. 2017 yılında çeşitli ünitelerin etüt projesinin tamamlanması.	1. Fen Edebiyat Fakültesi Ek Blok Yapım İş'i'ne ait proje, yaklaşık maliyet ve teknik şartnamelerin hazırlanması işi tamamlanmıştır.
2. Kütüphane Binası Yapım İş'i'ne devam edilmesi.	2. 2016 yılında yapımına başlanan Kütüphane Binası Yapım İş'i'nin yapımına devam edilmiş, 2018 yılında bitirilmesi planlanmaktadır. Fiziki olarak % 62 seviyesindedir.
3. Personel Yemekhanesi Yapım İş'i'nin yapımına başlanması.	3. 2017 yılında yapımına başlanan Personel Yemekhanesi Yapım İş'i'nin yapımına başlanmış, 2019 yılında bitirilmesi planlanmaktadır. Fiziki olarak % 30 seviyesindedir.
4. Fen Edebiyat Fakültesi Ek Blok Yapım İş'i'nin yapımına başlanması.	4. Fen-edebiyat Fakültesi Ek Blok Yapım İşi 2017 yılında ihalesi yapılmış olup, yapımına 2018 yılında başlanacak, 2019 yılında ise bitirilmesi planlanmaktadır.
5. Devam Eden Kampüs Altyapı 5. Etap Yapım İş'i'nin %100 seviyesine getirilerek tamamlanması.	5. Kampüs Alt Yapı 5. Etap Yapım İşi cezalı olarak devam etmekte, nakdi ve fiziki olarak % 60,00 seviyesine ulaşılmıştır.
6. Velodrom İnşaatı'nın tamamlanması.	6. 2017 yılında yapımına başlanan Velodrom Yapım İşi tamamlanmış, geçici kabul işlemleri devam etmektedir.
7. Sağlık Bilimleri Fakültesi Mekanik ve İnşaat Onarım İş'i'nin yapılması.	7. Büyük onarım kapsamında Sağlık Bilimleri Fakültesi mekanik ve inşaat onarımları tamamlanmıştır.
8. Şereflikoçhisar Berat Cömertoğlu MYO Onarım İş'i'nin yapılması.	8. Büyük onarım kapsamında Şereflikoçhisar Berat Cömertoğlu MYO onarımları tamamlanmıştır.

5. 2017 Yılı Yatırım Uygulamaları

2017 yılı bütçesi ile yatırım programında yer alan projeler için tahsis edilen ödeneklerin toplam tutarı **27.200.000 TL** iken yıl içerisinde likit karşılığı olarak **4.349.700 TL** ödenek eklenmek suretiyle toplam ödenek **31.549.700 TL** olarak gerçekleşmiştir. Toplam ödeneğin **25.336.794 TL**'si harcanmış olup, **6.212.906 TL** ödenek yılsonu itibariyle iptal edilmiştir.

Yatırım programında yer alan projelerden içerisinde en yüksek nakdi gerçekleşme sırasıyla şöyledir;

% 99,99 (999.996/1.000.000) Yayın Alımı Projesi,

%98,80 (116.584/118.000) Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi,

%98,70 (6.874.575/7.001.700) Muhtelif İşler Projesi,

%89,58 (1.281.037/1.430.000) Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi,


% 83,38 (1.593.899/1.900.000) Kampüs Altyapı Projesi,

% 72,20 (14.470.703/20.000.000) Derslik ve Merkezi Birimler Projesi

Eklenen ödenekler eğitim sektörü başlığı altında iki alt sektörde yer alan 6 adet projeye eklenmiştir. Bu projelerden yükseköğretim alt sektöründe yer alan 5 projeye toplamda **4.119.700 TL**, gençlik ve beden eğitimi ve spor alt sektöründeki projeye ise, **230.000 TL** ödenek eklenmiştir.

Eğitim Sektöründe yer alan yatırım projelerine ilişkin uygulama verileri aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

Tablo 6. Yatırım Projelerinin Alt Sektörlere Göre Gerçekleşme Durumu

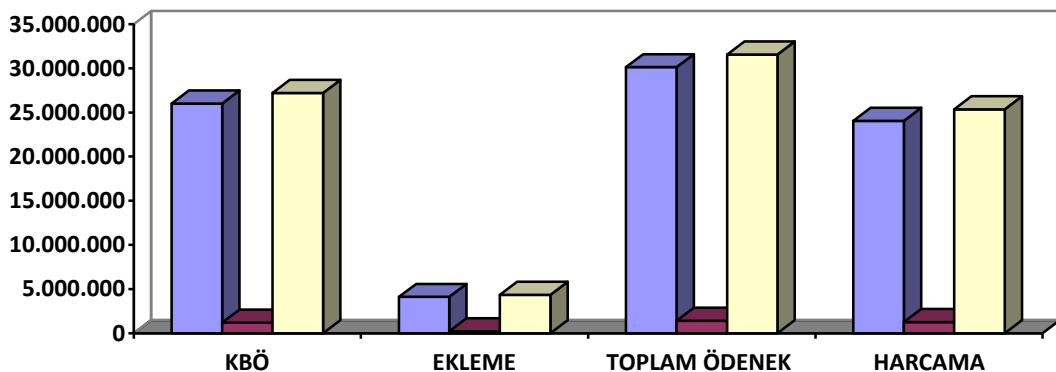

Üniversitemizin gelişimini sürdürebilmesi, yeni açılan ve açılması planlanan fakülte ve yüksekokulların bina sorunlarının çözülmesi için girişimlerde bulunulmuş ihalelere çıkılmış ve bina inşaatlarına başlanmıştır. Yatırım karakterli altyapı geliştirme projelerimizin, ülkemiz yatırım politikaları doğrultusunda, Kalkınma Bakanlığı plan ve programlarına göre uygun olacak şekilde bitirilmesi hedeflenmektedir.

Bu çerçevede, bütçe uygulamaları, şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonraki dönemde de kamu harcamalarında mali disiplin ilkeleri ve belirlenen bütçe hedefleri esas alınarak, üniversitemizin bütçe ödeneklerinin, ayrıntılı harcama programı çerçevesinde azami tasarruf anlayışı ile kullanımına devam edilecektir.

2017 yılı sonu itibarıyla yatırım programında yer alan projelerin uygulama sonuçlarına ilişkin veriler aşağıda sonraki sayfada gösterilmektedir.

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 2017 KAMU YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

Tablo 7. 2017 Yılı Yatırım Programında Yer Alan Projelerin Uygulama Sonuçları

Proje Numarası	Proje Adı	KBÖ	Eklenen	Toplam Ödenek	Harcama
2008H030630	Derslik ve Merkezi Birimler (KOP)	18.000.000	2.000.000	20.000.000	14.470.703
1994H032360	Kampüs Altyapısı (KOP)	1.900.000	-	1.900.000	1.593.899
2008H050070	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri (KOP)	1.200.000	230.000	1.430.000	1.281.037
2017H032280	Muhtelif İşler (KOP)	5.000.000	2.001.700	7.001.700	6.874.575
2017H032290	Yayın Alımı (KOP)	1.000.000	-	1.000.000	999.996
2017H032270	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi (KOP)	100.000	18.000	118.000	116.584
GENEL TOPLAM		27.200.000	4.349.700	31.549.700	25.336.794

II. 2017 YILI PROJE UYGULAMALARI

1. Devam Eden Projeler

1.1 Kamu Yatırım Projeleri

Tablo 8. Derslik ve Merkezi Birimler Projesi

PROJE BİLGİLERİ	Yatırım Programı Yılı	2017
	Dönemi	IV. Dönem
	Alt Eylem No	BS.1.7.1
	Sektörü	Eğitim
	Alt Sektörü	YÜKSEKÖĞRETİM
	Proje Sahibi	Aksaray Üniversitesi
	Proje Adı	Derslik ve Merkezi Birimler (KOP)
	Proje No	2008H030630
	Alt Proje Adı	-
	Yer	Aksaray
	Başlama Tarihi	2008
	Bitiş Tarihi	2018
ÖDENEK BİLGİLERİ	Proje Tutarı	163.808.000
	İlgili Yıl Ödeneği	18.000.000
	İlgili Yıl Revize Ödeneği	20.000.000
HARCAMA BİLGİLERİ	2017 Yılı Harcaması (Yıllık Kümülatif Harcama)	14.470.703
	Toplam Harcama Tutarı (Toplam Kümülatif Harcama)	126.608.000
GERÇEKLEŞME BİLGİLERİ	Toplam Fiziki Gerçekleşme	80,39%
	Nakdi Gerçekleşme	46 %
FAALİYET BİLGİLERİ	Gerçekleştirilmiş Faaliyetler	Kütüphane Binası % 62 fiziki olarak gerçekleştirilmiştir. Ayrıca Yemekhane Binası'nın % 30'ı tamamlanmış olup, 2018 yılında da inşaatına devam edilecektir.
	Engeller - Sorunlar	Ortaköy MYO ile alakalı resmi yazışmalar yapılmaktadır.
	Çözüm Önerileri	Tahsis edilen ödeneklerin etkili ve verimli kullanılması için sürecin hızlandırılması gerekmektedir.
	Planlanan Faaliyetler	FEF Ek Bin. (6.000 m ²), Kütüphane (11.000), Yemekhane (10.000m ²), Ortaköy MYO Atl. (600m ²), Yemekhane Binası (10.000 m ²)

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 2017 KAMU YATIRIMLARI İZLEME VE
DEĞERLENDİRME RAPORU



AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 2017 KAMU YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

Tablo 9. Kampüs Altyapısı Projesi

PROJE BİLGİLERİ	Yatırım Programı Yılı	2017	
	Dönemi	IV. Dönem	
	Alt Eylem No	BS.1.7.1	
	Sektörü	Eğitim	
	Alt Sektörü	YÜKSEKÖĞRETİM	
	Proje Sahibi	Aksaray Üniversitesi	
	Proje Adı	Kampüs Alt yapısı (KOP)	
	Proje No	1994H032360	
	Alt Proje Adı	-	
	Yer	Aksaray	
	Başlama Tarihi	1994	
	Bitiş Tarihi	2018	
	ÖDENEK BİLGİLERİ	Proje Tutarı	83.500.000
		İlgili Yıl Ödeneği	1.900.000
İlgili Yıl Revize Ödeneği		1.900.000	
HARCAMA	2017 Yılı Harcaması (Yıllık Kümülatif Harcama)	1.593.899	
	Toplam Harcama Tutarı (Toplam Kümülatif Harcama)	78.992.000	
GERÇEKLEŞME BİLGİLERİ	Toplam Fiziki Gerçekleşme	60%	
	Nakdi Gerçekleşme	49%	
	Gerçekleştirilmiş Faaliyetler	Kampüs Altyapı Etabının yaklaşık %60'ı tamamlanmıştır. Kalan kısım için çalışmalar 2018 yılında da devam edecektir.	
FAALİYET	Engeller - Sorunlar	-	
	Çözüm Önerileri	-	
	Planlanan Faaliyetler	Doğalgaz Dönüşümü, Elektrik hattı, Kampüs İçi Yol, Kanalizasyon hattı, Peyzaj, Su isale hattı, Telefon hattı	

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 2017 KAMU YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU



AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 2017 KAMU YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

Tablo 10. Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi

PROJE BİLGİLERİ	Yatırım Programı Yılı	2017	
	Dönemi	IV. Dönem	
	Alt Eylem No	BS.1.7.2	
	Sektörü	Eğitim	
	Alt Sektörü	Gençlik ve Beden Eğitimi Spor	
	Proje Sahibi	Aksaray Üniversitesi	
	Proje Adı	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri (KOP)	
	Proje No	2008H050070	
	Alt Proje Adı	-	
	Yer	Aksaray	
	Başlama Tarihi	2008	
	Bitiş Tarihi	2017	
	ÖDENEK BİLGİLERİ	Proje Tutarı	25.000.000
İlgili Yıl Ödeneği		1.200.000	
İlgili Yıl Revize Ödeneği		1.430.000	
HARCAMA	2017 Yılı Harcaması (Yıllık Kümülatif Harcama)	1.281.037	
	Toplam Harcama Tutarı (Toplam Kümülatif Harcama)	20.848.000	
GERÇEKLEŞME BİLGİLERİ	Toplam Fiziki Gerçekleşme	100%	
	Nakdi Gerçekleşme	53%	
	Gerçekleştirilmiş Faaliyetler	Velodrom Tesisi inşaatı yılsonu itibariyle tamamlanmıştır. Spor sektörü için ayrılmış olan ödenek kullanılmıştır.	
FAALİYET	Engeller – Sorunlar	-	
	Çözüm Önerileri	-	
	Planlanan Faaliyetler	Spor Salonu (8.500 m ²)	

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 2017 KAMU YATIRIMLARI İZLEME VE
DEĞERLENDİRME RAPORU



2. Tamamlanan Projeler

2.1 Proje Tamamlama Raporu

Tablo 11. Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)						
Yatırım Programına Alınış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler			
Proje No	2017H032270					
Proje Adı	Çeşitli Ünitelerin etüt Projesi (KOP)					
Sektör/Alt sektör	Eğitim/Yükseköğretim					
Proje Amacı	Etüt-Proje					
Proje Yeri	Aksaray					
gi Karakteristi	Etüt-Proje-Müşavirlik					
Fiziki Hedefi	% 100					
Başlama-Bitiş Tarihi	2017-2017					
Proje Sözleşmesi Tarihi	17	17.05.20	Sözleşme İhale Bedeli	98,80		
Proje Tutarı (Maliyeti)	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
		116,58				
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)						
Cari Fiyatlarla			2017 Yılı Fiyatlarıyla			
	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
Programa Alındığı Yıl 2017		116,58			116,58	
Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Projenin Çıktısı/Sonucu (Ürünü)	Fen Edebiyat Fakültesi Ek Blok mimari, statik, mekanik ve elektrik projeleri, teknik şartnameler, mahal listeleri, metraj, keşif ve yaklaşık maliyet cetvelleri hazırlanmıştır.					

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 2017 KAMU YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar

Tablo 12. Yayın Alımı Projesi

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (*)**

	Yatırım Programına Alınış Değerleri	Revize Edilmiş Son Değerler
Proje No	2017H032290	
Proje Adı	Yayın Alımı (KOP)	
Sektör/Alt sektör	Küt. Yayın Alımı	
Proje Amacı	Üniversite Kütüphanesinin basılı ve elektronik yayın sayısı açısından geliştirilmesi.	
Proje Yeri	Aksaray	
Karakteristiği		
Fiziki Hedefi	Kütüphane yayın sayısını arttırmak	
Başlama-Bitiş Tarihi	2017-2017	
Proje Sözleşmesi Tarihi		Sözleşme İhale Bedeli
Proje (Maliyeti)	Tutarı	Dış Toplam(*) Kamulaştırma İş
	D İş	Toplam(*) Kamulaştırma İş
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)		
	Cari Fiyatlarla	2017 Yılı Fiyatlarıyla
	D İş	Toplam(*) Kamulaştırma İş
Programa Alındığı Yıl (2017)	999.996	999.996
İdeal Kültür 2017/217015 İKN'li 10.593 Kalem Yerli Kitap İhale Hakedişi Ödemesi		222.075,58
Palme Yayıncılık 2017/217015 İKN'li 231 Kalem Yabancı Kitap İhale Hakedişi Ödemesi		18.769,29
Murat İpekoğlu / Arapça Kitap Alımı		
İdeal Kültür Yayıncılık/750 Kalem		20.520,00

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 2017 KAMU YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

Basılı Yayın Alımı		
Maliye Hesap		21.019,96
Uzmanları Derneği/Vergi		
Dünyası E-Dergi		
Aboneliği		
Springer 2273 E-		
Kitap Alımı Ödemesi		320,00
Ebsco 152 Adet		
E-Kitap Alımı		83.921,09
17 Adet Verit		
abanı Ödemesi		53.911,11
TOPLAM		579.459,55
		999.996,58

Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler

Projenin Çıktısı/Sonucu (Ürünü)	Proje Amacı dâhilinde bütçemize aktarılan 1.000.000 TL'lik ödeneğin tamamı basılı ve elektronik kaynak alımları için kullanılmış ve Kütüphanemizin koleksiyonu maddi imkânlar çerçevesinde geliştirilmiştir.
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar	(Gelir artışı, katma değer, istihdam artışı, bölgesel kalkınma, zaman tasarrufu, yoksulluğun azaltılması vs.)
Yapılan Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü	<p>Yapılan İşler: Üniversitemiz Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından 2017 Aralık Ayı sonu itibariyle;</p> <p>Açık İhale ve Doğrudan Temin Usullerine göre 14.962 kalem basılı yayın alımı, 2.425 adet e-kitap alımı, 16 Adet Verit abanı ile 1 adet Tez Tarama Verit abanı (Elektronik Ortamda) ve 1 Adet Elektronik Dergi Aboneliği gerçekleştirilmiştir</p> <p>Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü:</p> <p>Üniversitemiz Akademik Birimlerinden yıl içerisinde gelen yayın talepleri Doğrudan Temin sınırlarımızın büyükşehirler oranla alt seviyede olması nedeniyle (özellikle yabancı kaynak alımlarında) sağlamada güçlüklerle karşılaşmamıza neden olmaktadır.</p> <p>Bütçe imkânlarımızın kısıtlı olması nedeniyle kullanıcılarımızın talep etmiş oldukları araştırma kaynakları (elektronik ya da basılı) tamamıyla karşılanamamakta, temin aşamasında en çok kullanılan/en acil ihtiyaç şeklinde sınırlandırmalara gidilmektedir.</p> <p>Kütüphane binamız halen yapım aşamasında olup, hizmet vermekte olduğumuz binamız hem kullanıcılarımıza hem de koleksiyonumuza yetersiz kalmaktadır.</p> <p>Doğrudan Temin sınırının büyükşehirler ile aynı seviyeye getirilmesinin Anadolu Üniversite Kütüphanelerine büyük kolaylık sağlayacağı düşünülmektedir.</p> <p>Proje aşamasında bulunan ve 2018 yılında bitmesi planlanan kütüphane binası yapımının hızlandırılması için gerekli çalışmaların yapılması hem Üniversitemize hem de kullanıcılarımıza büyük fayda sağlayacaktır.</p>
Geleceğe Çıkarılan Dersler	Bütçe imkânları, bina kapasitesi ve konusunda uzman personel sayısının artırılması halinde araştırmacı ve kullanıcılarımızın ihtiyaçlarına daha kaliteli hizmet verileceği düşünülmektedir.

Tablo 13. Muhtelif İşler 1 (Bilgi İşlem Daire Başkanlığı)

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)		
Proje No	2017H032280	-
Proje Adı	Muhtelif İşler (KOP)	
Sektör/A	1-Kamera İzleme Merkezlerinde kullanılmak üzere İş İstasyonu Alımı 2-Mail Sisteminde Eposta yolu ile gelen ve giden zararlı içerikleri filtreleyip engelleyecek spam Gateway yazılımı alımı. 3-EBYS-Elektronik Belge Yönetim Sistemi Bakım Onarım Destek ve Güncelleme Yazılımı Alımı. 4-Kartlı Geçiş sisteminin daha verimli kullanılabilmesi ve yeni yapılan binaların Kartlı geçiş sistemine dahil edilebilmesi için kurulum, Eğitim Devreye Alma ve Donanım mal ve malzemesi alımı. 5-Merkez kampüs İç ve Dış Ortamların Güvenliğinin sağlanması amacıyla Güvenlik Kamerası ve Ekipmanları Alımı. 6-Microsoft Lisans Yazılım Programı Alımı 7) – C panel Yazılım Lisansı (Yazılım Programı)	
Proje Amacı		
Proje Yeri	Aksaray Üniversitesi – Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	
Karakter istifi	-	
Fiziki Hedefi	Üniversitemizin bilişim ekipmanlarının ve Yazılımlarının daha güncel, güvenilir hale getirmek	
Başlama-Bitiş Tarihi	2017/2017	
Proje Sözleşmesi Tarihi	1) İş İstasyonu Alımı (09/05/2017) 2) Zararlı içerik engelleyici- spam Gateway yazılımı alımı (27/07/2017) 3) EBYS (11/09/2017) 4) Kamera Sistemi Ekipmanı Alımı. (27/10/2017-29/12/2017) 5)Kartlı Geçiş Sistemi Donanım ve Ekipmanları Alımı	Sözleşme İhale Bedeli 57.059 15.930 16.744 1.411.995 98.648

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 2017 KAMU YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

(18/12/2017)						
6) Microsoft Lisans Yazılım Programı Alımı(09/10/2017)					58.705	
7) – C panel Yazılım Lisansı (Yazılım Programı)					2.053	
TOPLAM					1.661.584	

Proje Tutarı (Maliyeti)	Dış		Toplam(*)		Kamulaştırma	
	Dış	Toplam(*)	Dış	Toplam(*)	Dış	Toplam(*)

Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama()**

	Cari Fiyatlarla		2015 Yılı Fiyatlarıyla		Kamulaştırma
	Dış	Toplam(*)	Dış	Toplam(*)	
Programa Alındığı Yıl (2017)		57.059		57.059	
		15.930		15.930	
		16.744		16.744	
		1.411.995		1.411.995	
		98.648		98.648	
		58.705		58.705	
		2053		2053	
TOPLAM		1.661.584		1.661.584	

Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler

Projenin Çıktısı/Sonucu (Ürünü)	1) Merkez Kampüs İçerisindeki Eski ve Yeni Binaların Güvenliklerinin Sağlanması amacıyla Kamera ve Ekipmanları alınmış ve kurulumları yapılarak aktif hale getirilmiştir.
	2) Mail Sistemine E-Posta Yolu ile Gelen giden zararlı İçerikler filtrelenmeye ve büyük ölçekte engellenmeye başlanmıştır.
	3) EBYS(Elektronik Belge Yönetim Sistemi) Personelimizin İhtiyaçlarını karşılayacak düzeyde geliştirilmiş bakım onarımı ve genel güncelleme yapılmıştır
	4) Mevcut durumdaki Kartlı Geçiş Sistemimiz daha verimli olarak kullanılmaya başlanmış olup, Merkez Kampüsündeki bazı binalar kartlı geçiş sistemine dâhil edilmiştir.
	5) Microsoft Lisans Alınmış ve personelimizin kullanımına sunulmuştur.
	6) Merkez Kampüsümüzde aktif hale gelen kamera sistemine entegre olarak bazı binalarda kamera İzleme Merkezleri kurulmuştur.
	7) C panel Yazılım Lisansı (Yazılım Programı)
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı	Üniversitemizin Güvenliğinin temin edilmesi, Üniversitemiz EBYS sistemini güncel hale getirmek, Microsoft Lisans Yazılımları Teknik Servis Birimimize getirilen, gönderilen ve satın alınan her bilgisayara uygulanmıştır. Mail Sisteminde Eposta yolu ile gelen ve giden zararlı içerikleri filtreleyip engelleyecek spam Gateway yazılımı uygulamaya koyulmuştur. Web sitemizde uygulanmak üzere C panel Lisansı alımı.
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü	Gelişen teknolojiye ayak uydurma kapsamında hizmet içi eğitim anlamında eksikliklerle karşılaşmış olup, tüm üniversite personelimize verilen eğitimler ile karşılaşılabilecek sorunlar büyük ölçüde ortadan kaldırılmıştır.

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 2017 KAMU YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

Tablo 14. Muhtelif İşler 2 (İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı)

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)															
				Yatırım Programına Alınmış Değerleri				Revize Edilmiş Son Değerler							
Proje No		2017 H 032280													
Proje Adı		Muhtelif işler (Kop)													
Sektör/Alt sektör		B.on.Tad.Mak.Tec.Bil.Don.Alt. Bak.On.İd.Yen.													
Proje Amacı		Yeni açılan fakültelerin donanım, makine teçhizat alımı													
Proje Yeri		Aksaray Üniversitesi													
Karakteristiği															
Fiziki Hedefi		Okulların kullanılabilir hale getirilmek ve Laboratuvarların İhtiyaçlarını karşılamak.													
Başlama-Bitiş Tarihi		2017-2017													
Proje Sözleşmesi Tarihi		2017 yılı		Sözleşme İhale Bedeli		4091 (DMO)									
Proje (Maliyeti)		Tutarı		Dış		Toplam(*)		Kamulaştırma		Dış		Toplam(*)		Kamulaştırma	
Makine Teçhizat alımı				1.800				1.800							
Büro Mefruşat alımı				2.291				2.291							
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)															
				Cari Fiyatlarla				2017 Yılı Fiyatlarıyla							
		Dış		Toplam(*)		Kamulaştırma		Dış		Toplam(*)		Kamulaştırma			
Programa Alındığı Yıl (2017)				4.091.000				4.091.000							
Makine Teçhizat alımı				1.800.000				1.800.000							
Büro Mefruşat alımı				2.291.000				2.291.000							
Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler															
Projenin Çıktısı/Sonucu		Okulların tefrişini sağlanmış ayrıca Laboratuvarların ihtiyaçları 2017 yılı için giderilmiştir.													
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar		Öğrenci sayısının artması, binaların büyümesi, öğrenci ve çalışan personele faydalı okuma ve çalışma imkânlarının sağlanması. Laboratuvarların daha modern hale getirilmesi.													

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 2017 KAMU YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

Tablo 15. Muhtelif İşler 3-1 (Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı)

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)															
				Yatırım Programına Alınış Değerleri				Revize Edilmiş Son Değerler							
Proje No		2017H032280													
Proje Adı		Muhtelif İşler (KOP)													
Sektör/Alt sektör		Eğitim/Yükseköğretim													
Proje Amacı		Büyük Onarım													
Proje Yeri		Aksaray													
Karakteristiği		B. On. Ted. Mak. Tec. Bil. Don. Yaz. Alt. Bak. On. İd. Yen.													
Fiziki Hedefi															
Başlama-Bitiş Tarihi		2017-2017													
Proje Sözleşmesi Tarihi		17		14.08.20		Sözleşme İhale Bedeli		365,00							
Proje (Maliyeti)		Tutarı		Dış		Toplam(*)		Kamulaştırma		Dış		Toplam(*)		Kamulaştırma	
				430,70						430,70					
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)															
						Cari Fiyatlarla			2015 Yılı Fiyatlarıyla						
		Dış		Toplam(*)		Kamulaştırma		Dış		Toplam(*)		Kamulaştırma			
Programa Alındığı Yıl 2017		430,70						430,70							
Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler															
Projenin Çıktısı/Sonucu (Ürünü)		Şereflikoçhisar Berat Cömertoğlu MYO'nun mevcut ısınma sisteminin yenilenmesi ve muhtelif tadilatları yapılan ihale kapsamında değiştirilmiştir.													
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı															

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 2017 KAMU YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

Tablo 16. Muhtelif İşler 3-2 (Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı)

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)															
				Yatırım Programına Alınış Değerleri				Revize Edilmiş Son Değerler							
Proje No		2017H032280													
Proje Adı		Muhtelif İşler (KOP)													
Sektör/Alt sektör		Eğitim/Yükseköğretim													
Proje Amacı		Büyük Onarım													
Proje Yeri		Aksaray													
Karakteristiği		B. On. Ted. Mak. Tec. Bil. Don. Yaz. Alt. Bak. On. İd. Yen.													
Fiziki Hedefi															
Başlama-Bitiş Tarihi		2017-2017													
Proje Sözleşmesi Tarihi		31.07.2017		Sözleşme Bedeli		İhale		216,00							
Proje (Maliyeti)		Tutarı		Dış		Toplam(*)		Kamulaştırma		Dış		Toplam(*)		Kamulaştırma	
				254,88											
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)															
				Cari Fiyatlarla				2015 Yılı Fiyatlarıyla							
		Dış		Toplam(*)		Kamulaştırma		Dış		Toplam(*)		Kamulaştırma			
Programa Alındığı Yıl 2017		254,88						254,88							
Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler															
Projenin Çıktısı/Sonucu (Ürünü)		Sağlık Bilimleri Fakültesi'nin mevcut ısınma sisteminin yenilenmesi ve muhtelif tadilatları yapılan ihale kapsamında değiştirilmiştir.													
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı															

III. SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Yeni kurulan üniversitelerdeki gelişim ivmesi eski üniversitelere nazaran daha fazla olmasına rağmen, gelir kaynakları daha kısıtlıdır. Ayrıca, döner sermaye gelirlerinin de yeterli düzeyde olmaması yatırımların sadece bütçe imkânları ile gerçekleştirilmesine neden olmaktadır.

Başka bir durum ise, kamu yatırımlarının ihale sürecinde mevzuatta öngörülen sürenin uzunluğu, ihale sonrası ihalelere yapılan itirazların çözüme kavuşturulması, ihalelerin zamanında sonuçlanması ve yatırım projelerinin zamanında tamamlanması konularında sorunlar yaşanabilmektedir. Bu sebeple ihale süreçlerine yönelik olarak mevzuatta yapılabilecek düzenlemeler ihalenin daha kısa sürede sonuçlanmasına olanak verecek şekilde düzenlenmesiyle yatırımların planlanan sürede hayata geçirilmesine katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Yukarıda tespit edilen durumlar göz önünde bulundurulduğunda çözüm önerisi olarak;

1. Elektronik ortamda sunulan ve büyük çoğunluğu yurtdışı kaynaklı olan veri tabanlarının TÜBİTAK/ULAKBİM tarafından satın alınarak tüm üniversitelerin hizmetine sunulması, hem yaşanan mevzuat sorunlarının çözümünde büyük katkı sağlayacaktır. Hem de alımın her bir Üniversite Kütüphanesi üzerinden değil tek bir kaynaktan yapılması durumunda elektronik kaynaklara aktarılan ve yurt dışına gönderilmek zorunda kalınan büyük tutarlardaki ülke kaynaklarının azalacağı,
2. Doğrudan Temin sınırının büyükşehirler ile aynı seviyeye getirilmesinin Anadolu Üniversite Kütüphanelerine büyük kolaylık sağlayacağı,
3. Kütüphanelere ayrılan bütçe imkânlarının artırılmasının kullanıcılarımıza yeni bilgi kaynaklarına daha hızlı ve kolay erişimi sağlaması açısından önemli olduğu,
4. Kalkınma Bakanlığınca verilen ödeneklerin her yıl sadece belli oranda değil, kurumların öğrenci sayıları, binalarının ve çevrenin fiziki koşulları gözetilerek ödenek dağıtımına gidilmesi,
5. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu'nda yatırımlara yönelik yapılacak ihalelerde ihale ve itiraz sürelerinin kısaltılmasına yönelik çalışmaların yapılmasının daha etkin hizmet getireceği yönünde önerilerimiz bulunmaktadır.

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 2017 KAMU YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

IV. 2017 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZET TABLOSU (*)

Kurum Adı: AKSARAY ÜNİVERSİTESİ

Bütçe Türü: ÖZEL BÜTÇE

2017 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı		2016 Sonu Kümülatif Harcama			2017 Yılı Program Ödenek			2017 Yılı Revize Ödenek			2017 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme		
		Dış	Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam
				Kredi	Öz kaynak		Kredi	Öz kaynak		Kredi	Öz kaynak		Kredi	Öz kaynak	
Tarım															
Madencilik															
İmalat															
Enerji															
Ulaştırma.- Hab.															
Turizm															
Konut															
Eğitim	6		278.408			232.289			27.200			31.549			25.336
Sağlık															
TOPLAM	6		278.408			232.289			27.200			31.549			25.336

(*) Genel Bütçe, Özel Bütçe, KİT, Özelleştirme Kaps. Kur. Döner Sermaye, Mahalli Katkı, Fon, Hibe vs. gibi birden fazla farklı kaynaktan finansman sağlayarak yatırım yürüten kuruluşlar, bu tabloyu toplam yatırımlar ve her bir bütçe türü itibarıyla ayrı ayrı hazırlayacaklardır.



AKSARAY
2018
