



**T.C.**  
**AKSARAY ÜNİVERSİTE**

**2015 YILI**  
**YATIRIM PROGRAMI İZLEME**  
**VE**  
**DEĞERLENDİRME RAPORU**

**Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı**  
**Aksaray Üniversitesi Kampüsü**  
**Tel : 0 388 288 21 10**  
**Fax: 0 388 288 21 16**

<b>İçindekiler</b>	<b>Sayfa No</b>
<b>SUNUŞ</b>	<b>3</b>
<b>1-GENEL DEĞERLENDİRME</b>	<b>4</b>
1.1 Misyon ve Vizyon	4
1.2 Temel Amaç ve Hedefler	5,6
1.3 Kuruluş Yatırımlarının Finansman Kaynakları	7,8
1.3.1- Sermaye Bütçesi	8
1.4- Kuruluşun Mevcut Hizmet Kapasitesi	9
1.4.1 Fiziksel Yapı	9,10,11,12
1.4.2 İnsan Kaynakları	13,14,15
1.4.3 Öğrenci Sayıları	16,17,18
1.5 2015 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen kapasite	19,20,21,22
<b>2- 2015 YILI PROJE UYGULAMALARI</b>	<b>23,24,25,26,27,28,29,30</b>
<b>2.1 DEVAM EDEN PROJELER</b>	<b>31</b>
2008H050070 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi (KOP)	31
1994H032360 Kampüs Altyapısı Projesi (KOP)	32
2008H030630 Derslik ve Merkezi Birimler Projesi (KOP)	33
<b>2.2 BİTEN PROJELER</b>	<b>34,35</b>
2015H030260 Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi (KOP)	36
2015H030270 Muhtelif İşler Projesi (KOP)	37,38,39,40
2015H030280 Yayın Alımları (KOP)	40,41,42
<b>3-SORUNLAR VE ÇÖZÜME YÖNELİK ÖNERİLER</b>	
3.1 Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar	43
3.2 Öneriler	44
<b>4- TABLOLAR</b>	
2015 Yılı Kamu Yatırımları Özet Tablosu (Ek 3)	45
2015 Yılı Gerçekleşme Tutarları Tablosu	46

## SUNUŞ

Kamu idarelerinin şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim tarzına kavuşturulması amacıyla 5018 sayılı “Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu” çıkarılarak yürürlüğe girmiştir. Bu kanunun öngördüğü sistemin gerçekleştirilebilmesi için, bütçe ve ödenek tahsis edilen harcama birimlerinin her yıl çeşitli raporlar hazırlaması ve bu raporlarla idarelerin yaptıkları harcamaların ve verimliliğin kontrol edilmesi şeklinde bir yol izlenmektedir.

Bu kapsamda Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporunda idarenin kullandığı kaynaklar ile yıl içerisinde gerçekleştirmek istediği hedeflerine ulaşma düzeyinin gösterilmesi büyük önem arz etmektedir.

Üniversitemizin, stratejik plan ile belirlemiş olduğu hedeflere ulaşmak ve bu hedeflere ulaşabilmek için gerekli yatırımların yapılması, bu yatırımlar yapılırken tahsis edilen kaynakların etkin, ekonomik ve verimli kullanılması önceliklerimiz arasında yer almaktadır.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 25 inci maddesi gereğince hazırlanması gereken, Üniversitemizin 2015 yılı yatırım projeleri ile ilgili uygulamaların ve sonuçlarının, program ve revize ödeneklerin, harcamaların, nakdi ve fiziki gerçekleşme oranlarının, uygulamada karşılaşılan sorunların ve bu sorunların çözümüne yönelik önerilerimizin de yer aldığı “2015 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu” hazırlanarak kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

Saygı ile arz olunur.

Prof. Dr. Yusuf ŞAHİN  
Rektör

# 1-GENEL DEĞERLENDİRME

Bakanlar Kurulu tarafından, 2006 yılı içinde kurulması kabul edilen bir devlet üniversitesidir.

17 Mart 2006 tarihli 26111 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 5467 sayılı kanunla Niğde Üniversitesi' ne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek, fakülte ve yüksekokullar kendi bünyesinde oluşturulan Aksaray Üniversitesi Rektörlüğe bağlanmıştır. Rektör Prof. Dr. Yusuf ŞAHİN' dir.

Aksaray Üniversitesi'nde 10 Fakülte, 4 Yüksekokul, 7 Meslek Yüksekokulunda ön lisans ve lisans düzeyinde eğitim yapılmaktadır. Lisansüstü eğitim üniversiteye bağlı Fen ve Sosyal Bilimler Enstitüleri bünyesinde sürdürülmektedir.

## 1.1-Misyonumuz

Tüm paydaşların ihtiyaçlarına odaklanarak, bilgi ve teknolojiyi kullanabilen, rekabetçi girişimci,yenilikçi atılımlarla bölge ve ülkenin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimine katkı sağlayabilecek nitelikte insan gücü yetiştirmektir.

## 1.1-Vizyonumuz

Üniversite-sanayi-toplum işbirliği temelinde evrensel düzeyde faydalı bilgi ve yenilik üreterek, bilim ve teknolojinin gelişimine ortak olan bir üniversite olmaktır.

## 1.2-Temel Amaç ve Hedefler

### Stratejik Amaç 1-Ulusal ve Uluslar arası Alanda Eğitimde Rekabet Etmek

- **Hedef 1:** Yürütülmekte olan programların niteliklerinin ulusal ve uluslararası normlara ve beklentilere göre güncellenmesi,
- **Hedef 2:** Toplumsal beklenti, sektörel ve bölgesel eğitimler ile ülke hedefleri çerçevesinde yeni programların oluşturulması, geliştirilmesi ve iyileştirilmesi;
- **Hedef 3:** Ulusal ve uluslararası öğrenci ve öğretim elemanı hareketliliği sağlayan programların ve programa dahil olacak öğrenci ve öğretim elemanı sayılarının artırılması;
- **Hedef 4 :** Öğrencilerde girişimcilik bilincinin geliştirilmesi ve bu yöndeki uygulamaların sürdürülmesi;
- **Hedef 5:** Öğrencilere yönelik beslenme, sağlık, sosyal, kültürel,sanatsal ve sportif hizmetlerin etkin ve verimli bir şekilde sunulması ve bu alanlardaki olanakların artırılması.

### Stratejik Amaç 2- Kurumun Fiziki Alt yapısını Oluşturmak, Geliştirmek ve İyileştirmek

- **Hedef 1 :** Eğitim öğretim alt yapısının oluşturulması, geliştirilmesi ve iyileştirilmesi;
- **Hedef 2 :** Akademik ve idari hizmet birimlerinin her türlü mal ve malzeme hizmet alımının temini ve yeni binaların tefrişi;
- **Hedef 3 :** Sosyal ve spor alanlarının oluşturulması, geliştirilmesi ve iyileştirilmesi;
- **Hedef 4 :** İdari hizmet alanlarının alt yapısının oluşturulması, geliştirilmesi ve iyileştirilmesi;

### **Stratejik Amaç 3- Ulusal ve Uluslararası Araştırma Olanaklarını Arttırmak ve Ar-Ge Çalışmalarını Teşvik Etmek**

- **Hedef 1:** Araştırma olanaklarını arttırmak için insan kaynağının geliştirilmesi,
- **Hedef 2 :** Araştırma olanaklarının artırılması için maddi kaynak yaratılması ve basın- yayın olanaklarının geliştirilmesi;
- **Hedef 3 :** Ulusal ve uluslararası proje ve yayın sayısının artırılması;
- **Hedef 4 :** Yeni ürün ve fikirlerin ticarileştirilmesi teşvik edilerek, patent gibi çıktıların artırılması.

### **Stratejik Amaç 4- Kurumsal Yapının Sürdürülebilirliğini ve Gelişimini Sağlamak**

- **Hedef 1:** Ulusal ve uluslararası iletişim ve işbirliği ağlarının artırılması,
- **Hedef 2 :** Üniversitenin tanıtımı için ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtım çalışmalarının ve etkinliklerinin artırılması;
- **Hedef 3 :** Yönetim sistemlerinin geliştirilmesi;
- **Hedef 4 :** Akademik ve idari personelin gelişiminde sürekliliğin sağlanması;
- **Hedef 5 :** Beşeri kaynakların niceliğinin artırılması .

### **Stratejik Amaç 5- Paydaşlarla Etkileşim Kalitesini Arttırmak**

- **Hedef 1 :** Paydaşlarla iletişim ve işbirliğinin geliştirilmesi;
- **Hedef 2 :** Mevcut kapasite ile eğitim- araştırma sonuçlarından elde edilen birikimin topluma yönelik ürün ve hizmetlere dönüştürülmesi

## 1.3-Yatırımların Finansman Kaynakları

Üniversitemiz 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununa ekli (II) Sayılı Özel Bütçeli İdareler Cetvelinin (A) Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler ve İleri Teknoloji Enstitüleri içerisinde sayılmış olup, ‘Özel Bütçeli’ bir kurumdur.

### Özel Bütçe Gelirleri

a. Hazine yardımı

b. Öz gelirler

(Örgün öğretim, II. Öğretim, Doktora, Yüksek Lisans, Tezsiz Yüksek Lisans ve Yaz Okulu harç gelirleri, Döner Sermaye gelirlerinden aktarılan Bilimsel Araştırma Proje Payları, Lojman Kira Gelirleri ile Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri )

### 1.3.1- Sermaye Bütçesi

(1.000)

• <b>Eğitim Sektörü:</b>	<b>22.500</b>
Etüt Proje	100
Kampüs Altyapı	3.000
Derslik ve Merkezi Birimleri	15.400
Muhtelif İşler	3.500
Yayın Alımları	500
• <b>Spor Sektörü</b>	<b>2.500</b>
Açık ve Kapalı Spor Tesisleri (KOP)	2.500
• <b>TOPLAM</b>	<b>25.000</b>

Tablo 1 : Yatırım Bütçesi Tablosu

(1000)

BİRİM ADI	KBÖ	YILSONU TOPLAM ÖDENEK	HARCAMA	HARCAMA %
İdari Mali İşler Daire Başkanlığı (06.1)	2.700	4.200	3.732	88
Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı (06.5)	21.000	41.225	39.426	95
Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı (06.7)	800	1.361	1.359	99
Kütüphane Daire Başkanlığı (06.1)	500	500	500	99,99
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı (06.1)		610	602	98,5
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı (06.3)		590	566	95
<b>TOPLAM</b>	<b>25.000</b>	<b>48.486</b>	<b>46.185</b>	<b>95,25</b>

## 1.4-Mevcut Hizmet Kapasitesi

Aksaray Üniversitesi'nin İl merkezi ve ilçelerde toplam 5 yerleşkesi bulunmakta olup, yerleşkelerin toplam açık alanı 3.098.508 m<sup>2</sup> ve toplam kapalı alanı 116.783 m<sup>2</sup>'dir. Yerleşkelerin açık ve kapalı alanlarının dağılımı Tablo 1'de gösterilmektedir.



## 1.4.1-Fiziksel Yapı

### Yerleşkeler

Aksaray Üniversitesi'nin İl merkezi ve ilçelerde toplam 5 yerleşkesi bulunmakta olup, yerleşkelerin toplam açık alanı 4.960.285 m<sup>2</sup> ve toplam kapalı alanı 215.083 m<sup>2</sup>'dir. Merkez yerleşkesinde Mühendislik Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi kendi hizmet binalarında eğitime devam etmektedir. İslami İlimler Fakültesi 2016 Yılı içerisinde yeni hizmet binasına geçecek olup, 2015 yılı içerisinde Merkezi dersliklerde eğitime devam etmiştir. 2015 yılı içerisinde Isı Merkezinde eğitime devam eden Veterinerlik Fakültesi, hizmet binasının tamamlanmasını müteakip yeni binaya geçecektir. Turizm Fakültesi, İdari Birimlerin büyük bir kısmı İktisadi İdari Bilimler Fakültesi hizmet binasında yerleşmiş bulunmakta olup, 2016 yılında yeni rektörlük binasının tamamlanmasını müteakip idari birimler Rektörlük Hizmet binasına yerleşmeleri hedeflenmektedir.

Yabancı Diller Yüksekokulu merkezi dersliklerde, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Fen ve Sosyal Bilimler Enstitüleri BESYO hizmet binasında hizmet vermektedir.

**Tablo 2:Aksaray Üniversitesi Yerleşkeler Tablosu**

YERLEŞKELER	Açık alan (m <sup>2</sup> )	Kapalı alan (m <sup>2</sup> )
Aksaray Merkez Yerleşkesi	3.819.713	178.967
Hacılarharmanı Mahallesi Yerleşkesi	60.817	9.994
Tacin Mahallesi Yerleşkesi	9.823	4.668
Zafer Mahallesi	10.242	5.064
İlçe Yerleşkeleri	63.664	16.390
<b>TOPLAM</b>	<b>4.960.285</b>	<b>215.083</b>

Hacılarharmanı Mahallesi'nde Sağlık Yüksekokulu, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bulunmakta olup, eğitime bu yerleşkede devam etmektedir.

Tacin Mahallesi'nde, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bulunmaktadır.

4 ilçede Üniversiteye ait yerleşke bulunmaktadır. Şereflikoçhisar'da Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu, Şereflikoçhisar Berat Cömertoğlu Meslek Yüksekokulu yer almaktadır.



Tablo 3: Sosyal Tesisler Tablosu


SOSYAL TESİSLER	Sayı	Açık Alan m <sup>2</sup>	Kap.Alan m <sup>2</sup>	Top. Alan m <sup>2</sup>
Asü Sosyal Tesisler	1	-	33.890	33.890
Konukevi	-	-	-	-
Otel	-	-	-	-
Kafeterya	1	-	425	425
Kantin	19	-	12.892	12.892
Personel Yemekhanesi	<b>ASÜ Sosyal Tesisleri ile müşterek kullanılmaktadır.</b>			
Öğrenci Yemekhanesi				
Lojman	-	-	-	-



## Spor Tesisleri

**Tablo 4: Spor Tesisleri Tablosu**

SPOR TESİSLERİ	ADEDİ
Mini Futbol Sahası	1
Basketbol Sahası	6
Voleybol Sahası	6
Tenis Kortu	1
Kapalı Spor Salonu	1
Kapalı Yüzme Havuzu	1

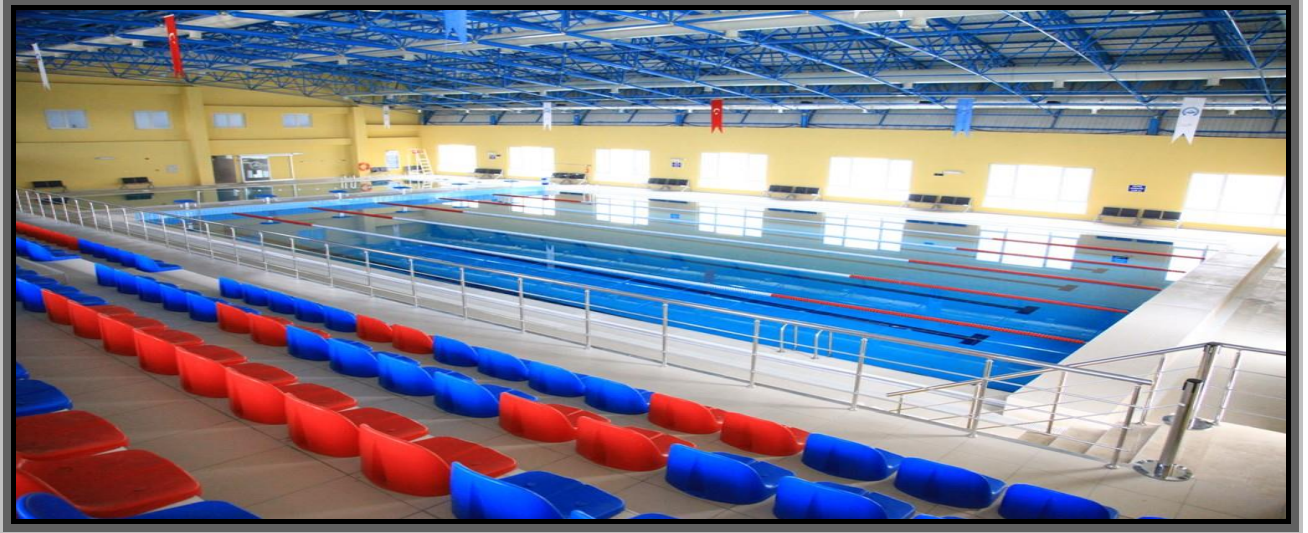

**Tablo 5 : Toplam Fiziki Alan Tablosu**

Birimler/ Alanlar	MEVCUT FİZİKİ ALANLAR M2						
	EĞİTİM ALANLARI		SOSYAL ALANLAR			Sirkülasyon alanı/Alanı	SPOR ALANLARI
	Derslik	Lab	Kantin	Lojman	Yurtlar		Açık Spor Tesisleri
<b>FAKÜLTE</b>							
Fen-Edebiyat	1.775	300	150	0	0	2.555	0
İktisadi İdari Bilimler	2.820	130	150	0	0	4.100	0
Eğitim	799	150	0	0	0	2.019	0
Eğitim(yeni Bina)	3265	432	184			8.210	3.980
Mühendislik	1.925	1.200	433	0	0	4.080	800
Mühendislik (yeni Bina)	4.595	3.793	222	0	0	14.015	0
Sağlık Yüksekokulu	<b>Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İle Müşterek Kullanılmaktadır.</b>						
BESYO	900	400	550	0	0	4150	0

<b>MYO</b>							
Teknik Bil. MYO	1.217	4.971	477	0	0	2.100	0
Sağlık Hizmetleri MYO	852	425	536	0	0	2.592	0
Ortaköy MYO	1.300	600	151	0	0	2.477	0
Şereflikoçhisar B.C. MYO	1.150	150	200	0	0	3.135	0
Ş.Koç.Uygulama	1.273	0	294	0	0	1803	0
Güzelyurt MYO	355	50	125	0	0	392	0
Sosyal Bil. MYO	519	0	160	0	0	3.087	0
<b>SPOR TESİSİ</b>							
ASÜ Spor Salonu	2.980	0	20	0	0	300	0
Atletizm Pisti	0	0	0	0	0	0	18.180
<b>SOSYAL TESİSLER</b>							
ASÜ Yemekhane	0	0	4.800	0	0	600	0
Mediko Sosyal	0	0	0	0	0	100	0
ASÜ Kütüphane	260	318	0	0	0	950	0
Merkezi Laboratuar	0	3.145	0	0	0	1.910	0
Çarşı Binası	0	0	2.700	0	0	1.200	0
Merkezi Derslik ve Anfi	5.800	0	200	0	0	4.100	0
Kapalı Yüzme Havuzu	0	0	100	0	0	400	0
Ş.K.Uygulama Oteli			1.440				
<b>Toplam Kapalı Alan</b>	<b>31.785</b>	<b>16.064</b>	<b>12.892</b>	<b>0</b>		<b>64.275</b>	<b>22.960</b>

## 1.4.2 -İnsan Kaynakları

Hızla gelişen ve bilgi toplumu haline gelen çağımızda ilerleyen bilim ve teknolojinin gerisinde kalmamak, gelişmiş ülkelerle her alanda rekabet edebilmek, yükseköğretimin ana amaç ve hedeflerine uygun, araştırmacı ve girişimci yapıya sahip bilgili, yetenekli ve üretken bireylerin yetiştirilebilmesi amacıyla insan kaynakları yönetimi de kurumun başarısını etkileyen en önemli faktörlerden biridir. Bu nedenle geleneksel yönetim anlayışından vazgeçilip yeni çalışma stratejilerine uygun politikalar benimsemek gerekmektedir. İnsan kaynaklarını en doğru ve en verimli şekilde organize edilmesi kurumun başarısını etkileyen başlıca faktörlerden biridir. Çalışanların bilgi, beceri ve yeteneklerine uygun alanlarda istihdam edilip, bu alanlarda yükselmelerine olanak sağlamak ana hedeflerimizdendir.

Üniversitemiz, çalışanların hareket alanlarını kısıtlamayan, insan kaynaklarında sürekli gelişime ve değişime açık bir yönetim anlayışını benimsemiştir. Çalışanların bilgi ve beceri düzeylerini artırmak için eğitim ve seminerler planlanmakta ve düzenlenmektedir. Yine çalışma ortamı, işte ilerleme/yükselme imkanı, yetki ve sorumluluk sahibi olma, yenilik ve yaratıcılık ihtiyacı, iş emniyeti, arkadaşlık ve dostluk ilişkileri, ücret, yöneticilerle olan iletişim gibi unsurların kişilerin kurumlarında önemsedikleri ve görmek istedikleri değerler olduğunun bilinciyle üniversitemiz çalışanlarının motivasyonunu artırma yönünde gerekli çalışmalar sürdürülmeye devam etmektedir.

Bu kapsamda, Aksaray Üniversitesi'nin sahip olduğu insan kaynakları, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ile ataması ve alımı yapılan akademik personel, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile ataması yapılan idari personel, 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri gereğince görev yapan yabancı uyruklu öğretim elemanları ile kısmi zamanlı öğrenciler ve 4734 sayılı İhale

Kanunu kapsamında hizmet alımı şeklinde istihdam edilen personeli kapsamaktadır.

**Tablo 6 : Akademik Kadro Sayıları Tablosu**

Akademik Personel	Dolu	Tam Zamanlı	Yarı Zamanlı
Profesör	27	Evet	
Doçent	79	Evet	
Yrd. Doçent	231	Evet	
Öğretim Görevlisi	146	Evet	
Okutman	30	Evet	
Çevirici	0	Evet	
Eğitim-Öğretim Planlamacısı	0	Evet	
Araştırma Görevlisi	196	Evet	
Uzman	21	Evet	
<b>Toplam</b>	<b>730</b>	<b>Evet</b>	

### Yabancı Akademik Personel

**Tablo 7: Yabancı Akademik Personel Tablosu**

Yabancı Uyruklu Akademik Personel	Geldiği Ülke	Çalıştığı Bölüm
Yrd. Doçent	Özbekistan	Fen Edebiyat Fakültesi
Yrd. Doçent	Azerbaycan	İktisadi ve İdari Bil. Fakül.
Yrd. Doçent	Irak	İslami İlimler Fakültesi
Yrd. Doçent	Bulgaristan	Eğitim Fakültesi
<b>Toplam</b>	<b>4</b>	<b>4</b>

## İdari Personel Sayıları

Üniversitemizde, 657 sayılı Kanun gereğince istihdam edilen idari personel sayısı 319'dur. Bu sayı içerisinde görev yapan idari personellerin hizmet sınıflarına göre dolu-boş kadro dağılımları Tablo 11'de gösterilmektedir.

**Tablo 8: İdari Personel Sayı Tablosu**

İdari Personel (Kadroların Doluluk Oranına Göre)	Dolu	Boş	Toplam
Genel İdari Hizmetler	232	158	390
Sağlık Hizmetleri Sınıfı	8	8	16
Teknik Hizmetler Sınıfı	52	32	84
Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı	-	-	-
Avukatlık Hizmetleri Sınıfı	2	1	3
Din Hizmetleri Sınıfı	-	-	-
Yardımcı Hizmetler Sınıfı	25	17	42
<b>Toplam</b>	<b>319</b>	<b>216</b>	<b>535</b>

### 1.4.3-Öğrenci Sayıları

Aksaray Üniversitesi güçlü öğretim kadrosu, seçkin öğrencileri ve alt yapı olanakları ile Türkiye'nin sayılı üniversiteleri arasında yer almak için hızla gelişmektedir.

Üniversitemizde, eğitim-öğretim; fakülte, yüksekokul, enstitüler ve meslek yüksekokullarda yarıyıl esasına göre düzenlenir. Bir eğitim-öğretim yılı bahar ve güz yarıyıllarından oluşur. Buna ek olarak, yaz yarıyılı da açılabilir. Böylece, hem fiziki kapasiteler değerlendirilmekte hem de başarılı öğrenciler normal öğrenim sürelerini kısaltma olanağı elde etmektedir. Bir yarıyıl en az 14 haftadan oluşmaktadır.



Üniversitemiz, yürüttüğü eğitim-öğretimin hedeflerine ulaşmasını sağlamak amacıyla Üniversitemizin eğitim-öğretim, araştırma, kültür ve sosyal hizmetler alt yapısını sürekli olarak daha uygar ve her öğrenci için daha erişilebilir hale getirmektedir. Eğitim-öğretim hizmeti kapsamında Üniversitemizde, 2014-2015 öğretim yılında 20.776 kayıtlı öğrenci bulunmaktadır. Bu öğrencilerin % 28,41 ön lisans (meslek yüksekokulları), %61,11'i lisans ve % 10,46 lisansüstü programlara kayıtlıdır. Öğrencilere ilişkin veriler aşağıda yer alan tablolarda gösterilmektedir.

### Genel Öğrenci Sayıları :

Tablo 9 : Genel Öğrenci Sayı Tablosu

Üniversite Genel Öğrenci Sayıları			
	Kız	Erkek	Toplam
Önlisans	2216	3687	5903
Lisans	6276	6422	12698
Yüksek Lisans	668	1394	2062
Doktora	43	70	113
<b>Toplam</b>	<b>9203</b>	<b>11573</b>	<b>20776</b>

### Yabancı Öğrenci Sayıları :

Tablo 10: Yabancı Öğrenci Tablosu

Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Sayısı				2016-2017 Kontenjan Önerisi
	Kız	Erkek	Toplam	
Önlisans	0	2	2	0
Lisans	116	500	616	486

<b>Yüksek Lisans</b>	6	41	47	0
<b>Doktora</b>	0	0	0	0
<b>Toplam</b>	<b>122</b>	<b>543</b>	<b>665</b>	<b>486</b>



### Birim Bazında Öğrenci Sayıları :

**Tablo 11: Birim Bazında Öğrenci Sayıları Tablosu**

BİRİMLER	1. Öğretim		2. Öğretim		Toplam Öğrenci
	Kız	Erkek	Kız	Erkek	
<b>Enstitüler</b>	637	1070	68	353	2128
<b>İktisadi ve İdari Bilimler Fak.</b>	837	569	665	650	2721
<b>Mühendislik Fak.</b>	549	1217	330	1134	3230
<b>Fen Edebiyat Fak.</b>	886	390	343	247	1866

<b>Eğitim Fak.</b>	1123	442	142	81	1788
<b>İslami İlimler Fak.</b>	227	127	114	102	570
<b>Turizm Fak.</b>	26	57	0	1	84
<b>Veteriner Fak.</b>	6	39	0	0	45
<b>Sağlık YO</b>	422	242	0	0	664
<b>Beden Eğitimi ve Spor YO</b>	188	313	82	133	716
<b>Ş.Koçhisar Uyg. Tek. ve İşl. YO</b>	116	89	104	89	398
<b>Aksaray Teknik Bil. MYO</b>	259	1011	11	106	1387
<b>Aksaray Sosyal Bil. MYO</b>	335	384	199	306	1224
<b>Sağlık Hizmetleri MYO</b>	229	95	0	0	324
<b>Ortaköy MYO</b>	432	905	200	263	1800
<b>Ş.Koçhisar B.C.MYO</b>	190	275	64	77	606
<b>Güzelyurt MYO</b>	297	263	0	0	560
<b>TOPLAM</b>	<b>6759</b>	<b>7488</b>	<b>2322</b>	<b>3542</b>	<b>20111</b>

(Yabancı Uyruklu Öğrenciler Hariç)

## 1.5-2015 ılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen

### Kapasite Artışı

Üniversitemiz 2015-2019 yıllarını kapsayan 2. stratejik planını uygulamaktadır. Stratejik planda yer alan hedeflerimizin içerisinde büyük bir payı yatırımlar almaktadır. Yeni kurulmuş , gelişmekte olan bir üniversite olmamız münasebetiyle fiziki altyapıya önem verilmektedir. Sermaye bütçesi hazırlanırken yeni hizmet binalarının

yapılması, bu binaların büro tefrişatının eğitime uygun olarak yapılması hedeflenmiştir. Stratejik planımızın 2015 yılı için yatırımlara yönelik öngördüğü hedefler ile 2015 yılı yatırım bütçesi ile gerçekleştirilebilen hizmetlere ilişkin veriler düzenlenerek , aşağıda gösterilmiştir.



### Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı

2015 Hedeflenen	2015 Gerçekleşen
1. 2016 yılında yapımına başlanması planlanan Kütüphane Binası projeleri, teknik şartname ve keşiflerinin hazırlanması.	1. Kütüphane Binası'na ait proje, yaklaşık maliyet ve teknik şartnamelerin hazırlanması işi tamamlanmıştır.
2. Mühendislik Fakültesi 1. Etap Yapım İş'i nin tamamlanarak hizmete açılması.	2. 2011 yılında yapımına başlanan Mühendislik Fakültesi 1. Etap Yapım İş'i tamamlanmış, geçici kabul işlemleri gerçekleştirilmiştir..

3. Eğitim Fakültesi 1. Etap Yapım İş'i'nin tamamlanarak hizmete açılması.	3.2013 yılında yapımına başlanan Eğitim Fakültesi 1. Etap Yapım İş'i tamamlanmış ve geçici kabul işlemleri yapılmıştır.
4. Rektörlük Binası Yapım İş'i'nin nakdi ve fiziki olarak %55 seviyesine getirilmesi.	4. Rektörlük Binası Yapım İş'i'nde kaba inşaat tamamlanmış, ince imalatlara devam edilmektedir. Nakdi ve fiziki olarak % 50,48 seviyesine ulaşılmıştır.
5.İslami İlimler Fakültesi İkmal İnşaatı İş'i'nin ihale işlemlerinin tamamlanarak %20 seviyesine getirilmesi.	5. 2015 yılında ihale işlemleri tamamlanarak yapımına başlanan İslami İlimler Fakültesi İkmal İş'i kaba inşaatı tamamlanmış, ince imalatlara devam edilmekle birlikte nakdi ve fiziki olarak % 80,00 seviyesine ulaşılmıştır.
6. İİBF T, L, M, N Blok Yapım İş'i'nin ihale işlemlerinin tamamlanması ve %75 seviyesine getirilmesi.	6. İİBF T, L, M, N Blok Yapım İş'i'nin ihale süreci tamamlanmış, yapımına başlanmıştır. Nakdi ve fiziki olarak % 32,82 seviyesine ulaşılmıştır.
7. Devam Eden Kampüs Altyapı 4. Etap yapım İş'i'nin %100 seviyesine getirilerek tamamlanması.	7. Kampüs Altyapı 4. Etap Yapım İş'i tamamlanmış, nakdi ve fiziki olarak % 100,00 seviyesine ulaşılmıştır.
8. 4000 Seyircili Tribün İnşaatının tamamlanması.	8. 2013 yılında yapımına başlanan 4000 Seyircili Kapalı Tribün Yapım İş'i tamamlanmış, geçici kabul işlemleri yapılmıştır.
9. Sosyal Tesis Dış Cephe Onarım İş'i'nin yapılması.	9. Büyük Onarım kapsamında Sosyal Tesis Binası dış cephe onarımı ve açık terasların alüminyum doğrama ile kapatılması işi tamamlanmıştır.
10 Kapalı alanlarda engellilerle ilgili asansör, rampa, engelli WC ler, hissedilebilir yüzeyler yapılması	10. Üniversitemiz binalarının eksik olan engelli asansörleri, engelliler için hissedilebilir yüzeyler, engelli rampaları ve bu işlere bağlı muhtelif tadilatlar, Fen Edebiyat Fakültesi ve Ortaköy MYO engelli asansörleri büyük onarım kapsamında tamamlanmıştır.

### İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

2015 Hedeflenen	2015 Gerçekleşen
1.Üniversitemizin devam eden ve yeni tamamlanacak yatırım projelerinin yıllar itibariyle gerçekleşme hedefleri göz önüne alınarak, birimlerin Büro/Okul mefruşatı, Makine-Teçhizat Bilgisayar teknolojileri ve	1.Üniversitemizin devam eden ve yeni tamamlanacak yatırım projelerinin yıllar itibariyle gerçekleşme hedefleri göz önüne alınarak, birimlerin Büro/Okul mefruşatı, Makine-Teçhizat Bilgisayar teknolojileri ve

yazılım alımlarının marjinal faydayı sağlayacak şekilde gerçekleştirilerek, üniversitemizin gelişme sürecine paralel olarak doğacak ihtiyaçlarını 2015 yılı sonuna kadar tamamlamayı hedeflemek.	yazılım alımlarının marjinal faydayı sağlayacak şekilde gerçekleştirilerek, üniversitemizin gelişme sürecine paralel olarak doğacak ihtiyaçları büyük oranda tamamlanmıştır.
2. 2015 yılında fiilen faaliyet gösteren birimler ile, inşaatı tamamlanacak olan Mühendislik Fakültesi binası ve Eğitim Fakültesi binasının Büro/Okul mefruşatı, Makine/Teçhizat, bilgisayar teknoloji ve yazılım sistemlerinin alınmasının %65'ini bitirmeyi planlamak.	2. 2015 yılında fiilen faaliyet gösteren birimler ile, inşaatı tamamlanan Mühendislik Fakültesi binası ve Eğitim Fakültesi binasının Büro/Okul mefruşatı, Makine/Teçhizat, bilgisayar teknoloji ve yazılım sistemlerinin % 95'i tamamlanmış bulunmaktadır.
3. Üniversitemizin devam eden ve yeni tamamlanacak yatırım projelerinin yıllar itibariyle gerçekleşme hedefleri göz önüne alınarak, Üniversitemiz mevcut ve yeni faaliyete geçecek birimlerinin demirbaş ile tüketimine yönelik mal ve malzeme alımlarının yapılarak kurumun işleyişinde devamlılığı sağlayarak kaynakların en yüksek marjinal faydayı sağlayacak şekilde kullanılması, verimliliği maksimize etmek	3. Üniversitemizin devam eden ve yeni tamamlanacak yatırım projelerinin yıllar itibariyle gerçekleşme hedefleri göz önüne alınarak, Üniversitemiz mevcut ve yeni faaliyete geçecek birimlerinin demirbaş ile tüketimine yönelik mal ve malzeme alımlarının yapılarak kurumun işleyişinde devamlılığı sağlayarak kaynakların en yüksek marjinal faydayı sağlayacak şekilde kullanılması, verimliliği maksimize edilmiştir.
4. 2015 yılında devam eden ve yeni tamamlanacak yatırım projelerinin yıllar itibari ile gerçekleşme hedefleri göz önüne alınarak, Güvenlik Görevlisi, Temizlik Hizmeti, Araç kiralama Hizmeti, Akaryakıt, Elektrik, Doğalgaz, Su ve Taşıt Bakım Onarım Hizmetleri ile her türlü Cari harcamaların (Temizlik Malzemeleri, her türlü kırtasiye, diğer tüketime yönelik mal ve malzemeler) Üniversitenin gelişim hedefleri ile orantılı olarak göstereceği artış oranında alımların yapılması sağlamak.	4. 2015 yılında devam eden ve yeni tamamlanacak yatırım projelerinin yıllar itibari ile gerçekleşme hedefleri göz önüne alınarak, Güvenlik Görevlisi, Temizlik Hizmeti, Araç kiralama Hizmeti, Akaryakıt, Elektrik, Doğalgaz, Su ve Taşıt Bakım Onarım Hizmetleri ile her türlü Cari harcamaların (Temizlik Malzemeleri, her türlü kırtasiye, diğer tüketime yönelik mal ve malzemeler) Üniversitenin gelişim hedefleri ile orantılı olarak göstereceği artış oranında alımların yapılması büyük oranla tamamlanmıştır.

### Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

2015 Hedeflenen	2015 Gerçekleşen
2015-2019 yılları arası Planlanan Stratejik Planda Sermaye giderlerinde (yatırım) ön görülen bir hedef olmamasına karşın, gelişen teknolojiye ayak uydurmak ve karşılaştığımız fiziki ve altyapı sorunlarını gidermek amacıyla Muhtelif işlerden ödenek aktarımı talep edilmiştir.	1)EBYS üniversitemizdeki evrak işlerini kolaylaştırması ve güçlü bir arşivleme sağlaması amacıyla hayata geçirilmiştir. 2) Üniversitemiz genelinde kullanılan mevcut bilgisayarlarımızda kullanılan işletim sistemi, ofis uygulamaları ve kullanıcı erişim yazılımlarının lisanslı kullanımı için ; Üniversitemiz ile

06.3(GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI) ve 06.01 (MAMUL MAL ALIMLARI) tertiplerine toplam 1200.000,00 TL ödenek aktarımı yapılmış olup yanda açıklamaları verilen projeler gerçekleştirilmiştir.	Microsoft arasında sözleşme yapılmıştır. 3 ) Üniversitemiz ana sistem odası için ; Güvenlik Duvarı, harici depolama birimi(storage), Sanallaştırma ve yedek alma yazılımı ihalesi yapılmış olup, alt yapıımız güçlendirilip veri kayıplarının ve siber saldırıların önüne geçilmiştir.
---	--

### Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

2015 Hedeflenen	2015 Gerçekleşen
1.Kullanıcıların bilgi ve belge hizmetlerinden daha hızlı ve etkin bir şekilde yararlanmasını sağlamak amacıyla en yeni bilgi teknolojilerini kütüphanelerimize uygulamak.	1.Kullanıcılarımızın hizmetlerimizden daha hızlı ve etkin bir şekilde yararlanmasını sağlamak amacıyla RFID Kütüphane Sistemi Kütüphanemize kazandırılmıştır.
2. Kullanıcıların gereksinim duyduğu basılı, elektronik ve görsel-işitsel bilgi kaynaklarını sağlamak.	2.Kullanıcıların gereksinim duyduğu basılı, elektronik ve görsel-işitsel bilgi kaynakları sağlanmıştır.
3.Üniversitemizin bilgi ürünlerinin akademik dünyaya sunumunu sağlamak.	3. Bilgi İşlem Daire Başkanlığınca Açık Erişim alt yapısı için gerekli elektronik hizmet satın alınamamış bu nedenle ilgili hedef gerçekleştirilememiştir.



## 2-2015 YILI PROJE UYGULAMALARI

Aksaray Üniversitesine 2015 yılı Yatırım Bütçesinden toplamda 25.000.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Eğitim sektöründe toplamda 5 adet, spor sektöründe 1 adet proje mevcuttur. Eğitim sektörü altında yer alan etüt proje işleri , muhtelif

işler, yayın alımları 2015 yılı içerisinde başlayıp, 2015 yılında sonuçlandırılmıştır.

## 2.1 Devam eden projeler

**Tablo 12 :Devam Eden Projeler Tablosu**

Proje No	Sektör	Proje Adı	Proje Sahibi
1994H032360	Eğitim (KOP)	Kampüs Altyapısı	Aksaray Üniversitesi
2008H030630	Eğitim (KOP)	Derslik ve Merkezi Birimleri	Aksaray Üniversitesi
2008H050070	Spor (KOP)	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri (4000 seyircili tr)	Aksaray Üniversitesi

## 2.2 Biten Projeler

**Tablo 13 :Biten Projeler Tablosu**

Proje No	Sektör	Proje Adı	Proje Sahibi
2015H030270	Eğitim (KOP)	Muhtelif İşler	Aksaray üniversitesi
2015H0030260	Eğitim (KOP)	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	Aksaray üniversitesi
2015H030280	Yayın alımı (KOP)	Küt. Yayın Alımı	Aksaray üniversitesi

### Devam eden projeler (Eğitim sektörü )

- **İ.İ.B.F. T, L, M ve N Bloklar Yapım İşi** : 2015 yılında ihale işlemleri tamamlanarak yapımına başlanmıştır. 2015 yılı itibariyle kaba inşaatı tamamlanmış, ince imalatlara devam edilmekle birlikte nakdi ve fiziki olarak % 32,82 seviyesine ulaşılmıştır.



Sözleşme Bedeli: 3.477.000,00 TL

Yer Teslim Tarihi: 07.04.2015

İş Bitim Tarihi: 31.05.2016



• **İslami İlimler Fakültesi İkmal İnşaatı İşi** :2015 yılında ihale işlemleri tamamlanarak yapımına başlanmıştır. 2015 yılı itibariyle kaba inşaatı tamamlanmış, ince imalatlara devam edilmekle birlikte nakdi ve fiziki olarak % 80,00 seviyesine ulaşılmıştır.

Sözleşme Bedeli: 3.430.000,00 TL

Yer Teslim Tarihi: 01.04.2015

İş Bitim Tarihi: 26.03.2016



- **Mühendislik Fakültesi Yapım İşi:** 2011 yılında yapımına başlanan Mühendislik Fakültesi 1. Etap Yapım İşi'nde 2015 yılı sonu itibariyle geçici kabul işlemleri tamamlanmıştır.



- **Eğitim Fakültesi 1. Etap Yapım İşi** : 2013 yılında yapımına başlanan Eğitim Fakültesi 1. Etap Yapım İşi'nde geçici kabul işlemleri tamamlanmıştır.



- **Rektörlük Binası Yapım İşi :** 2014 yılında ihale işlemleri tamamlanarak yapımına başlanmıştır. 2015 yılı itibariyle kaba inşaat tamamlanmış, ince

imalatlara devam edilmekle birlikte nakdi ve fiziki olarak % 50,48 seviyesine ulaşılmıştır.



• **Kampüs Altyapı 4. Etap Yapım İşi** : 2014 yılında ihale işlemleri tamamlanarak yapımına başlanmıştır. 2015 yılı itibariyle iş tamamlanmış, geçici kabul işlemleri başlamakla birlikte nakdi ve fiziki olarak % 100,00 seviyesine ulaşılmıştır



• **4000 Seyircili Kapalı Tribün Yapım İşi** :2013 yılında yapımına başlanan 4000 Seyircili Kapalı Tribün Yapım İşi'nde geçici kabul işlemleri tamamlanmıştır.



### Büyük Onarım Faaliyetleri

- **Engelli Asansörü, Hissedilebilir Yüzey ve Muhtelif Tadilat İşleri :**

Üniversitemiz binalarının eksik olan engelli asansörleri, engelliler için hissedilebilir yüzeyler, engelli rampaları ve bu işlere bağlı muhtelif tadilatlar yapılan ihale kapsamında tamamlanmıştır.

Sözleşme Bedeli: 984.000,00 TL

Yer Teslim Tarihi: 11.08.2015

İş Bitim Tarihi: 25.10.2015



## 2.1 Devam Eden Projeler

Derslik ve merkezi birimler projesi kapsamında İslami İlimler Fakültesi, İktisat Fakültesi'nin T,L,M,N blok inşaatı, Rektörlük hizmet binasının yapım işleri devam etmektedir. Devam eden projelere ilişkin veriler tabloda gösterilmiştir.

Proje No	2008H030630
Projenin Adı	DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER (KOP)
Harcamayı Yapan/Yaptıran Birim	YAPI İŞLERİ TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
Kullanılabilir Ödenek Gönderme	15.400
Kurum İçi Ödenek Aktarma	0
Kurum İçi Ödenek Ekleme	16.500
Kullanılabilir Ödenek	31.900
Harcama	30.840
Kalan Ödenek	1.060
Nakdi Gerçekleşme%	%97
Fiziki Gerçekleşme	%75



• **Kampüs Altyapı 4. Etap Yapım İşi** : 2014 yılında ihale işlemleri tamamlanarak yapımına başlanmıştır. 2015 yılı itibariyle iş tamamlanmış, geçici kabul işlemleri başlamakla birlikte nakdi ve fiziki olarak % 100,00 seviyesine ulaşılmıştır. Kampüs Altyapı 4. Etap yapım işine ilişkin veriler tablo gösterilmiştir.

Proje No	1994H032360
Projenin Adı	KAMPÜS ALTYAPI 4. ETAP
Harcamayı Yapan/Yaptıran Birim	YAPI İŞLERİ TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
Kullanılabilir Ödenek Gönderme	3.000
Kurum İçi Ödenek Aktarma	0
Kurum İçi Ödenek Ekleme	2.100
Kullanılabilir Ödenek	5.100
Harcama	5.042
Kalan Ödenek	58
Nakdi Gerçekleşme%	%99
Fiziki Gerçekleşme	%80

- **4000 Seyircili Kapalı Tribün Yapım İşi** :2013 yılında yapımına başlanan 4000 Seyircili Kapalı Tribün Yapım İşi'nde geçici kabul işlemleri tamamlanmıştır.Tribün inşaatına ilişkin veriler aşağıdaki gibidir.

Proje No	2008H050070
Projenin Adı	4000 SEYİRCİLİ TİRÜBÜN İNŞAATI
Harcamayı Yapan/Yaptıran Birim	YAPI İŞLERİ TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
Kullanılabilir Ödenek Gönderme	2.500
Kurum İçi Ödenek Aktarma	0
Kurum İçi Ödenek Ekleme	1.625
Kullanılabilir Ödenek	4.125
Harcama	3.476
Kalan Ödenek	649
Nakdi Gerçekleşme%	%84
Fiziki Gerçekleşme	%70

## 2.2 Biten Projeler :

### Muhtelif İşler

Muhtelif işler kapsamında, İdari Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından,2015 yılı içerisinde yapımı tamamlanmış olan Eğitim Fakültesi 1. Etap , Mühendislik Fakültesi 1. Etap Hizmet binalarının tefriş işleri, makine teçhizat alımı yapılmış hizmet binalarının bu kapsamdaki ihtiyaçlarının %100 yakını tamamlanmıştır.

Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı tarafından üniversitemiz binalarının eksik olan engelli asansörleri, engelliler için hissedilebilir yüzeyler, engelli rampaları ve bu işlere bağlı muhtelif tadilatlar yapılmıştır.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından Microsoft Lisans Sözleşmesi, Sistem Odası yenileme işi, EBYS yazılım alımı, Elektronik Sertifika ve Mini kart okuyucu Web İçin Yazılım Alımı işlemleri yapılmıştır.

Proje No	2015H030270
Projenin Adı	MUHTELİF İŞLER (KOP)
Harcamayı Yapan/Yaptıran Birim	İdari Mali İşler Daire Başkanlığı
	Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı
	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Kullanılabilir Ödenek Gönderme	4.000
Kurum İçi Ödenek Ekleme	3.261
Kullanılabilir Ödenek	6.758
Harcama	
Kalan Ödenek	503
Nakdi Gerçekleşme%	95
Fiziki Gerçekleşme %	100

## Yayın Alımları

Üniversitemiz Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından 2015 Aralık Ayı sonu itibariyle Açık İhale ve Doğrudan Temin Usullerine göre 1776 kalem basılı yayın alımı, 42 adet e-kitap alımı, 13 Adet Veritabanı ile 1 adet Tez Tarama Veritabanı (Elektronik Ortamda) ve 1 Adet Elektronik Dergi Aboneliği gerçekleştirilmiştir.

Proje No	2015H030280
Projenin Adı	YAYIN ALIMI (KOP)
Harcamayı Yapan/Yaptıran Birim	KÜTÜPHANE DAİRE BAŞKANLIĞI
Kullanılabilir Ödenek Gönderme	500
Kurum İçi Ödenek Aktarma	
Kurum İçi Ödenek Ekleme	
Kullanılabilir Ödenek	500
Harcama	500
Kalan Ödenek	
Nakdi Gerçekleşme%	100
Fiziki Gerçekleşme	100

**PROJE TAMAMLAMA RAPORU (1)**

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)						
	Yatırım Programına Alınış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler		
Proje No	2015H030260					
Proje Adı	Çeşitli Ünitelerin etüt Projesi (KOP)					
Sektör/Altsektör	Eğitim/Yükseköğretim					
Proje Amacı	Etüt-Proje					
Proje Yeri	Aksaray					
Karakteristiği	Etüt-Proje-Müşavirlik					
Fiziki Hedefi						
Başlama-Bitiş Tarihi	2015-2015					
Proje Sözleşmesi Tarihi	27.03.2015		Sözleşme İhale Bedeli	56,7		
Proje Tutarı (Maliyeti)	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
		66,9				
<b>Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)</b>						
	Cari Fiyatlarla			2015 Yılı Fiyatlarıyla		
	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
Programa Alındığı Yıl 2015		66,9			66,9	
<b>Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler</b>						
Projenin Çıktısı/Sonucu (Ürünü)	Kütüphane Binası mimari, statik, mekanik ve elektrik projeleri, teknik şartnameler, mahal listeleri, metraj, keşif ve yaklaşık maliyet cetvelleri hazırlanmıştır.					
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar						
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı						
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü						
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler						

(\*) Kamulaştırma Hariç

**PROJE TAMAMLAMA RAPORU (2)**

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)						
	Yatırım Programına Alınış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler		
Proje No	2015H030270					
Proje Adı	Muhtelif İşler (KOP)					
Sektör/Altsektör	Eğitim/Yükseköğretim					
Proje Amacı	Büyük Onarım					
Proje Yeri	Aksaray					
Karakteristiği	B. On. Ted. Mak. Tec. Bil. Don. Yaz. Alt. Bak. On. İd. Yen.					
Fiziki Hedefi						
Başlama-Bitiş Tarihi	2015-2015					
Proje Sözleşmesi Tarihi	06.08.2015		Sözleşme İhale Bedeli	984		
Proje Tutarı (Maliyeti)	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
		1359				
<b>Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)</b>						
	Cari Fiyatlarla			2015 Yılı Fiyatlarıyla		
	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
Programa Alındığı Yıl 2015		1359			1359	
<b>Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler</b>						
Projenin Çıktısı/Sonucu (Ürünü)	Üniversitemiz binalarının eksik olan engelli asansörleri, engelliler için hissedilebilir yüzeyler, engelli rampaları ve bu işlere bağlı muhtelif tadilatlar yapılan ihale kapsamında tamamlanmıştır.					
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar	Engelliler için yatay ve düşey erişilebilirlik konusunda eksiklikler büyük ölçüde tamamlanmış, ayrıca sosyal Tesis Binası dış cephe ve teras kapatma işleri tamamlanarak fiziki alanda rahatlama sağlanmıştır.					
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı						
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü						

**PROJE TAMAMLAMA RAPORU (3)**

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)						
	Yatırım Programına Alınış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler		
Proje No	2015 H 030270					
Proje Adı	Muhtelif işler (Kop)					
Sektör/Altsektör	B.on.Tad.Mak.Tec.Bil.Don.Alt. Bak.On.İd.Yen.					
Proje Amacı	Yeni açılan fakültelerin donanım, makine teçhizat alımı					
Proje Yeri	Aksaray Üniversitesi					
Karakteristiği						
Fiziki Hedefi	Okulların kullanılabilir hale getirilmesi.					
Başlama-Bitiş Tarihi	2015-2015					
Proje Sözleşmesi Tarihi	2015 yılı		Sözleşme İhale Bedeli	3732 (DMO)		
Proje Tutarı (Maliyeti)	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
Makine Teçhizat alımı		2700			2700	
Büro Mefruşat alımı		1032			1032	
<b>Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)</b>						
	Cari Fiyatlarla			2015 Yılı Fiyatlarıyla		
	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
Programa Alındığı Yıl (2015)		3732			3732	
Makine Teçhizat alımı		2700			2700	
Büro Mefruşat alımı		1032			1032	
2015						
<b>Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler</b>						
Projenin Çıktısı/Sonucu (Ürünü)	Okulların tefrişini sağlamıştır.					
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar	Öğrenci sayısının artması, binaların büyümesi, öğrenci ve çalışan personele faydalı okuma ve çalışma imkanlarının sağlanması.					
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı						

**PROJE TAMAMLAMA RAPORU (5)**

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)						
Proje No	2015H030270		-			
Proje Adı	Muhtelif İşler (KOP)					
Sektör/Altsektör	Yazılım Alımları(EBYS, Microsoft Lisans, Web Yazılımı), Sistem Odası için Mal ve Hizmet Alımı					
Proje Amacı						
Proje Yeri	Aksaray Üniversitesi – Bilgi İşlem Daire Başkanlığı					
Karakteristiği	-					
Fiziki Hedefi	Üniversitemizin bilişim altyapısını sağlıklı ve güvenli hale getirmek.					
Başlama-Bitiş Tarihi	2015-2015					
Proje Sözleşmesi Tarihi	1) Microsoft Lisans Söz.(12/08/2015) 2) Sistem Odası İhalesi(25/11/2015) 3)EBYS (09/11/2015 4)Elektronik Sertifika ve Mini kart okuyucu 5)Web İçin Yazılım Alımı (15/12/2015) 6)EBYS için tarayıcı alımı <b>TOPLAM</b>	<b>Sözleşme İhale Bedeli</b>	1) 34 2) 758 3) 95 4) 35 5) 17 6) 50 <b>989</b>			
Proje Tutarı (Maliyeti)	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
<b>Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)</b>						
	Cari Fiyatlarla			2015 Yılı Fiyatlarıyla		
	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
Programa Alındığı Yıl (2015)		40 895 112 42 19 59			40 895 112 42 19 59	
TOPLAM		<b>1167</b>			<b>1167</b>	



Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler	
<b>Projenin Çıktısı/Sonucu (Ürünü)</b>	1) EBYS programı aktif hale gelmiştir. 2) Sistem odası altyapımız üniversitemiz ihtiyaçlarını karşılayabilecek düzeyde geliştirilmiştir.
<b>Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar</b>	1) EBYS ile tüm yazışmalarımız güvenli ve hızlı bir ortama taşınmış olup arşiv sorunu ortadan kaldırılmıştır. 2) Sistem Odası aldığımız sunucular ile enerji tasarrufu sağlanmıştır. Veri kaybı en aza indirilip, güvenli yedekleme ve siber saldırılara karşı güvenilir bir platform oluşturulmuştur. 3) Üniversitemiz ile Microsoft arasında Lisans Sözleşmesi imzalanmıştır.
<b>Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı</b>	Üniversitemizdeki öğrenci ve personelin bilgiye erişimi kolaylaştırılmış ve veri güvenliği artırılmıştır.
<b>Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü</b>	Gelişen teknolojiye ayak uydurma kapsamında hizmet içi eğitim anlamında eksikliklerle karşılaşmış olup, tüm üniversite personelimize verilen eğitimler ile karşılaşılabilecek sorunlar büyük ölçüde ortadan kaldırılmıştır.
<b>Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler</b>	

#### PROJE TAMAMLAMA RAPORU (4)

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)		
	Yatırım Programına Alınış Değerleri	Revize Edilmiş Son Değerler
<b>Proje No</b>	2015H030280	
<b>Proje Adı</b>	Yayın Alımı (KOP)	
<b>Sektör/Altsektör</b>	Küt. Yayın Alımı	
<b>Proje Amacı</b>	Üniversite Kütüphanesinin basılı ve elektronik yayın sayısı açısından geliştirilmesi.	
<b>Proje Yeri</b>	Aksaray	
<b>Karakteristiği</b>		
<b>Fiziki Hedefi</b>	Kütüphane yayın sayısını arttırmak	
<b>Başlama-Bitiş Tarihi</b>	2015-2015	

Proje Sözleşmesi Tarihi			Sözleşme İhale Bedeli			
	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
<b>Proje Tutarı (Maliyeti)</b>						
<b>Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)</b>						
	<i>Cari Fiyatlarla</i>			<i>2015 Yılı Fiyatlarıyla</i>		
	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
<i>Programa Alındığı Yıl (.....)</i>						
.....						
.....						
.....						
2015/ 1) 2015/48480 İKN'li Baskılı Kaynak Alımı (1472 Kalem) Açık İhalesi 29.05.2015 tarihinde sözleşme imzalanmış ve Hak Edışı 2) İrşat Kitap Dağıtım LTD.Doğrudan Temin Yolu İle Basılı Kaynak Alımı (38 Kalem) 3) İstanbul Tıp Kitabevi Doğrudan Temin Yolu İle Basılı Kaynak Alımı (65 Kalem) 4) Palme Yayın Dağıtım Pazarlama Doğrudan Temin Yolu İle Basılı Kaynak Alımı (13 Kalem) 5) Eletronik Ortamda Veri Tabanı Aboneliği, (15 adet) 6) E.Kitap Alımı (42 adet)  <b>TOPLAM</b>					78           <b>500</b>	
<b>Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler</b>						
<b>Projenin Çıktısı/Sonucu (Ürünü)</b>	Proje Amacı dâhilinde bütçemize aktarılan 500.000 TL'lik ödeneğin tamamı basılı ve elektronik kaynak alımları için kullanılmış ve Kütüphanemizin koleksiyonu maddi imkanlar çerçevesinde geliştirilmiştir.					
<b>Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar</b>	(Gelir artışı, katma değer, istihdam artışı, bölgesel kalkınma, zaman tasarrufu, yoksulluğun azaltılması vs.)					

<b>Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı</b>	
<b>Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü</b>	<p><b>Yapılan İşler:</b> Üniversitemiz Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığının koleksiyonuna 2015 Aralık Ayı sonu itibariyle Açık İhale ve Doğrudan Temin Usullerine göre 1776 kalem basılı yayın alımı, 42 adet e-kitap alımı, 13 Adet Veritabanı ile 1 adet Tez Tarama Veritabanı (Elektronik Ortamda) ve 1 Adet Elektronik Dergi Aboneliği gerçekleştirilmiştir.</p> <p><b>Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Üniversitemiz Akademik Birimlerinden yıl içerisinde gelen yayın talepleri Doğrudan Temin sınırımızın büyükşehirler oranla alt seviyede olması nedeniyle (özellikle yabancı kaynak alımlarında) sağlamada güçlüklerle karşılaşmamıza neden olmaktadır.</li><li>• Bütçe imkânlarımızın kısıtlı olması nedeniyle kullanıcılarımızın talep etmiş oldukları araştırma kaynakları (elektronik ya da basılı) tamamıyla karşılanamamakta, temin aşamasında en çok kullanılan/en acil ihtiyaç şeklinde sınırlandırmalara gidilmektedir.</li><li>• Kütüphane binamız halen proje aşamasında olup, hizmet vermekte olduğumuz binamız hem kullanıcılarımıza hem de koleksiyonumuza yetersiz kalmaktadır.</li><li>• Doğrudan Temin sınırının büyükşehirler ile aynı seviyeye getirilmesinin Anadolu Üniversite Kütüphanelerine büyük kolaylık sağlayacağı düşünülmektedir.</li><li>• Proje aşamasında bulunan ve 2018 yılında bitmesi planlanan kütüphane binası yapımının hızlandırılması için gerekli çalışmaların yapılması hem Üniversitemize hem de kullanıcılarımıza büyük fayda sağlayacaktır.</li></ul>
<b>Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler</b>	<i>Bütçe imkanları, bina kapasitesi ve konusunda uzman personel sayısının artırılması halinde araştırmacı ve kullanıcılarımızın ihtiyaçlarına daha kaliteli hizmet verileceği düşünülmektedir.</i>

(\*) Kamulaştırma Hariç

## 3-SORUNLAR VE ÇÖZÜME YÖNELİK ÖNERİLER

### 3.1-Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar

Aksaray Üniversitesi 2006 Yılında kurulmuş bir devlet Üniversitesi'dir. Kurulduğu tarihten 2015 yılına kadar merkez kampüs yerleşkesinde 4. etap alt yapı çalışmaları, yeni açılmış fakülte hizmet binaları, kapasitesi yeterli olmayan fakülteler için yeni hizmet binaları yapılmıştır.

Yeni kurulan üniversitelerde gelişim ivmesi eski üniversitelere nazaran daha fazladır. Yeni kurulan üniversitelerde gelir kaynakları daha kısıtlıdır. Döner Sermaye gelirleri gelişmiş üniversitelere nazaran çok az olması planlanan yatırımların sadece bütçe imkanları ile gerçekleştirilmesini gerekli kılmaktadır.

2015 Yılı Bütçe Kanunu ile Üniversitemize tahsis edilen yatırım ödeneklerinin; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu gereğince mali plan ve programlar ile kurumsal plan ve programların öngördüğü çerçevede etkili, ekonomik ve verimli kullanılması ilke olarak benimsenmektedir. Ancak yatırım projeleri söz konusu olduğunda zamanın ve kaynağın etkili, ekonomik ve verimli kullanımı açısından uygulamada mevzuat kaynaklı sorunlarla karşılaşabilmektedir. Özellikle kamu ihale mevzuatında öngörülen ihale sürecinin uzunluğu, ihale sonrası ihalelere yapılan itirazların çözüme kavuşturulması, ihalelerin zamanında sonuçlanması ve yatırım projelerinin zamanında tamamlanması konusunda sorunlar yaşanabilmektedir. Bu sebeple ihale süreçlerine yönelik olarak mevzuatta yapılabilecek düzenlemeler ihalenin daha kısa sürede sonuçlanmasına olanak verecek şekilde düzenlenmesiyle yatırımların planlanan sürede hayata geçirilmesine yardımcı olacağı düşünülmektedir. Ayrıca kurumun ihtiyacını karşılayacak sayıda eğitimli teknik ve idari personel için kadro tahsisinin yapılması da üniversiteler açısından önem arz etmektedir.

### 3.2 Öneriler

- Fiziki yapısını tamamlayamamış olan veya yeni kurulan üniversitelerin, yatırım bütçe tekliflerindeki taleplerinin mümkün olduğunca karşılanması,
- Üniversitemizin ihtiyaçlarının karşılayacak sayıda eğitilmiş, teknik ve idari personel için kadro tahsisi yapılması,
- Personelin periyodik aralıklarla belirlenmiş programlar dahilinde hizmet içi eğitimlere tabi tutulması
- Kalkınma Bakanlığınca verilen ödeneklerin her yıl sadece belli oranda değil, kurumların öğrenci sayıları, binalarının ve çevrenin fiziki koşulları gözeticilerle ödenek dağıtımına gidilmesi,
- 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun'da yatırımlara yönelik yapılacak ihalelerde ihale sürelerinin, itiraz sürelerinin vs kısaltılmasına yönelik çalışmaların yapılmasının daha etkin hizmet getireceği düşünülmektedir.

## 2015 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZET TABLOSU (\*)

Kurum Adı: AKSARAY ÜNİVERSİTESİ

Bütçe Türü: ÖZEL BÜTÇE

2015 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı		2014 Sonu Kümülatif Harcama			2015 Yılı Program Ödenek			2015 Yılı Revize Ödenek			2015 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme		
		Dış	Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam
				Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak	
Turizm															
Konut															
Eğitim	6					18.348			169.600			21.725		32.801	
Sağlık															
D.Kamu Hizm.															
-İktisadi															
-Sosyal															
<b>TOPLAM</b>	<b>6</b>					<b>18.348</b>			<b>169.600</b>			<b>21.725</b>		<b>32.801</b>	

**YILI HARCAMALARI DÖNEM  
GERÇEKLEŞME RAPORU (BİN TL.)**

Sektör Adı :

**Eğitim****2015 1.Dönem Sonu Yıl İçi Kümülatif Nakdi**

Bim No (1)	YSK (2)	Proje No (3)	Proje Adı (4)	Bütçe Türü (5)	Bitiş Yılı (6)	Yeri (7)	Proje Tut. Dış (8)	Proje Tut. Toplam(9)	2014 Kümülatif Harcama (10)	Ödenek Dış Kredi (11)	Ödenek Dış Özkaynak(12)	Ödenek Toplam (13)	+ / - (14)	Aktarma Mik.(15)	Harcama Dış Kredi (16)	Harcama Dış Özkaynak (17)	Harcama Toplam (18)
201525	449,	1994H032360	Kampüs Altyapısı (KOP)	ÖZEL BÜTÇE	2016	Aksaray	0,	65.000,	61.144,	0,	0,	3.000,	2.100				4.187
208675	449,	2008H030630	Derslik ve Merkezi Birimler (KOP)	ÖZEL BÜTÇE	2017	Aksaray	0,	92.000,	62.059,	0,	0,	15.400,	16.500				23.583
212167	449,	2008H050070	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri (KOP)	ÖZEL BÜTÇE	2016	Aksaray	0,	8.500,	5.164,	0,	0,	2.500,	1.625				3.476
202244	449,	2015H030260	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi (KOP)	ÖZEL BÜTÇE	2015	Aksaray	0,	100,	0,	0,	0,	100,	0				0
202247	449,	2015H030270	Muhtelif İşler (KOP)	ÖZEL BÜTÇE	2015	Aksaray	0,	3.500,	0,	0,	0,	3.500,	2.700/- (1.200)				1.298
202250	449,	2015H030280	Yayın Alımı (KOP)	ÖZEL BÜTÇE	2015	Aksaray	0,	500,	0,	0,	0,	500,	0				257
<b>TOPLAM</b>								<b>0, 169.600,</b>	<b>128.367,</b>	<b>0,</b>	<b>0,</b>	<b>25.000,</b>					

