



**T.C.
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ**

**2016 YILI
YATIRIM PROGRAMI İZLEME
VE
DEĞERLENDİRME RAPORU**

**Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Aksaray Üniversitesi Kampüsü
Tel : 0 388 288 21 10
Fax: 0 388 288 21 16**

İÇİNDEKİLER	Sayfa No
TABLolar DİZİNİ	3
SUNUŞ	4
1-GENEL DEĞERLENDİRME	4
1.1 Misyön ve Vizyon	5
1.2 Temel Amaç ve Hedefler	6
1.3 Yatırımlarının Finansman Kaynakları	8
1.3.1 Sermaye Bütçesi	8
1.4 Mevcut Hizmet Kapasitesi	10
1.4.1 Fiziksel Yapı	10
1.4.2 İnsan Kaynakları	16
1.4.2.1 Akademik Personel	17
1.4.2.2 Yabancı Uruklu Akademik Personel	17
1.4.2.3 İdari Personel	18
1.4.2.4 Kısmi Zamanlı Çalıştırılan Öğrenci	19
1.4.2.5 Hizmet alımı Kapsamında Çalıştırılan Personel	19
1.5 2016 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı	20
2- 2016 YILI PROJE UYGULAMALARI	23
2.1 Biten Projeler	24
2.1.1 İ.İ.B.F. T, L, M ve N Bloklar Yapım İşi	24
2.1.2 İslami İlimler Fakültesi İkmal İnşaatı İşi	25
2.1.3 Rektörlük Binası Yapım İşi	26
2.1.4 Kampus Altyapı 4. Etap Yapım İşi	27
2.2. Devam Eden Projeler	28
2.2.1 Derslik ve Merkezi Birimler (KOP)	28
2.2.2 Kampus Altyapısı (KOP)	29
2.2.3 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri (KOP)	30
2.3 Diğer Projeler (Muhtelif İşler)	31
2.4 Yayın Alımları	33
2.5 Proje Tamamlama Raporu	34
2016H031270 Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi (KOP)	34
2016H031280 Muhtelif İşler (KOP)	36
2016H031290 Yayın Alımı (KOP)	41
3-SORUNLAR VE ÇÖZÜME YÖNELİK ÖNERİLER	43
3.1 Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar	43
3.2 Öneriler	44
4- KAMU YATIRIM TABLOLAR	45
2016 Yılı Kamu Yatırımları Özet Tablosu (Ek 3)	45
2016 Yılı Yatırım Gerçekleşme Raporu	46

TABLolar DİZİNİ

Tablo 1. Yatırım Bütçesinin Birimler Bazında Ödenek Dağılımı	9
Tablo 2. Kapalı Alanların Yerleşkelere Göre Dağılımı	10
Tablo 3. Aksaray Üniversitesi Yerleşkelerinin Dağılımı.....	11
Tablo 4. Sosyal Tesislere İlişkin Kapalı Alanlar	13
Tablo 5. Spor Tesislerine İlişkin Kapalı Alanlar	13
Tablo 6. Eğitim ve Sosyal Alanlara İlişkin Kapalı Alanların Dağılımı	14
Tablo 7. Akademik Personelin Unvan Bazında Dağılımı.....	17
Tablo 8. Yabancı Uyruklu Akademik Personel Tablosu	18
Tablo 9. İdari Personelin Hizmet Sınıflarına Göre Dağılımı	18
Tablo 10. Kısmi zamanlı Çalıştırılan Personel	19
Tablo 11. Hizmet Alımı Kapsamında Çalıştırılan Personel.....	19
Tablo 12. Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığının Hedef ve Gerçekleşmeler Tablosu.....	20
Tablo 13. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığının Hedef ve Gerçekleşmeler Tablosu.....	21
Tablo 14. Bilgi İşlem Daire Başkanlığının Hedef ve Gerçekleşmeler Tablosu.....	22
Tablo 15. Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Hedef ve Gerçekleşmeler Tablosu	22
Tablo 16. 2016 Yılında Devam Eden Projeler	23
Tablo 17. 2016 Yılında Tamamlanan Projeler	23
Tablo 18. Derslik ve Merkezi Birimler Projesi.....	28
Tablo 19. Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Proje Tablosu	30
Tablo 20. Muhtelif İşler (KOP) Tablosu.....	32
Tablo 21. 2016H031290 Proje Numaralı Yayın Alımları Tablosu.....	33

SUNUŞ

Kamu idarelerinin şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim tarzına kavuşturulması amacıyla 5018 sayılı “Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu” çıkarılarak yürürlüğe girmiştir. Bu kanunun öngördüğü sistemin gerçekleştirilebilmesi için, bütçe ve ödenek tahsis edilen harcama birimlerinin her yıl çeşitli raporlar hazırlaması ve bu raporlarla idarelerin yaptıkları harcamaların ve verimliliğin kontrol edilmesi şeklinde bir yol izlenmektedir.




Bu kapsamda Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporunda idarenin kullandığı kaynaklar ile yıl içerisinde gerçekleştirmek istediği hedeflerine ulaşma düzeyinin gösterilmesi büyük önem arz etmektedir.

Üniversitemizin, stratejik plan ile belirlemiş olduğu hedeflere ulaşmak ve bu hedeflere ulaşabilmek için gerekli yatırımların yapılması, bu yatırımlar yapılırken tahsis edilen kaynakların etkin, ekonomik ve verimli kullanılması önceliklerimiz arasında yer almaktadır.

5018 Sayılı Kanunu'nun 25'inci maddesi gereğince hazırlanması gereken, Üniversitemizin 2016 yılı yatırım projeleri ile ilgili uygulama sonuçlarının, program ve revize ödeneklerin, harcamaların, nakdi ve fiziki gerçekleşme oranlarının, uygulamada karşılaşılan sorunların ve bu sorunların çözümüne yönelik önerilerimizin de yer aldığı “*2016 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu*” hazırlanarak kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

Saygı ile arz olunur.



Prof. Dr. Yusuf ŞAHİN

Rektör

1-GENEL DEĞERLENDİRME

Bakanlar Kurulu tarafından, 2006 yılı içinde kurulması kabul edilen bir devlet üniversitesidir.

17 Mart 2006 tarihli 26111 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 5467 sayılı kanunla Niğde Üniversitesi' ne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek, fakülte ve yüksekokullar kendi bünyesinde oluşturulan Aksaray Üniversitesi Rektörlüğe bağlanmıştır. Rektör Prof. Dr. Yusuf ŞAHİN'dir.

Aksaray Üniversitesi'nde 11 Fakülte, 3 Yüksekokul, 7 Meslek Yüksekokulunda ön lisans ve lisans düzeyinde eğitim yapılmaktadır.

Lisansüstü eğitim Fen, Sosyal ve Sağlık Bilimleri Enstitüleri tarafından verilmektedir.

1.1-Misyonumuz ve Vizyonumuz

Tüm paydaşların ihtiyaçlarına odaklanarak, bilgi ve teknolojiyi kullanabilen, rekabetçi girişimci, yenilikçi atılımlarla bölge ve ülkenin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimine katkı sağlayabilecek nitelikte insan gücü yetiştirmektir.

Üniversite-sanayi-toplum işbirliği temelinde evrensel düzeyde faydalı bilgi ve yenilik üreterek, bilim ve teknolojinin gelişimine ortak olan bir üniversite olmaktır.

1.2-Temel Amaç ve Hedefler

Stratejik Amaç 1-Ulusal ve Uluslar arası Alanda Eğitimde Rekabet Etmek

- **Hedef 1:** Yürütülmekte olan programların niteliklerinin ulusal ve uluslararası normlara ve beklentilere göre güncellenmesi,
- **Hedef 2:** Toplumsal beklenti, sektörel ve bölgesel eğitimler ile ülke hedefleri çerçevesinde yeni programların oluşturulması, geliştirilmesi ve iyileştirilmesi;
- **Hedef 3:** Ulusal ve uluslararası öğrenci ve öğretim elemanı hareketliliği sağlayan programların ve programa dahil olacak öğrenci ve öğretim elemanı sayılarının artırılması;
- **Hedef 4 :** Öğrencilerde girişimcilik bilincinin geliştirilmesi ve bu yöndeki uygulamaların sürdürülmesi;
- **Hedef 5 :** Öğrencilere yönelik beslenme, sağlık, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif hizmetlerin etkin ve verimli bir şekilde sunulması ve bu alanlardaki olanakların artırılması.

Stratejik Amaç 2- Kurumun Fiziki Alt yapısını Oluşturmak, Geliştirmek ve İyileştirmek

- **Hedef 1 :** Eğitim öğretim alt yapısının oluşturulması, geliştirilmesi ve iyileştirilmesi;
- **Hedef 2 :** Akademik ve idari hizmet birimlerinin her türlü mal ve malzeme hizmet alımının temini ve yeni binaların tefrişi;
- **Hedef 3 :** Sosyal ve spor alanlarının oluşturulması, geliştirilmesi ve iyileştirilmesi;
- **Hedef 4 :** İdari hizmet alanlarının alt yapısının oluşturulması, geliştirilmesi ve iyileştirilmesi;

Stratejik Amaç 3- Ulusal ve Uluslararası Araştırma Olanaklarını Arttırmak ve Ar-Ge Çalışmalarını Teşvik Etmek

- **Hedef 1:** Araştırma olanaklarını arttırmak için insan kaynağının geliştirilmesi,
- **Hedef 2 :** Araştırma olanaklarının artırılması için maddi kaynak yaratılması ve basın- yayın olanaklarının geliştirilmesi;
- **Hedef 3 :** Ulusal ve uluslararası proje ve yayın sayısının artırılması;
- **Hedef 4 :** Yeni ürün ve fikirlerin ticarileştirilmesi teşvik edilerek, patent gibi çıktıların artırılması.

Stratejik Amaç 4- Kurumsal Yapının Sürdürülebilirliğini ve Gelişimini Sağlamak

- **Hedef 1:** Ulusal ve uluslararası iletişim ve işbirliği ağlarının artırılması,
- **Hedef 2 :** Üniversitenin tanıtımı için ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtım çalışmalarının ve etkinliklerinin artırılması;
- **Hedef 3 :** Yönetim sistemlerinin geliştirilmesi;
- **Hedef 4 :** Akademik ve idari personelin gelişiminde sürekliliğin sağlanması;
- **Hedef 5 :** Beşeri kaynakların niceliğinin artırılması .

Stratejik Amaç 5- Paydaşlarla Etkileşim Kalitesini Arttırmak

- **Hedef 1 :** Paydaşlarla iletişim ve işbirliğinin geliştirilmesi;
- **Hedef 2 :** Mevcut kapasite ile eğitim- araştırma sonuçlarından elde edilen birikimin topluma yönelik ürün ve hizmetlere dönüştürülmesi

1.3-Yatırımların Finansman Kaynakları

Üniversitemiz 5018 Sayılı Kanuna ekli (II) Sayılı Özel Bütçeli İdareler Cetvelinin (A) Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler ve İleri Teknoloji Enstitüleri içerisinde sayılmış olup, ‘Özel Bütçeli’ bir Yükseköğretim Kurumudur.

Özel Bütçe Gelirleri

- a) Hazine yardımı
- b) Öz gelirler

(Örgün öğretim, II. Öğretim, Doktora, Yüksek Lisans, Tezsiz Yüksek Lisans ve Yaz Okulu harç gelirleri, Döner Sermaye gelirlerinden aktarılan Bilimsel Araştırma Proje Payları, Lojman Kira Gelirleri ile Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri).

1.3.1- Sermaye Bütçesi

	(1.000) TL
• Eğitim Sektörü:	24.250
Etüt Proje	100
Kampus Altyapı	1.500
Derslik ve Merkezi Birimleri	17.000
Muhtelif İşler	5.000
Yayın Alımları	650
• Spor Sektörü	1.000
Açık ve Kapalı Spor Tesisleri (KOP)	1.000
• TOPLAM	25.250

Tablo 1. Yatırım Bütçesinin Birimler Bazında Ödenek Dağılımı

(1000) TL

BİRİM ADI	KBÖ	YILSONU TOPLAM ÖDENEK	HARCAMA	HARCAMA ORANI %
İdari Mali İşler Daire Başkanlığı (06.1)	2.975	4.875	4.285	88
Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı (06.5)	19.600	20.750	15.633	75
Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı (06.7)	1.000	1.585	1.099	69
Kütüphane Daire Başkanlığı (06.1)	650	650	650	100
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı (06.1)	525	1.375	1.351	98
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı (06.3)	500	100	90	90
TOPLAM	25.250	29.335	23.110	79

1.4-Mevcut Hizmet Kapasitesi

Aksaray Üniversitesi'nin İl merkezi ve ilçelerde toplam 8 yerleşkesi bulunmakta olup, yerleşkelerin toplam açık alanı 3.965.531 m² ve toplam kapalı alanı 216.115 m²'dir. Yerleşkelerin açık ve kapalı alanlarının dağılımı Tablo 2'de gösterilmektedir.

Tablo 2. Kapalı Alanların Yerleşkelere Göre Dağılımı

YERLEŞKELER	Açık alan (m ²)	Kapalı alan (m ²)
Aksaray Merkez Yerleşkesi	3.819.713	179.329
Hacılar harmanı Mahallesi Yerleşkesi	60.817	10.664
Tacin Mahallesi Yerleşkesi	9.823	4.668
Zafer Mahallesi	10.242	5.064
Şereflikoçhisar	31.834	9.760
Ortaköy	30.000	5.400
Güzelyurt	1.830	1.230
Eskil	1.132	1.132
TOPLAM	3.965.391	216.115

1.4.1-Fiziksel Yapı

Merkez yerleşkesinde Mühendislik Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi kendi hizmet binalarında eğitime devam etmektedir. İslami İlimler Fakültesi 2016 yılı içerisinde yeni hizmet binasına geçmiştir. 2016 yılı içerisinde Isı Merkezinde eğitime devam eden Veteriner Fakültesi, hizmet binasının tamamlanmasını müteakip yeni binaya geçecektir.

2016 yılında yeni rektörlük binası tamamlanarak idari birimler Rektörlük binasında faaliyetleri sürdürmeye başlamıştır.

Yabancı Diller Yüksekokulu merkezi dersliklerde, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Fen ve Sosyal Bilimler Enstitüleri BESYO hizmet binasında hizmet vermektedir.

Zafer Mahallesi'nde, Sağlık Yüksekokulu ile Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bulunmakta olup, eğitime bu yerleşkede devam etmektedir.

Tacın Mahallesi'nde, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bulunmaktadır.

4 ilçede Üniversiteye ait yerleşke bulunmaktadır. Şereflikoçhisar'da Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu ile Şereflikoçhisar Berat Cömertoğlu Meslek Yüksekokulu yer almaktadır.

Üniversitemizin yerleşkelerinin birimler bazında dağılımı aşağıdaki Tablo 3'de gösterilmektedir.

Tablo 3. Aksaray Üniversitesi Yerleşkelerinin Dağılımı

Aksaray Merkez Yerleşkesi	İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Rektörlük - Genel Sekreterlik	Fen Edebiyat Fakültesi
Strateji Geliştirme Daire Bşk.	Eğitim Fakültesi
Personel Daire Bşk.	Mühendislik Fakültesi
Sağlık Kültür ve Spor Daire Bşk.	Bilimsel Araştırma Projeleri Ofisi
Hukuk Müşavirliği	Dış İlişkiler Birimi
İdari ve Mali İşler Daire Bşk.	Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Öğrenci İşleri Daire Bşk	Fen Bilimleri Enstitüsü
Yapı İşleri ve Teknik Daire Bşk.	Sosyal Bilimler Enstitüsü
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Bşk.	Turizm Fakültesi
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	Merkez Kütüphane
Sürekli Eğitim Merkezi	Yabancı Diller Yüksekokulu

Taş pazar Mahallesi Yerleşkesi	İlçe Yerleşkeleri
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu	Ortaköy Meslek Yüksekokulu
Tacin Mahallesi Yerleşkesi	Şereflikoçhisar Berat Cömertoğlu Meslek Yüksekokulu, Şereflikoçhisar Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu	
Zafer Mahallesi	Güzelyurt Meslek Yüksekokulu
Sağlık Yüksekokulu	Eskil Meslek Yüksekokulu
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu	(Sultan hanı 670 m ² 'lik bina tahsis edilmiştir.

Sosyal Tesisleri




Tablo 4. Sosyal Tesislere İlişkin Kapalı Alanlar

SOSYAL TESİSLER	Sayı	Açık Alan m ²	Kap. Alan m ²	Top. Alan m ²
ASÜ Sosyal Tesisler	1	-	6.000	6.000
Kafeterya	1	-	425	425
Kantin	19		13.647	13.647
Personel Yemekhanesi			4.800 m ²	
Öğrenci Yemekhanesi				

Spor Tesisleri

Tablo 5. Spor Tesislerine İlişkin Kapalı Alanlar

SPOR TESİSLERİ	ADEDİ
Mini Futbol Sahası	1
Basketbol Sahası	6
Voleybol Sahası	7
Tenis Kortu	2
Kapalı Spor Salonu	1
Kapalı Yüzme Havuzu	1
TOPLAM	18

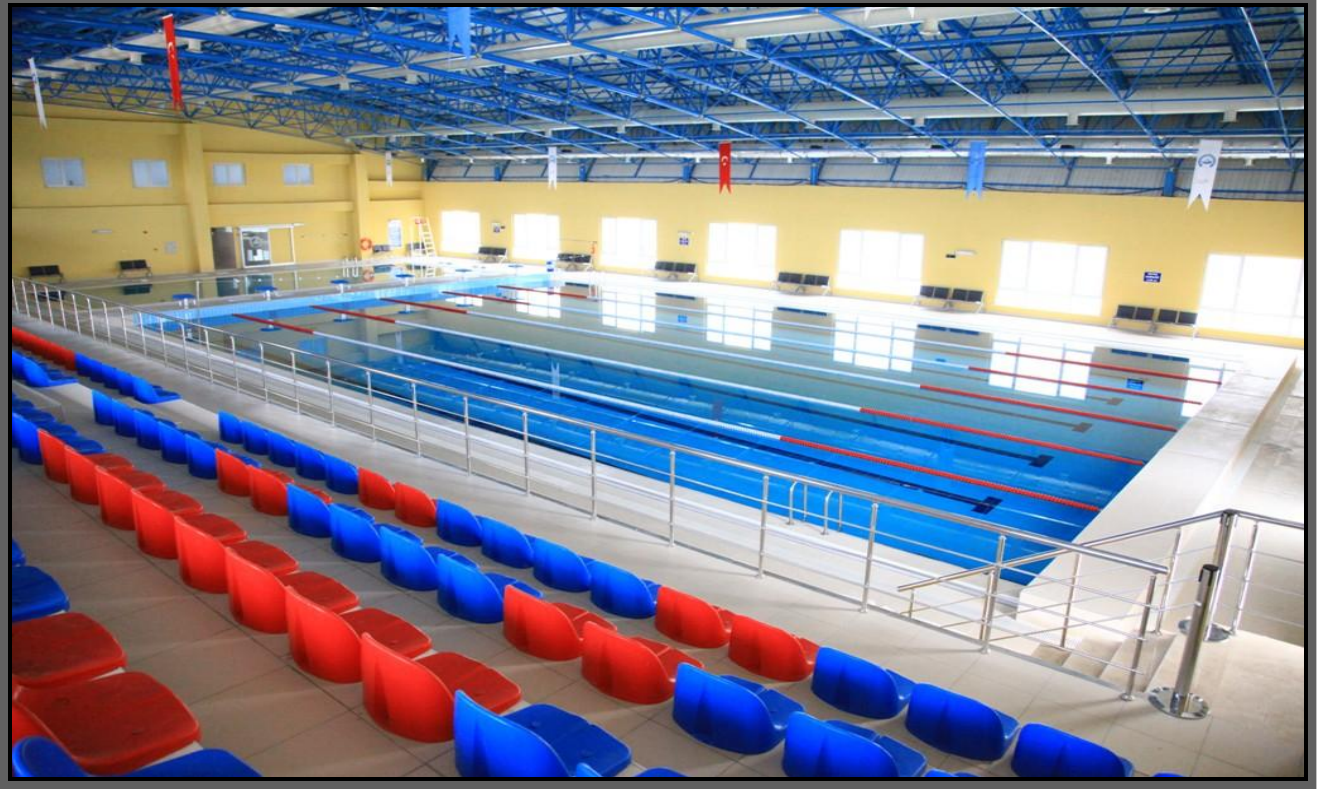

Tablo 6. Eğitim ve Sosyal Alanlara İlişkin Kapalı Alanların Dağılımı

2016 YILI MEVCUT KAPALI ALANLAR										
FAKÜLTE, YO, MYO,	MEVCUT FİZİKİ ALANLAR M2									
ENSTİTÜLER,	EĞİTİM ALANLARI		SOSYAL ALANLAR				SPOR ALANLARI			
LABORATUAR,	Derslik	LaB.	Kan	Loj.	misafirhane		Sirkülasyon Alanı	Açık Spor Tesisleri	Kapalı Spor Tesisleri	
SOSYAL TESİS,										
Fen-Edebiyat	1775	300	150	0		0	2555	0	0	
İktisadi İdari Bilimler	4806	314	220	0		0	6360	0	0	
Eğitim Fakültesi C Blok	799	150	0	0		0	2019	0	0	
Eğitim Fakültesi A-B Blok	3000	432	184	0		0	8008	3980	0	
Sağlık Bilimleri Fakültesi	1925	1200	433	0		0	4080	800	0	
Yeni Mühendislik	4595	3793	222	0		0	14015	0	0	
İslami İlimler Fak.	1968	229	441	0	0	0	3861	0	0	
Rektörlük	0	0	87	0	0	0	7913	0	0	
Veterinerlik Fak.	797	1941	157	0	0	0	2692	0	0	
YÜKSEK OKULLAR										
BESYO	900	400	550	0	1100	0	4150	0	2500	

MESLEK YÜKSEK OKULLARI									
Teknik Bil.MYO (Merkez)	1217	4971	477	0		0	2100	0	0
Teknik Bil.MYO (Sultanhanı)	70	135	0	0	0	0	410	0	0
Sağlık Hizmetleri MYO	852	425	536	0		0	2592	0	0
Ortaköy MYO	1300	600	151	0		0	2477	0	0
Şereflikoçhisar B.C. MYO	1150	150	200	0		0	3135	0	54
Ş. Uygu. Tek. Ve İşlet. Yüksekokulu	1273	0	294	0		0	1803	0	0
Güzelyurt MYO	355	50	125	0		0	392	0	0
Sosyal Bil.MYO	519	0	160	0		0	3087	0	0
Eskil MYO.	225	90	0	0	0	0	520	0	0
SPOR TESİSİ									
ASÜ Spor Salonu	2980	0	2	0		0	300	0	0
Atletizm Pisti	0	0	0	0		0	0	18180	0
Tribün	972	0	0	0	0	0	1973	0	0
SOSYAL TESİSLER									
ASÜ Yemekhane	0	0	4800	0		0	600	0	0
Mediko Sosyal	0	0	0	0		0	100	0	0
ASÜ Kütüphane	260	318	0	0		0	950	0	0
Merkezi Laboratuar	0	3145	0	0		0	1910	0	0
Çarşı Binası	0	0	2700	0		0	1200	0	0
Merkezi Derslik ve Anfi	5800	0	200	0		0	4100	0	0
Kapalı Yüzme Havuzu	0	0	100	0		0	400	0	1200
Ş. Uygulama Oteli	0	0	1440	0		0	0	0	0
TOPLAM	37.538	18.643	13.647	0	1.100	0	83.702	22.960	3.754

1.4.2 -İnsan Kaynakları

Hızla gelişen ve bilgi toplumu haline gelen çağımızda ilerleyen bilim ve teknolojinin gerisinde kalmamak, gelişmiş ülkelerle her alanda rekabet edebilmek, yükseköğretimin ana amaç ve hedeflerine uygun, araştırmacı ve girişimci yapıya sahip bilgili, yetenekli ve üretken bireylerin yetiştirilebilmesi amacıyla insan kaynakları yönetimi de kurumun başarısını etkileyen en önemli faktörlerden biridir. Bu nedenle geleneksel yönetim anlayışından vazgeçilip yeni çalışma stratejilerine uygun politikalar benimsemek gerekmektedir. İnsan kaynaklarını en doğru ve en verimli şekilde organize edilmesi kurumun başarısını etkileyen başlıca faktörlerden biridir. Çalışanların bilgi, beceri ve yeteneklerine uygun alanlarda istihdam edilip, bu alanlarda yükselmelerine olanak sağlamak ana hedeflerimizdendir.

Üniversitemiz, çalışanların hareket alanlarını kısıtlamayan, insan kaynaklarında sürekli gelişime ve değişime açık bir yönetim anlayışını benimsemiştir. Çalışanların bilgi ve beceri düzeylerini artırmak için eğitim ve seminerler planlanmakta ve düzenlenmektedir. Yine çalışma ortamı, işte ilerleme/yükselme imkanı, yetki ve sorumluluk sahibi olma, yenilik ve yaratıcılık ihtiyacı, iş emniyeti, arkadaşlık ve dostluk ilişkileri, ücret, yöneticilerle olan iletişim gibi unsurların kişilerin kurumlarında önemsedikleri ve görmek istedikleri değerler olduğunun bilinciyle üniversitemiz çalışanlarının motivasyonunu artırma yönünde gerekli çalışmalar sürdürülmeye devam etmektedir.

Bu kapsamda, Aksaray Üniversitesi'nin sahip olduğu insan kaynakları, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ile ataması ve alımı yapılan akademik personel, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile ataması yapılan idari personel, 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri gereğince görev yapan yabancı uyruklu öğretim elemanları ile kısmi zamanlı öğrenciler ve 4734 sayılı İhale Kanunu kapsamında hizmet alımı şeklinde istihdam edilen personeli kapsamaktadır.

1.4.2.1 -Akademik Personel

Üniversitemizde, 2914 sayılı Kanun kapsamında istihdam edilen akademik personel sayısı 725'tir. Bu sayının 351'i öğretim üyesi, 374'ü diğer öğretim elemanıdır. Akademik personelin unvan bazında kadro dağılımı Tablo 7'de gösterilmektedir.

Tablo 7. Akademik Personelin Unvan Bazında Dağılımı

Akademik Personel	Dolu	Tam Zamanlı
Profesör	36	Evet
Doçent	77	Evet
Yrd. Doçent	241	Evet
Öğretim Görevlisi	139	Evet
Okutman	16	Evet
Araştırma Görevlisi	183	Evet
Uzman	23	Evet
Toplam	725	Evet

1.4.2.2 -Yabancı Uyruklu Akademik Personel

Üniversitemiz bünyesinde 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri gereğince görev yapan yabancı uyruklu öğretim elemanlarının sayısı 9 olup, geldiği ülke ve görev yaptığı birimler Tablo 8'de gösterilmektedir.

Tablo 8. Yabancı Uyruklu Akademik Personel Tablosu

Yabancı Uyruklu Akademik Personel	Geldiği Ülke	Çalıştığı Bölüm
Profesör	Hindistan	Mühendislik Fakültesi
Yrd. Doçent	İran	Fen Edebiyat Fakültesi
Yrd. Doçent	Azerbaycan	İktisadi ve İdari Bil. Fakül.
Yrd. Doçent	Nijerya	İktisadi ve İdari Bil. Fakül.
Yrd. Doçent	Irak	İslami İlimler Fakültesi
Yrd. Doçent	Afganistan	İslami İlimler Fakültesi
Yrd. Doçent	Suriye	İslami İlimler Fakültesi
Öğretim Görevlisi	Pakistan	Teknik Bilimler MYO
Öğretim Görevlisi	Irak	Teknik Bilimler MYO

1.4.2.3 -İdari Personel

Üniversitemizde, 657 sayılı Kanun gereğince istihdam edilen idari personel sayısı 307'dir. Görev yapan idari personellerin hizmet sınıflarına göre dolu-boş kadro dağılımları Tablo 9'da gösterilmektedir.

Tablo 9. İdari Personelin Hizmet Sınıflarına Göre Dağılımı

İdari Personel (Kadroların Doluluk Oranına Göre)	Dolu	Boş	Toplam
Genel İdari Hizmetler	227	164	391
Sağlık Hizmetleri Sınıfı	7	9	16
Teknik Hizmetler Sınıfı	46	38	84
Avukatlık Hizmetleri Sınıfı	2	1	3
Yardımcı Hizmetler Sınıfı	25	19	44
Toplam	307	231	538

1.4.2.4 - Kısmi Zamanlı Çalıştırılan Öğrenci

Üniversitemizde bünyesinde kısmi zamanlı olarak çalıştırılan öğrenci sayısı Tablo 10’da gösterilmektedir.

Tablo 10. Kısmi zamanlı Çalıştırılan Personel

Kısmi Öğrenci Sayısı	65
-----------------------------	-----------

1.4.2.5 - Hizmet Alımı Kapsamında Çalıştırılan Personel

Üniversitemizde 4734 sayılı İhale Kanunu kapsamında 185 personel çalıştırılmakta olup, çalıştırılan personelin hizmet türlerine göre dağılımı Tablo 11’de gösterilmektedir.

Tablo 11. Hizmet Alımı Kapsamında Çalıştırılan Personel

Güvenlik Görevlisi	72
Temzilik Görevlisi	113
TOPLAM	185

1.5-2016 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı

Üniversitemiz 2015-2019 yıllarını kapsayan 2. stratejik planını uygulamaktadır. Stratejik planda yer alan hedeflerimizin içerisinde büyük bir payı yatırımlar almaktadır. Yeni kurulmuş, gelişmekte olan bir üniversite olmamız münasebetiyle fiziki altyapıya önem verilmektedir. Sermaye bütçesi hazırlanırken yeni hizmet binalarının yapılması, bu binaların büro tefrişatının eğitime uygun olarak yapılması hedeflenmiştir. Stratejik planımızın 2016 yılı için yatırımlara yönelik öngördüğü hedefler ile 2016 yılı yatırım bütçesi ile gerçekleştirilebilen hizmetlere ilişkin veriler düzenlenerek, aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 12. Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığının Hedef ve Gerçekleşmeler Tablosu

Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı	
2016 Hedeflenen	2016 Gerçekleşen
1. 2016 yılsonu itibariyle Kütüphane binasının yapımına başlanması planlanmaktadır.	1. Kütüphane Binası'na ait proje, yaklaşık maliyet ve teknik şartnamelerin hazırlanması işi tamamlanarak yılsonu itibariyle binanın yapımına başlanılmıştır.
2. Teknik Bilimler MYO'nun Atölye binasının yılsonu itibariyle tamamlanarak hizmete açılması.	2. Yıl içerisinde projeye dahil edilmediğinde yapımına başlanılamamıştır.
3. Ortaköy MYO'nun Atölye binasının yılsonu itibariyle tamamlanarak hizmete açılması.	3.2013 yılında yapımına başlanan Eğitim Fakültesi 1. Etap Yapım İş'i tamamlanmış ve geçici kabul işlemleri yapılmıştır.
4. Rektörlük Binası Yapım İş'i'nin nakdi ve fiziki olarak %100'nün gerçekleştirilmesi.	4. Rektörlük Binası'nda nakdi ve fiziki olarak %100 seviyesine ulaşılmıştır.
5. İslami İlimler Fakültesi İkmal İnşaatı İş'i'nin ihale işlemlerinin tamamlanarak %100 seviyesine getirilmesi.	5.2015 yılında ihale işlemleri tamamlanarak yapımına başlanan İslami İlimler Fakültesi İkmal İş'i kaba inşaatı tamamlanmış, ince imalatlara devam edilmekle birlikte nakdi ve fiziki olarak %100 seviyesine ulaşılmıştır.
6. İİBF T, L, M, N Blok Yapım İş'i'nin ihale işlemlerinin tamamlanması ve %100	6. İİBF T, L, M, N Blok Yapım İş'i'nin Nakdi ve fiziki gerçekleşmesinde %100 seviyesine

seviyesine getirilmesi.	ulaşmıştır.
7. Devam Eden Kampüs Altyapı 4. Etap yapım işi'nin %100 seviyesine getirilerek tamamlanması.	7. Kampüs Altyapı 4. Etap Yapım İşini tamamlanmış, nakdi ve fiziki olarak % 100,00 seviyesine ulaşmıştır.
8. Kapalı alanlarda engellilerle ilgili asansör, rampa, engelli WC ler, hissedilebilir yüzeyler yapılması	8. Üniversitemiz binalarının eksik olan engelli asansörleri, engelliler için hissedilebilir yüzeyler, engelli rampaları ve bu işlere bağlı muhtelif tadilatlar, Fen Edebiyat Fakültesi ve Ortaköy MYO engelli asansörleri büyük onarım kapsamında tamamlanmıştır.

Tablo 13. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığının Hedef ve Gerçekleşmeler Tablosu

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	
2016 Hedeflenen	2016 Gerçekleşen
1.2016 yılında fiilen faaliyet gösteren birimler 2015 yılında tamamlanmayan alımlar ile 2016 yılında tamamlanması öngörülen Rektörlük hizmet binası, İslami İlimler Fakültesi, Veterinerlik Fakültesi ile İ.İ.B.B.F.T. Blok binasının Büro/Okul mefruşatı, Makine Teçhizat, bilgisayar teknoloji, yazılım ve taşıt alınmasını sağlayacak şekilde gerçekleştirilerek, üniversitemizin gelişme sürecine paralel olarak doğacak ihtiyaçlarını 2016 yılı sonuna kadar % 65'ini tamamlamayı hedeflemek.	1.Üniversitemizin 2015-2016 yıllarında devam eden ve yeni tamamlanacak yatırım projelerinin yıllar itibariyle gerçekleşme hedefleri göz önüne alınarak, yeni birimlerin (Veterinerlik Fakültesi hariç) Büro/Okul mefruşatı, Makine – Teçhizat Bilgisayar teknolojileri ve yazılım alımlarının marjinal faydayı sağlayacak şekilde gerçekleştirilerek, üniversitemizin gelişme sürecine paralel olarak doğacak ihtiyaçları büyük oranda tamamlanmıştır.
2. 2016 yılında devam eden ve yeni tamamlanacak yatırım projelerinin yıllar itibari ile gerçekleşme hedefleri göz önüne alınarak Güvenlik Görevlisi, Temizlik Hizmeti, Araç kiralama hizmeti, Akaryakıt, Elektrik, Doğalgaz, Su ve aşıt bakım Onarım Hizmetleri ile her türlü Cari harcamaların (Temizlik Malzemeleri, her türlü kırtasiye, diğer tüketime yönelik mal ve malzemeler) Üniversitenin gelişim hedefleri ile orantılı olarak göstereceği artış oranlarında alımların yapılmasının %65'ini bitirmeyi planlamak.	2. 2016 yılında devam eden ve yeni tamamlanacak yatırım projelerinin yıllar itibari ile gerçekleşme hedefleri göz önüne alınarak Güvenlik Görevlisi, Temizlik Hizmeti, Araç kiralama hizmeti, Akaryakıt, Elektrik, Doğalgaz, Su ve aşıt bakım Onarım Hizmetleri ile her türlü Cari harcamaların (Temizlik Malzemeleri, her türlü kırtasiye, diğer tüketime yönelik mal ve malzemeler) Üniversitenin gelişim hedefleri ile orantılı olarak göstereceği artış oranlarında alımların % 95'i tamamlanmış bulunmaktadır.

Tablo 14. Bilgi İşlem Daire Başkanlığının Hedef ve Gerçekleşmeler Tablosu

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	
2016 Hedeflenen	2016 Gerçekleşen
2015-2019 yılları arası Planlanan Stratejik Planda Sermaye giderlerinde (yatırım) ön görülen bir hedef olmamasına karşın, gelişen teknolojiye ayak uydurmak ve karşılaştığımız fiziki ve altyapı sorunlarını gidermek amacıyla Muhtelif işlerden ödenek aktarımı talep edilmiştir. 06.3(GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI) ve 06.01 (MAMUL MAL ALIMLARI) tertiplerine toplam 1200.000,00 TL ödenek aktarımı yapılmış olup yanda açıklamaları verilen projeler gerçekleştirilmiştir.	1) EBYS üniversitemizdeki evrak işlerini kolaylaştırması ve güçlü bir arşivleme sağlaması amacıyla hayata geçirilmiştir. 2) Üniversitemiz genelinde kullanılan mevcut bilgisayarlarımızda kullanılan işletim sistemi, ofis uygulamaları ve kullanıcı erişim yazılımlarının lisanslı kullanımı için; Üniversitemiz ile Microsoft arasında sözleşme yapılmıştır. 3) Üniversitemiz ana sistem odası için; Güvenlik Duvarı, harici depolama birimi (storage), Sanallaştırma ve yedek alma yazılımı ihalesi yapılmış olup, alt yapımız güçlendirilip veri kayıplarının ve siber saldırıların önüne geçilmiştir.

Tablo 15. Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Hedef ve Gerçekleşmeler Tablosu

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı	
2016 Hedeflenen	2016 Gerçekleşen
1.Kullanıcıların bilgi ve belge hizmetlerinden daha hızlı ve etkin bir şekilde yararlanmasını sağlamak amacıyla en yeni bilgi teknolojilerini kütüphanelerimize uygulamak.	1.Kullanıcılarımızın hizmetlerimizden daha hızlı ve etkin bir şekilde yararlanmasını sağlamak amacıyla en yeni teknolojiler takip edilmekte ve ihtiyaçlar doğrultusunda satın alınmaktadır.
2. Kullanıcıların gereksinim duyduğu basılı, elektronik ve görsel-işitsel bilgi kaynaklarını sağlamak.	2.Kullanıcıların gereksinim duyduğu basılı, elektronik ve görsel-işitsel bilgi kaynakları sağlanmıştır.
3.Üniversitemizin bilgi ürünlerinin akademik dünyaya sunumunu sağlamak.	3. Bilgi İşlem Daire Başkanlığınca Açık Erişim alt yapısı için gerekli elektronik hizmet satın alınamamış bu nedenle ilgili hedef gerçekleştirilememiştir.

2-2016 YILI PROJE UYGULAMALARI

Aksaray Üniversitesine 2016 Yılı Yatırım Bütçesinden toplamda **25.250.000 TL** ödenek tahsis edilmiştir. Eğitim sektöründe toplamda 5 adet, spor sektöründe 1 adet proje mevcuttur. Eğitim sektörü altında yer alan etüt proje işleri, muhtelif işler, yayın alımları 2016 yılı içerisinde başlayıp, 2016 yılında sonuçlandırılmıştır.

Tablo 16. 2016 Yılında Devam Eden Projeler

Proje No	Sektör	Proje Adı	Proje Sahibi
1994H032360	Eğitim (KOP)	Kampus Altyapısı	Aksaray Üniversitesi
2008H030630	Eğitim (KOP)	Derslik ve Merkezi Birimleri	Aksaray Üniversitesi
2008H050070	Spor (KOP)	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	Aksaray Üniversitesi

Tablo 17. 2016 Yılında Tamamlanan Projeler

Proje No	Sektör	Proje Adı	Proje Sahibi
2016H031280	Eğitim (KOP)	Muhtelif İşler	Aksaray Üniversitesi
2016H031270	Eğitim (KOP)	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	Aksaray Üniversitesi
2016H031290	Eğitim (KOP)	Yayın Alımı	Aksaray Üniversitesi

2.1. Biten Projeler (Eğitim sektörü)

2.1.1. İ.İ.B.F. T, L, M ve N Bloklar Yapım İşi: 2016 yılında tamamlanarak geçici kabul işlemleri yapılmış, hizmete açılmıştır.

İlk Sözleşme Bedeli: 3.477.000,00 TL

Son Sözleşme Bedeli: 3.408.955,40 TL

Yer Teslim Tarihi: 07.04.2015

İş Bitim Tarihi: 19.08.2016



2.1.2. İslami İlimler Fakültesi İkmal İnşaatı İşi: 2016 yılında tamamlanarak geçici kabul işlemleri yapılmış, hizmete açılmıştır.

İlk Sözleşme Bedeli: 3.430.000,00 TL

Son Sözleşme Bedeli: 3.552.262,14

Yer Teslim Tarihi: 01.04.2015

İş Bitim Tarihi: 11.04.2016



2.1.3. Rektörlük Binası Yapım İşi: 2016 yılında tamamlanarak geçici kabul işlemleri yapılmış, hizmete açılmıştır.

İlk Sözleşme Bedeli: 13.811.000 TL

Son Sözleşme Bedeli: 14.200.677,22

Yer Teslim Tarihi: 27.05.2014

İş Bitim Tarihi: 30.09.2016



2.1.4. Kampus Altyapı 4. Etap Yapım İşi: 2016 yılı itibariyle iş tamamlanmış, geçici kabul işlemleri yapılmıştır.

İlk Sözleşme Bedeli: 3.430.000,00 TL

Son Sözleşme Bedeli: 3.552.262,14

Yer Teslim Tarihi: 01.04.2015

İş Bitim Tarihi: 11.04.2016



2.2. Devam Eden Projeler

2.2.1. Derslik ve Merkezi Birimler (KOP): 2016 yılında Derslik ve Merkezi birimler projesi kapsamında, Kütüphane (11.000 m²), Ortaköy MYO Atl. (600 m²) devam eden projeler olup, projelere ilişkin veriler Tablo 18’de gösterilmektedir.

Tablo 18. Derslik ve Merkezi Birimler Projesi

Proje No	2008H030630
Projenin Adı	DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER (KOP)
Harcamayı Yapan/Yaptıran Birim	YAPI İŞLERİ TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
Kullanılabilir Ödenek Gönderme	17.000
Kurum İçi Ödenek Aktarma	0
Kurum İçi Ödenek Ekleme	850
Kullanılabilir Ödenek	17.850
Harcama	14.731
Kalan Ödenek	3.119
Nakdi Gerçekleşme%	%82
Fiziki Gerçekleşme	%80

2.2.2. Kampus Altyapısı (KOP): 2016 yılında proje kapsamında doğalgaz dönüşümü, elektrik hattı, kampus içi yol, kanalizasyon hattı, peyzaj, su isale hattı, telefon hattı işleri proje kapsamında devam etmektedir.

2016 yılında ihale işlemleri tamamlanarak imalatlara başlanmıştır. 2016 yılsonu itibariyle nakdi ve fiziki olarak %16,55 seviyesine ulaşılmıştır.

İlk Sözleşme Bedeli: 2.850.000,00 TL

Son Sözleşme Bedeli: 2.850.000,00 TL

Yer Teslim Tarihi: 02.11.2016

İş Bitim Tarihi: 28.10.2017

Proje No	1994H032360
Projenin Adı	KAMPÜS ALTYAPI
Harcamayı Yapan/Yaptıran Birim	YAPI İŞLERİ TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
Kullanılabilir Ödenek Gönderme	1.500
Kurum İçi Ödenek Aktarma	0
Kurum İçi Ödenek Ekleme	300
Kullanılabilir Ödenek	1.800
Harcama	840
Kalan Ödenek	960
Nakdi Gerçekleşme%	%47
Fiziki Gerçekleşme	%82

2.2.3. Açık ve Kapalı Spor Tesisleri (KOP): 2016 yılında proje kapsamında basketbol sahası (4 adet), futbol sahası (4 adet), kapalı tenis kortu (4 adet), voleybol sahası (4 adet) açık ve kapalı spor tesislerinin yapımına başlanılamamış olup, proje devam etmektedir.

Proje kapsamında 2016 yılında imalat ve harcama yapılmamıştır.

Tablo 19. Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Proje Tablosu

Proje No	2008H050070
Projenin Adı	AÇIK VE KAPALI SPOR TESİSLERİ
Harcamayı Yapan/Yaptıran Birim	YAPI İŞLERİ TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
Kullanılabilir Ödenek Gönderme	1.000
Kurum İçi Ödenek Aktarma	0
Kurum İçi Ödenek Ekleme	0
Kullanılabilir Ödenek	1.000
Harcama	0
Kalan Ödenek	1.000
Nakdi Gerçekleşme%	%0
Fiziki Gerçekleşme	%0

2.3. Diğer Projeler:

Muhtelif İşler

2016 yılında muhtelif işler kapsamında yürütülen proje içerisinde bakım onarım, bilgi ve iletişim teknolojileri, makine-teçhizat ve taşıt olarak T-5 (1 adet) işleri yer almaktadır.

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığımız tarafından, Mühendislik Fakültesi eski binası Sağlık Bilimleri Fakültesi olarak kullanılmak üzere gerekli tadilat ve onarımlar tamamlanmış, ayrıca derslik ve idari kısım için iki adet engelli asansörü yapılmıştır. 2016 yılında Yapı İşleri Daire Başkanlığınca geçici kabul işlemleri tamamlanmıştır.

Muhtelif işler kapsamında, İdari Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından,2016 yılı içerisinde yapımı tamamlanmış olan Rektörlük Hizmet Binası, İslami İlimler Fakültesi ile İ.İ.B.B.F. T blok binalarının tefriş işleri, makine teçhizat alımı yapılmış hizmet binalarının bu kapsamdaki ihtiyaçlarının %100 yakını tamamlanmıştır. Ayrıca T Cetveli kapsamında alınması düşünülen bir adet taşıt alımı ise gerçekleşmemiştir.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından Microsoft Lisans Sözleşmesi, Sistem Odası yenileme işi, EBYS yazılım alımı, Elektronik Sertifika ve Mini kart okuyucu Web İçin Yazılım Alımı işlemleri yapılmıştır.

Muhtelif İşler (KOP) kapsamında yapılan iş ve alınan hizmetlere ilişkin veriler aşağıdaki Tablo 20’de gösterilmektedir.

Tablo 20. Muhtelif İşler (KOP) Tablosu

Proje No	2016H031280
Projenin Adı	MUHTELİF İŞLER (KOP)
Harcamayı Yapan/Yaptıran Birim	İdari Mali İşler Daire Başkanlığı
	Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı
	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Kullanılabilir Ödenek Gönderme	5.000
Kurum İçi Ödenek Ekleme	2.935
Kullanılabilir Ödenek	7.935
Harcama	6.825
Kalan Ödenek	1.110
Nakdi Gerçekleşme%	86
Fiziki Gerçekleşme %	100

2.4. Yayın Alımları

Üniversitemiz Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından 2016 Aralık sonu itibariyle Açık İhale ve Doğrudan Temin Usullerine göre 4.986 kalem basılı yayın alımı, 2.296 adet e-kitap alımı, 16 Adet Veritabanı ile 1 adet Tez Tarama Veritabanı (Elektronik Ortamda) ve 1 Adet Elektronik Dergi Aboneliği gerçekleştirilmiştir.

Tablo 21. 2016H031290 Proje Numaralı Yayın Alımları Tablosu

PROJE NO	2016H031290
Projenin Adı	YAYIN ALIMI (KOP)
Harcamayı Yapan/Yaptıran Birim	KÜTÜPHANE DAİRE BAŞKANLIĞI
Kullanılabilir Ödenek Gönderme	650.000 TL
Kurum İçi Ödenek Aktarma	0
Kurum İçi Ödenek Ekleme	0
Kullanılabilir Ödenek	650.000 TL
Harcama	649.665 TL
Kalan Ödenek	335 TL
Nakdi Gerçekleşme%	100
Fiziki Gerçekleşme	100

2.5. PROJE TAMAMLAMA RAPORU (1)

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)						
		Yatırım Programına Alınış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler	
Proje No	2016H031270					
Proje Adı	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi (KOP)					
Sektör/Alt sektör	Eğitim/Yükseköğretim					
Proje Amacı	Etüt-Proje					
Proje Yeri	Aksaray					
Karakteristiği	Etüt-Proje-Müşavirlik					
Fiziki Hedefi	%100 tamamlama					
Başlama-Bitiş Tarihi	2016-2016					
Proje Sözleşmesi Tarihi	26.04.2016		Sözleşme İhale Bedeli		53	
Proje Tutarı (Maliyeti)	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
		62,5				
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)						
	Cari Fiyatlarla			2016 Yılı Fiyatlarıyla		
	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
Programa Alındığı Yıl 2015		62,5			62,5	

Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler

Projenin Çıktısı/Sonucu (Ürünü)	Yemekhane Binası mimari, statik, mekanik ve elektrik projeleri, teknik şartnameler, mahal listeleri, metraj, keşif ve yaklaşık maliyet cetvelleri hazırlanmıştır.
Projenin Beklenen ve Elde Edilen Faydalar	
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı	
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü	
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler	

(*) Kamulaştırma Hariç

PROJE TAMAMLAMA RAPORU (2)

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)						
		Yatırım Programına Alınış Değerleri		Revize Edilmiş Son Değerler		
. Proje No	2016H031280					
. Proje Adı	Muhtelif İşler (KOP)					
. Sektör/Alt sektör	Eğitim/Yükseköğretim					
. Proje Amacı	Büyük Onarım					
. Proje Yeri	Aksaray					
. Karakteristiği	B. On. Ted. Mak. Tec. Bil. Don. Yaz. Alt. Bak. On. İd. Yen.					
. Başlama-Bitiş Tarihi	2016-2016					
. Proje Sözleşmesi Tarihi	09.06.2016		. Sözleşme İhale Bedeli	885		
. Proje Tutarı (Maliyeti)	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
		1359				
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)						
		Cari Fiyatlarla		2016 Yılı Fiyatlarıyla		
		Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)
				a)	ırma
Programa Alındığı Yıl 2015			1099,5			1099,5
Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Projenin Çıktısı/Sonucu (Ürünü)		Mühendislik Fakültesi Eski Binası' nın Sağlık Bilimleri Fakültesi olarak kullanılacak biçimde gerekli tadilatlar, engelliler için iki adet hidrolik asansör yapılmıştır.				
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar						
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı						

(*) Kamulaştırma Hariç

PROJE TAMAMLAMA RAPORU (3)

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)

	Yatırım Programına Alınış Değerleri	Revize Edilmiş Son Değerler
. Proje No	2016 H 031280	
. Proje Adı	Muhtelif işler (Kop)	
. Sektör/Altsektör	Tefrişat	
. Proje Amacı	Yeni açılan fakültelerin kurulmasını yapmak.	
. Proje Yeri	Aksaray Üniversitesi	
. Karakteristiği		
. Fiziki Hedefi	Okulların kullanılabilir hale getirilmesi.	
. Başlama-Bitiş Tarihi	2016-2016	
. Proje Sözleşmesi Tarihi	2016 yılı	. Sözleşme Bedeli İhale 3090 (DMO)
. Proje Tutarı (Maliyeti)	Dış Toplam(*)	Kamulaştırma Dış Toplam(*) Kamulaştırma
. Makine Teçhizat alımı	1623	
. Büro Mefruşat alımı	1467	

Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)

	Cari Fiyatlarla			2015 Yılı Fiyatlarıyla		
	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
Programa Alındığı Yıl (2016)		3090			3090	
Makine Teçhizat alımı		1623			1623	
Büro Mefruşat alımı		1467			1467	
2016						

Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler

Projenin Çıktısı/Sonucu (Ürünü)	Okulların tefrişini sağlanmıştır.
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar	Öğrenci sayısının artması, binaların büyümesi, öğrenci ve çalışan personele faydalı okuma ve çalışma imkanlarının sağlanması.
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı	
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü	
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler	

(*) Kamulaştırma Hariç

PROJE TAMAMLAMA RAPORU (4)

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)						
. Proje No	2016H031280		-			
. Proje Adı	Muhtelif İşler (KOP)					
. Sektör/Altsektör	Güvenlik Kamerası Alımları EBYS Sistemi sertifika mini kart okuyucu ve zaman damgası alımı, Microsoft Lisans, Web Yazılımı), Kartlı Geçiş Sistemi (KGS) ve Ders Dışı Etkinlik Programı yazılımı Alımı					
. Proje Yeri	Aksaray Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı					
. Karakteristiği	-					
. Fiziki Hedefi	Üniversitemiz Kampüs Yerleşkesinin Güvenlik altyapısını sağlıklı ve güvenli hale getirmek.					
. Başlama-Bitiş Tarihi	2016-2016					
. Proje Sözleşmesi Tarihi	1)Güvenlik Kamera Sistemleri ve Switch Alımı(08/11/2016) 2)Elektronik Sertifika ve Mini kart okuyucu (02/06/2016) 3) Microsoft Lisans Söz.(22/08/2016) 4 Kartlı Geçiş Sistemi (KGS) ve Ders Dışı Etkinlik Programı yazılımı Alımı (16/08/2016) TOPLAM		Sözleşme İhale Bedeli	1) 1009 2) 12 3) 36 4) 90 1105		
. Proje Tutarı (Maliyeti)	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)						
Cari Fiyatlarla			2016 Yılı Fiyatlarıyla			
	Dış	Toplam(Kamula	Dış	Topla	Kamulaştırma

)	ştırma		m()	
Programa Alındığı Yıl (2015)		1191			1191	
		12			12	
		42			42	
		117			117	
TOPLAM		1362			1362	

Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler

Projenin Çıktısı/Sonucu (Ürünü)	<p>1) Kamera Sistemleri aktif hale gelmiştir.</p> <p>2) Kartlı Geçiş Sistemi (KGS)) ve Ders Dışı Etkinlik Programı yazılımı alındı. Üniversitemiz Merkez Kampüsü içerisinde Bazı Fakülte ve Yüksekokullarda İdari Binalarda kullanılmaya başlanmıştır</p>
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar	<p>1) Kamera sistemi ile Binaların Güvenliği sağlanmış ve Kayıt altına alınmıştır.</p> <p>2) Kartlı Geçiş sistemi ile Binalar giriş ve çıkışlar kayıt altına alınmıştır.</p> <p>3) Üniversitemiz ile Microsoft arasında Lisans Sözleşmesi imzalanmıştır.</p>
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı	<p>Üniversitemizdeki öğrenci ve personelin güvenliği sağlanmış ve Üniversite giriş çıkışları kontrol altına alınmıştır. Öğrenci ve personel giriş çıkışları kayıt altına alınmıştır.</p>
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü	<p>Geçiş sisteminde yaşanan bazı aksaklıklar firma ile irtibata geçerek çözülmüştür.</p>
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler	

(*) Kamulaştırma Hariç

PROJE TAMAMLAMA RAPORU (5)

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)						
	Yatırım Programına Alınış Değerleri					Revize Edilmiş Son Değerler
Proje No	2016H031290					
Proje Adı	Yayın Alımı (KOP)					
Sektör/Altsektör	Küt. Yayın Alımı					
Proje Amacı	Üniversite Kütüphanesinin basılı ve elektronik yayın sayısı açısından geliştirilmesi.					
Proje Yeri	Aksaray					
Fiziki Hedefi	Kütüphane yayın sayısını arttırmak					
Başlama-Bitiş Tarihi	2016-2016					
Proje Sözleşmesi Tarihi			Sözleşme İhale Bedeli			
Proje Tutarı (Maliyeti)	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)						
	Cari Fiyatlarla			2016 Yılı Fiyatlarıyla		
	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
Programa Alındığı Yıl (2016)						
2016/						
1) 2016133964 İKN'li Basılı Kaynak Alımı (2832 Kalem) Açık İhalesi Hak Edışı 26.05.2016 tarihinde sözleşme imzalanmış					117.750,32	
2) İdeal Kültür Yayıncılık, Doğrudan Temin Yolu İle Basılı Kaynak Alımı (1112 Kalem)					16.200	
3) Elektronik Ortamda Veri Tabanı Aboneliği, (15 adet)					490.687,77	
4) E.Kitap Alımı (25 adet)					12.109,75	
5) E-Kitap Alımı (Enerji ve Mühendislik Paketi)					12.917,31	
TOPLAM					649,665	
Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						

Projenin Çıktısı/Sonucu (Ürünü)	Proje Amacı dâhilinde bütçemize aktarılan 650.000 TL'lik ödeneğin tamamı basılı ve elektronik kaynak alımları için kullanılmış ve Kütüphanemizin koleksiyonu maddi imkânlar çerçevesinde geliştirilmiştir.
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar	(Gelir artışı, katma değer, istihdam artışı, bölgesel kalkınma, zaman tasarrufu, yoksulluğun azaltılması vs.)
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı	
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü	<p>Yapılan İşler: Üniversitemiz Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından 2016 Aralık Ayı sonu itibariyle Açık İhale ve Doğrudan Temin Usullerine göre 4.986 kalem basılı yayın alımı, 2.296 adet e-kitap alımı, 16 Adet Veritabanı ile 1 adet Tez Tarama Veritabanı (Elektronik Ortamda) ve 1 Adet Elektronik Dergi Aboneliği gerçekleştirilmiştir.</p> <p>Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü:</p> <p>Üniversitemiz Akademik Birimlerinden yıl içerisinde gelen yayın talepleri Doğrudan Temin sınırimızın büyükşehirler oranla alt seviyede olması nedeniyle (özellikle yabancı kaynak alımlarında) sağlamada güçlüklerle karşılaşmamıza neden olmaktadır.</p> <p>Bütçe imkânlarımızın kısıtlı olması nedeniyle kullanıcılarımızın talep etmiş oldukları araştırma kaynakları (elektronik ya da basılı) tamamıyla karşılanamamakta, temin aşamasında en çok kullanılan/en acil ihtiyaç şeklinde sınırlandırmalara gidilmektedir.</p> <p>Kütüphane binamız halen proje aşamasında olup, hizmet vermekte olduğumuz binamız hem kullanıcılarımıza hem de koleksiyonumuza yetersiz kalmaktadır.</p> <p>Doğrudan Temin sınırının büyükşehirler ile aynı seviyeye getirilmesinin Anadolu Üniversite Kütüphanelerine büyük kolaylık sağlayacağı düşünülmektedir.</p> <p>Proje aşamasında bulunan ve 2018 yılında bitmesi planlanan kütüphane binası yapımının hızlandırılması için gerekli çalışmaların yapılması hem Üniversitemize hem de kullanıcılarımıza büyük fayda sağlayacaktır.</p>
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler	Bütçe imkanları, bina kapasitesi ve konusunda uzman personel sayısının artırılması halinde araştırmacı ve kullanıcılarımızın ihtiyaçlarına daha kaliteli hizmet verileceği düşünülmektedir.

(*) Kamulaştırma Hariç

3-SORUNLAR VE ÇÖZÜME YÖNELİK ÖNERİLER

3.1-Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar

Aksaray Üniversitesi 2006 Yılında kurulmuş bir devlet üniversitesi'dir. Kurulduğu tarihten 2016 yılına kadar merkez kampüs yerleşkesinde 4. etap alt yapı çalışmaları, yeni açılmış fakülte hizmet binaları, kapasitesi yeterli olmayan fakülteler için yeni hizmet binaları yapılmıştır.

Yeni kurulan üniversitelerde gelişim ivmesi eski üniversitelere nazaran daha fazladır. Yeni kurulan üniversitelerde gelir kaynakları daha kısıtlıdır. Döner Sermaye gelirleri gelişmiş üniversitelere nazaran çok az olması planlanan yatırımların sadece bütçe imkanları ile gerçekleştirilmesini gerekli kılmaktadır.

2016 Yılı Bütçe Kanunu ile Üniversitemize tahsis edilen yatırım ödeneklerinin; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu gereğince mali plan ve programlar ile kurumsal plan ve programların öngördüğü çerçeve içinde etkili, ekonomik ve verimli kullanılması ilke olarak benimsenmektedir. Ancak yatırım projeleri söz konusu olduğunda zamanın ve kaynağın etkili, ekonomik ve verimli kullanımı açısından uygulamada mevzuat kaynaklı sorunlarla karşılaşabilmektedir. Özellikle kamu ihale mevzuatında öngörülen ihale sürecinin uzunluğu, ihale sonrası ihalelere yapılan itirazların çözüme kavuşturulması, ihalelerin zamanında sonuçlanması ve yatırım projelerinin zamanında tamamlanması konusunda sorunlar yaşanabilmektedir. Bu sebeple ihale süreçlerine yönelik olarak mevzuatta yapılabilecek düzenlemeler ihalenin daha kısa sürede sonuçlanmasına olanak verecek şekilde düzenlenmesiyle yatırımların planlanan sürede hayata geçirilmesine yardımcı olacağı düşünülmektedir. Ayrıca kurumun ihtiyacını karşılayacak sayıda eğitilmiş teknik ve idari personel için kadro tahsisinin yapılması da üniversiteler açısından önem arz etmektedir.

3.2 Öneriler

- Fiziki yapısını tamamlayamamış olan veya yeni kurulan üniversitelerin, yatırım bütçe tekliflerindeki taleplerinin mümkün olduğunca karşılanması,
- Üniversitemizin ihtiyaçlarının karşılayacak sayıda eğitimli, teknik ve idari personel için kadro tahsisi yapılması,
- Personelin periyodik aralıklarla belirlenmiş programlar dahilinde hizmet içi eğitimlere tabi tutulması
- Kalkınma Bakanlığınca verilen ödeneklerin her yıl sadece belli oranda değil, kurumların öğrenci sayıları, binalarının ve çevrenin fiziki koşulları gözetilerek ödenek dağıtımına gidilmesi,
- 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu'nda yatırımlara yönelik yapılacak ihalelerde ihale süreleri ile itiraz sürelerinin kısaltılmasına yönelik çalışmaların yapılmasının daha etkin hizmet getireceği düşünülmektedir.

2016 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZET TABLOSU (*)

Kurum Adı: AKSARAY ÜNİVERSİTESİ

Bütçe Türü: Özel Bütçe

2016 Yılı Fiyatlarıyla (1.000) Bin TL

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı		2015 Sonu Kümülatif Harcama			2016 Yılı Program Ödenek			2016 Yılı Revize Ödenek			2016 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme		
		Dış	Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam
				Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak	
Tarım															
Madencilik															
İmalat															
Enerji															
Ulaştırma.-Hab.															
Turizm															
Konut															
Eğitim	6		225.750			189.851			25.250			29.335			23.108
TOPLAM	6		225.750			189.851			25.250			29.335			23.108

2016 Yılı Yatırım Programı Gerçekleşme Raporu

2016 Dönem Sonu Kümülatif Nakdi Gerçekleşmesi

Proje No	Proje Adı	Bütçe Türü	Bitiş Yılı	Yeri	Proje Tut. Toplam	2015 Kümülatif Harcama	Ödenek Dış Kredi	Ödenek Dış Özkaynak	Ödenek Toplam	+ / -	Aktarma Miktarı	Harcama Dış Kredi	Harcama Dış Özkaynak	Harcama Toplam
1994H032360	Kampüs Altyapısı (KOP)	ÖZEL BÜTÇE	2017	Aksaray	75.000,	69.112,	0,	0,	1.500	0	300	0	0	840
2008H030630	Derslik ve Merkezi Birimler (KOP)	ÖZEL BÜTÇE	2017	Aksaray	123.000,	100.950,	0,	0,	17.000	0	850	0	0	14.731
2008H050070	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri (KOP)	ÖZEL BÜTÇE	2017	Aksaray	22.000,	19.789,	0,	0,	1.000,	0	0	0	0	0
2016H031270	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	ÖZEL BÜTÇE	2016	Aksaray	100,	0,	0,	0,	100,	0	0	0	0	62
2016H031280	Muhtelif İşler	ÖZEL BÜTÇE	2016	Aksaray	5.000,	0,	0,	0,	5.000,	0	2.935	0	0	6.825
2016H031290	Yayın Alımı	ÖZEL BÜTÇE	2016	Aksaray	650,	0,	0,	0,	650,	0	0	0	0	650
TOPLAM					225.750	189.851	0	0	25.250	0	4.085	0	0	23.108

